



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บปม.(กป.)-๘๘๘/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพิทรนันท์ พิธาสุวรรณเมือง

ชื่อผู้ส่ง นายศาสวัต ครอบประกอบกิจ

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.บางปลาม้า

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.บางปลาม้า ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย คพจ.๒.๓ สถานีจ่ายไฟฟ้าบางปลาม้า - บ้านสาลี
ที่ BAm๘S-๐๑ ถึง DIS ชั่วคราวจุด A วงจร BAm04 สถานีไฟฟ้าบางปลาม้า ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๓.	BAm๐๔	๑๗-๑๙ ส.ค. ๒๕๖๖	๐๘.๐๐ น. 08.00	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย คพจ. ๒.๓ สถานีบางปลาม้า - บ้าน สาลี	BAm๘S-๐๑	DIS ชั่วครว จุด A	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม
๒.	LBL01YB- 01	๑๗-๑๙ ส.ค. ๒๕๖๖	๐๘.๐๐ น. 08.00	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย คพจ. ๒.๓ สถานีบางปลาม้า - บ้าน สาลี	LBL๐๑Y-๐๑,	LBL๐๑Y๐๒	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านสาลี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม ตำแหน่ง พงจ.๕ โทร. ๐-๘๗๗๒๑๒-๗๔๒๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายศาสวัต ครอบประกอบกิจ)
ผจก.กฟส.อ.บางปลาม้า

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1,2 ฟีดเดอร์ BAm๘ จาก BAm 416-๐1 ถึง BLS๗๘-๑๐A

ในวันที่ 17-19 ส.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 11๖716

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศาสวัต ครอบประกอบกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ วิระพงษ์ ลอเอี่ยม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟส.อ.บางปลาม้า

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย จิรวาท จิรวาท) นักวิชาการ

อก.ก.๕ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๖

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผน

แผนผังแนบ 1 แผน

ผจก. (สถานี) -


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง


- | | | | |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ บางปลาหม้า - บ้านสาลี (BAM04) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 17,18,19 ส.ค. 66 | ระหว่าง | 08.00 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.บปม. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1167/66 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ | | วันที่ 12 สิงหาคม 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 12 สิงหาคม 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 12 สิงหาคม 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายสุธี,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร,นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching วันที่ 17 - 19 ส.ค. 66 (ดับเข้า-จ่ายเย็น)						
2	แจ้ง บ.สาลีไบโอแมสหยุดการขนานไฟ โดยยังรับไฟเพื่อจ่ายโหลดภายในได้						
3	OFF ATS BAM						
4	BAM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		Load = 2 MW
5	BAM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		Load = 0.9 MW
6	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LBL		
7	ย้ายโหลด BAM04 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BAM05						
8	BAM04S-10	ปลด	สับ		บปม.		DIS ตรงข้าม บ.สาลีไบโอแมส
9	BAM04VB-01	สับ	ปลด		BAM		
10	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
11	ตรวจสอบเบรกเกอร์ BAM09VB-01 อยู่สถานะ <i>"Open+Truckout Service"</i>						
12	BAM04S-01	สับ	ปลด		บปม.		POT HEAD F.4
13	BAM09S-01	สับ	ปลด		บปม.		POT HEAD F.9
14	Dis ช.ค. BAM04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DISชั่วคราว จุด A
15	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BAM04YB-01 อยู่สถานะ <i>"Open"</i>						
16	LBL01YB-01	สับ	ปลด		LBL		เบรกเกอร์ 115 เควี
17	LBL01YS-01	สับ	ปลด		LBL		ใบมีด 115 เควี
18	LBL01YS-02	สับ	ปลด		LBL		ใบมีด 115 เควี
19	BAM04YS-01	สับ	ปลด		BAM		ใบมีด 115 เควี
20	BAM04YS-02	สับ	ปลด		BAM		ใบมีด 115 เควี
21	ตรวจสอบ SF6 หน้าสถานีฯ รหัส BAM02S-02 อยู่สถานะ <i>"Open + ล็อคคาน"</i>						
22	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.บปม. รับทราบ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	แจ้ง กฟส.บปม. Test ไฟก่อนการปฏิบัติงาน						
24	แจ้ง กฟส.บปม. ข้อควรระวังบริเวณจุด G1,G2 (ไม่มีการ Short Ground ที่สายส่ง 115kV เนื่องจากดับไฟป้องกัน Induce เท่า						
25	แจ้ง กฟส.บปม. ลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อยแล้วให้ปฏิบัติงานได้						
26	BAM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
27	เมื่อ กฟส.บปม. ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืนสภาพปกติ						
28	BAM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
29	แจ้ง กฟส.บปม. ปลดข้อควรระวังบริเวณจุด G1,G2						
30	เมื่อ กฟส.บปม. ปลดข้อควรระวังบริเวณจุด G1,G2 พร้อมยืนยันข้อมูลใน We Safe เรียบร้อยแล้ว						
31	BAM04YS-01	ปลด	สับ		BAM		ใบมิต 115 เควี
32	BAM04YS-02	ปลด	สับ		BAM		ใบมิต 115 เควี
33	LBL01YS-01	ปลด	สับ		LBL		ใบมิต 115 เควี
34	LBL01YS-02	ปลด	สับ		LBL		ใบมิต 115 เควี
35	LBL01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		LBL		เบรกเกอร์ 115 เควี
36	BAM04S-01	ปลด	สับ		บปม.		POT HEAD F.4
37	BAM09S-01	ปลด	สับ		บปม.		POT HEAD F.9
38	BAM04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		BAM		
39	ย้ายโหลด BAM04 บางส่วนกลับจาก BAM05						
40	Dis ช.ค. BAM04	ปลด	สับ		บปม.		DIS Disชั่วคราว จุด A
41	BAM04S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS ตรงข้าม บ.สาธิไบโอแมส
42	แจ้ง บ.สาธิไบโอแมสทำการขนานไฟได้						
43	ON ATS BAM						
44	BAM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
45	BAM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
46	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LBL		
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย คพจ.2.3 สถานีจ่ายไฟฟ้าบางปลาม้า - บ้านศาลี ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

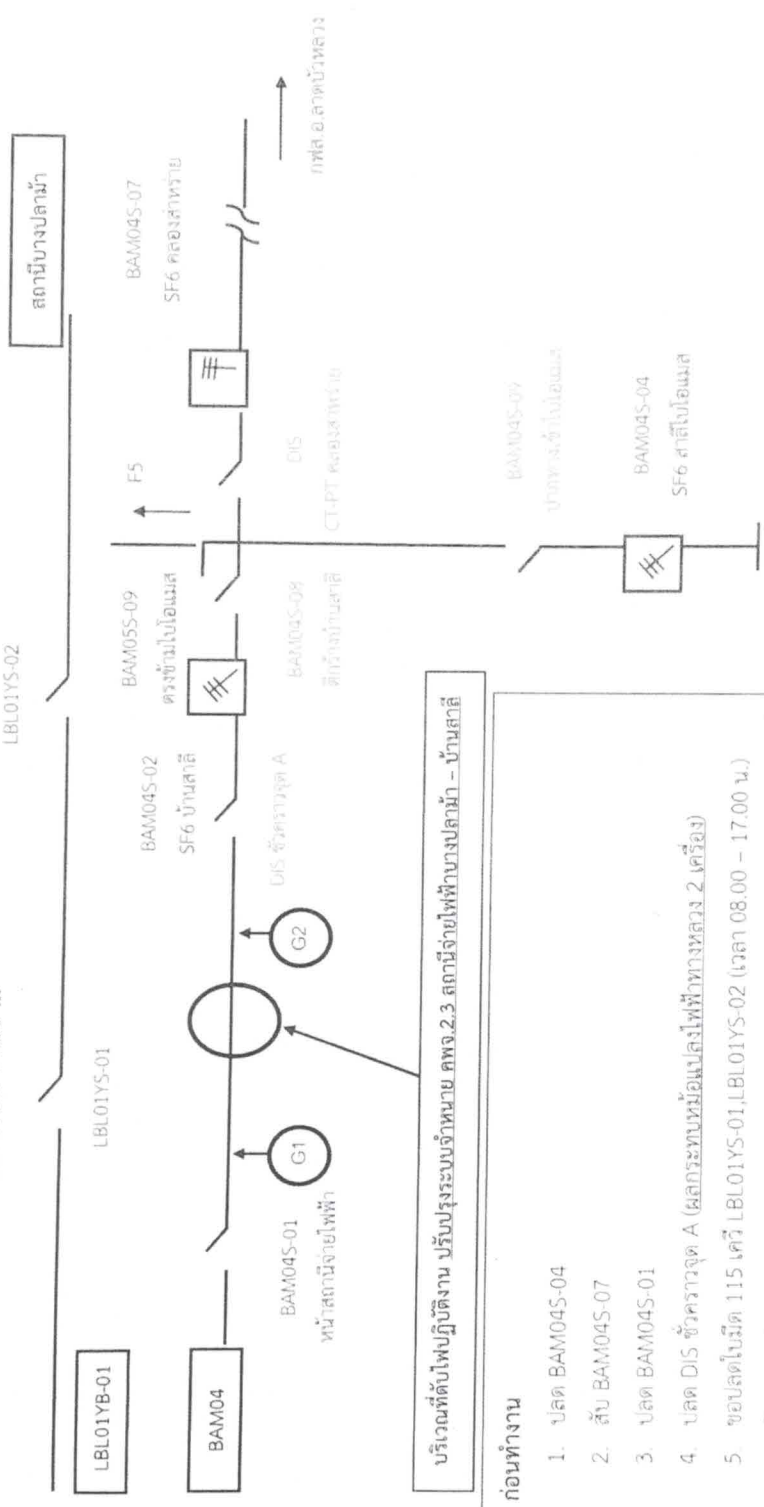

บริเวณที่ดับไฟปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย คพจ.2.3 สถานีจ่ายไฟฟ้าบางปลาม้า - บ้านศาลี

- ก่อนทำงาน**
1. ปลด BAM04S-04
 2. สับ BAM04S-07
 3. ปลด BAM04S-01
 4. ปลด DIS ชั่วคราวจุด A (ผลกระทบหม้อแปลงไฟฟ้าทางหลวง 2 เครื่อง)
 5. ขอบลัดโบนิต 115 เควี LBL01YS-01, LBL01YS-02 (เวลา 08.00 - 17.00 น.)
 6. ข้อตกลงแรงสูง จุด G1, G2
 7. ปฏิบัติการปรับปรุงระบบจำหน่าย
- หลังทำงานแล้วเสร็จ**
1. ปลด ข้อตกลงแรงสูง จุด G1, G2
 2. สับ DIS ชั่วคราวจุด A
 3. สับ BAM04S-01
 4. ปลด BAM04S-07

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จเวลา
ย้ายโผลดกลับสภาพเดิม บริเวณที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน
