



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 ก.ค. 65

เลขที่ .ป.ต. /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายชัชชัย...เจติชูสุวรรณ

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟล.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี จะขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการปฏิบัติงาน ปักเสา, รื้อถอนและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี ตามแผนผังสิ่งเข้แบบ จำนวน ๒... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	9 สท.	15/07/65	08.00	17.00	พาดสายแรงสูง หลังรีโคสเซอร์บางปลาหมอ	SPA09R-01	Dis SPA09S-11	โทร.๐๘๕-๒๕๐๔๐๔๑ นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร
๒.	9 สท.	20/04/65	08.00	17.00	พาดสายSAC 185 ตร.มม.	DDE จุดขั้ว ขายวัสดุอุปกรณ์ คันคลองวัดป่า	Dis SPA08S-09	โทร.๐๘๕-๒๕๐๔๐๔๑ นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายฉนวนกร...สุวรรณประทีป...ตำแหน่ง พชง.๖ (สช.)...โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายชัชชัย...เจติชูสุวรรณ)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) สท.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟล.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SPA09 จาก SPA09R-01 ถึง SPA09S-11

ในวันที่ 15 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1168/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... พิดเคอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย...ประสานงานการขอตัดไฟกับ...

รทพร อันติโกตรกิจ
(รจก. 7 แทน นว.ค.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแบบ 2 แผ่น

ผจก. - (สถาปนา...)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ถนนเลี้ยวเมืองบางปลาหมอ
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15 ก.ค. 65 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สพ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย SPA09 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1168/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
3	SPA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R คันคลองวัดป่า
4	- ย้ายโหลด SPA09 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SPA08						
5	SPA08S-09	ปลด	สับ		สพ.		DIS เลี้ยวเมืองทางรถไฟ
6	SPA09S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ถนนเลี้ยวเมืองบางปลาหมอ
7	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
8	SPA09R-01	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
9	SPA09R-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS ใบมีดด้านนอกไลน์ SPA9R-01
10	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
14	SPA08R-01	Nonreclosing	Normal		สพ.	SCADA	R คันคลองวัดป่า
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
20	SPA08R-01	Normal	Nonreclosing		สพ.	SCADA	R คันคลองวัดป่า
21	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
22	SPA08S-09	ปลด	สับ		สพ.		DIS ใบมีดด้านนอกไลน์ SPA9R-01
23	SPA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
24	- ย้ายโหลด SPA09 บางส่วน กลับจาก SPA08						
25	SPA09S-11	ปลด	สับ		สพ.		DIS ถนนเลี้ยวเมืองบางปลาหมอ
26	SPA08S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS เลี้ยวเมืองทางรถไฟ
27	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
28	SPA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R คันคลองวัดป่า
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน ผจก.สพ. / รจก.(ท.) สพ.

ด้วยในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าปฏิบัติงานบริเวณ SPA๐๙R-๐๑ - Dis SPA๐๙S-๑๑ วันที่ เพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อพาดสายSAC ๑๘๕ ต.ร.ม. โดยมีรายละเอียดปิดเตอร์ที่ปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเตอร์ ๙ สถานีฯ สุพรรณบุรี ตั้งแต่บริเวณรีโกลสเซอร์บางปลาหมอ-Dis SPA๐๙S-๑๑

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร ทีมงานชุดก่อสร้างเขต โทร ๐๘๕-๒๙๐๔๐๔๑ เป็นผู้ควบคุมงาน และให้นายวรพล สุทธิไกร ตำแหน่ง ผ.ก.ส.สพ. โทร ๐๘๑๘๖๖๕๗๙ เป็นผู้ประสานงานการดับไฟ เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

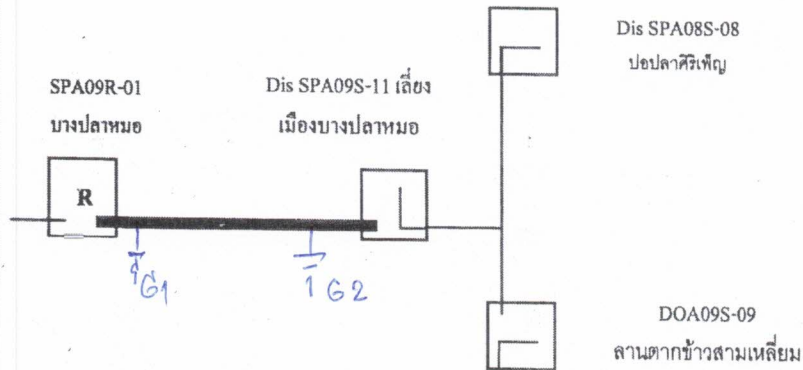

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง

๑. ย้ายโหนดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
๒. ทรีรีโกลสเซอร์ และปลดDis SPA๐๙S-๑๑
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งจุด
๔. แจ้งชุดก่อสร้างเขตปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ)

รจก.(ท.)กฟจ.สพ.

(นายธนากร สุวรรณประทีป)

พชง.๗ (สข.) ผ.บ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.


ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ด้วยในวันที่...๒๐...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๕... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...Dis SPA๐๘S-๐๙ - DDEก่อนร้านวัสดุก่อสร้าง...เพื่อ...ปักเสาและพาดสายระบบจำหน่ายแรงสูง๑๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเดอร์ ..๙.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Dis SPA๐๘S-๐๙ - DDEร้านวัสดุก่อสร้างคันคลองวัดป่า กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร ตำแหน่ง ชุดก่อสร้างเขต เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ...๐๘๕-๒๕๐๔๐๔๑...เป็นผู้ควบคุมงานและให้และให้นายวรพล สุทธิไกร ตำแหน่ง ทม.กส.สพ. โทร ๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙ เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

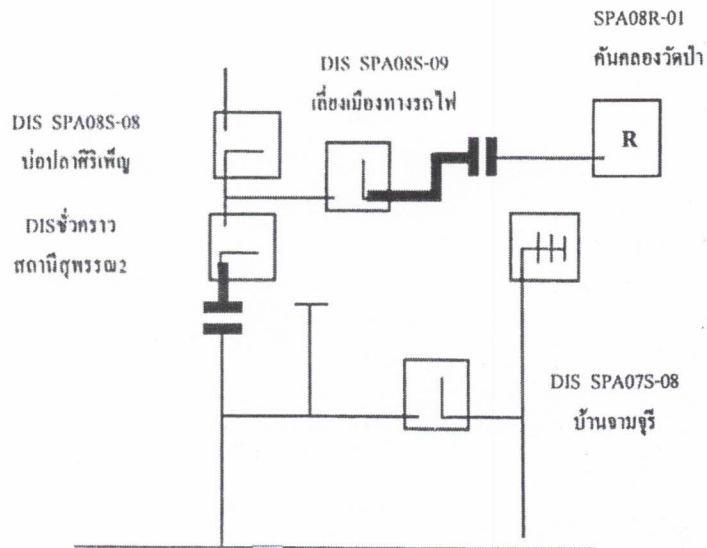

ดับไฟระบบจำหน่าย พาดสายแรงสูงระบบจำหน่าย๒๒เควี สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
๒. ปลดโหลดจุด ให้Hot Line สพ.ปฏิบัติงานด้วยการตัดเตด ๑จุด
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อตกราวจุด๑และจุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างเขตปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ)

รจก.(ท.)กฟจ.สพ.

Oh
(นายธนกร สุวรรณประทีป)
พงง.๗(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐
