



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 ก.ค. 65

เลขที่ ..ป.๓...../๒๕๖๓.....
ชื่อผู้รับ นายสมบุญรัมย์ สิงห์โตทอง.....
ชื่อผู้ส่ง นายชิตชัย เจริญสุวรรณ.....

วันที่.....๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕.....
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓).....
ตำแหน่ง ..รจก.(ท.) กฟจ.สพ.....

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี จะขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการปฏิบัติงาน ปักเสา, รีดถอนและทาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..๒.. แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	9 สท.	15/07/65	08.00	17.00	ทาดสายแรงสูง หลังรีโคลส เซอร์บังปลาหม้อ	SPA09R-01	Dis SPA09S-11	โทร.๐๘๕-๒๕๐๔๐๔๑ นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร
๒.	8/9 สท.	20/04/65 20/7/65	08.00	17.00	ทาดสายSAC 185 ตร.มม. มีงานข้างเคียง หมายเลข 1166	DDE จุดหน้า ขายวัสดุป้อนสว่าง คันคลองวัดป่า	Dis SPA08S-09	โทร.๐๘๕-๒๕๐๔๐๔๑ นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..นายสนนกร..สุวรรณประทีป...ตำแหน่งทชง.๖ (สช.)...โทร ..๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายชิตชัย เจริญสุวรรณ)

ตำแหน่ง ..รจก.(ท.) สท.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.สพ.....

สำรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ พิดเตอร์ SPA8 จาก Dis SPA8S-09 ถึง DPE รั้วรังสิต๑๐สรัง

ในวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1169/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ พายธชากร สุวรรณประทีป

(นายชิตชัย เจริญสุวรรณ)
๒๐ ก.ค.๖๕

สำรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ.สุพรรณบุรี

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น


ผจฟ..... (สถาปปี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณคั่นคลองวัดป่า (SPA08)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ก.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	พาดสาย SAC 185 ตร.มม. ตามใบขอปฏิบัติงาน 1169/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง		วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายสุธี (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	คั่นคลองวัดป่า
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
4	แจ้ง กฟจ.สุพรรณบุรี โหลดหม้อแปลงบริเวณพื้นที่ดับไฟ วงจร SPA08 ออก 3 เฟส						
5	หลังจาก กฟจ.สุพรรณบุรี โหลดหม้อแปลงบริเวณพื้นที่ดับไฟ วงจร SPA08 ออก เรียบริ้อย						
6	แจ้ง Hot Line ทำการปลด DDE วงจร SPA08 บริเวณร้านวัสดุก่อสร้างคั่นคลองวัดป่า ออกทั้ง 3 เฟส (แบบมีไฟ)						
7	หลังจาก Hot Line ทำการปลด DDE วงจร SPA08 บริเวณร้านวัสดุก่อสร้างคั่นคลองวัดป่า ออกทั้ง 3 เฟส เรียบริ้อย						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สุพรรณบุรี ทราบ						
9	แจ้ง กฟจ.สุพรรณบุรี ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
10	แจ้ง กฟจ.สุพรรณบุรี ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
11	หลังจาก กฟจ.สุพรรณบุรี ทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบริ้อยแล้ว						
12	SPA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	R	คั่นคลองวัดป่า
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
14	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	SPA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	คั่นคลองวัดป่า
16	แจ้ง กฟจ.สุพรรณบุรี ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้ง กฟจ.สุพรรณบุรี ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
18	หลังจาก กฟจ.สุพรรณบุรี ทำการปลด Short Ground ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบริ้อยแล้ว						
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	แจ้ง Hot Line ทำการเชื่อม DDE วงจร SPA08 บริเวณร้านวัสดุก่อสร้างคั่นคลองวัดป่า เข้าทั้ง 3 เฟส (แบบมีไฟ)						
21	หลังจาก Hot Line ทำการเชื่อม DDE วงจร SPA08 บริเวณร้านวัสดุก่อสร้างคั่นคลองวัดป่า เข้าทั้ง 3 เฟส เรียบริ้อย						
22	แจ้ง กฟจ.สุพรรณบุรี จ่ายโหลดหม้อแปลงบริเวณพื้นที่ดับไฟ วงจร SPA08 ได้						
23	SPA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	R	คั่นคลองวัดป่า
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.


ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ด้วยในวันที่...๒๐...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๕... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...Dis SPA๐๘S-๐๙ - DDEก่อนร้านวัสดุก่อสร้าง...เพื่อ...ปักเสาและพาดสายระบบจำหน่ายแรง
สูง๑๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเดอร์ ..๙.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Dis SPA๐๘S-๐๙ - DDEร้านวัสดุก่อสร้างคั่นคลองวัดป่า
กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร ตำแหน่ง ชุดก่อสร้างเขต เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
...๐๘๕-๒๙๐๔๐๔๑...เป็นผู้ควบคุมงานและให้และให้นายวรพล สุทธิไกร ตำแหน่ง ทม.กส.สพ. โทร ๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙
เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

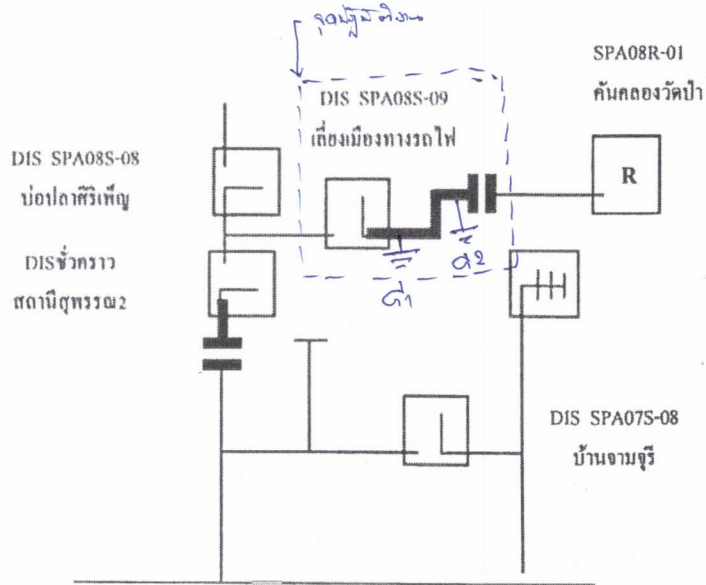

ดับไฟระบบจำหน่าย พาดสายแรงสูงระบบจำหน่าย๒๒เควี สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ย้ายโหนดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
๒. ปลดโหนดจุด ให้Hot Line สพ.ปฏิบัติงานด้วยการตัดเด็ด ๑จุด
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก่ไฟช็อตกราวด์จุด๑และจุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างเขตปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ)

รจก.(ท.)กฟจ.สพ.

(นายอนุสาร สุวรรณประทีป)
พงษ.๗(สข.) ผ.บ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐
