



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟง.สค.๒(บป) ๑๐๔๘/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ มุขสาย

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท).กฟง.สค.๒(บ้านแพ้ว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟง.สค.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี วงจรที่ KTE ๕YB สถานีบ้านแพ้ว ที่จ่ายให้ สถานีกระทุ่มแบน ๕ เพื่อให้ชุดออกไลน์ กฟก.๓ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกนในระบบสายส่ง พื้นที่ตำบลสวนส้ม (ดับที่ ๑๖๐) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTE ๕YB	วันอังคารที่ ๑๕ ก.ค.๒๕๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกน ชนิดหมวมพลาสติก แนวสายส่ง ๑๑๕ เควี พื้นที่ตำบลสวนส้ม	KTE ๕YB ๐๗๕๖	สถานี กระทุ่มแบน ๕	นายอรุณรัตน์ บัวสงค์ วศ.๖ ผ.บ. โทรศัพท์ ๐๘๖ - ๓๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์ชัย จันทนภาวิบูลย์ ตำแหน่ง ท.ผ.บ. โทร ๐๘๑ - ๕๒๐๕๐๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพนรัตน์ เศวตไทย)

ตำแหน่ง ผจก.กฟง.สค.๒(บพว)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115 จาก ๐๗๕๖-๐1 ถึง ๗๕๖-๐1  
ในวันที่ 19 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1171/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สกนพร ตันฉัตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ พยศักดิ์ชัย จันทนภาวิบูลย์  
6 ก.ค. 65

สกนพร ตันฉัตรกิจ  
(๐๘๖.๗ 11๗๗ ท.ผ.บ.ฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟง.สค.๒(บพว)

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตำบลสวนส้ม				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19-ก.ค.-65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค2.(บพว.)	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์กันนก	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1171/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันดิเกษตรกิจ			วันที่	6 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายคุณสวัสดิ, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ SME02YB-02,03, SME03YB-02,03, SME04YB-02,03 ให้จ่ายไฟแบบ Close loop						
2	BNP05YB-01	Auto	Manual		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	KTE05YB-01	Auto	Manual		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SMD02YB-01	Auto	Manual		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	Open loop						
6	SMD02YB-01	สับ	ปลด		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.						
8	KTE05YB-01	สับ	ปลด		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	BNP05YB-01	สับ	ปลด		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	KTE05YS-01	สับ	ปลด		KTE		- ไบมีด 115 เควี
11	KTE05YS-02	สับ	ปลด		KTE		- ไบมีด 115 เควี
12	BNP05YS-01	สับ	ปลด		BNP		- ไบมีด 115 เควี
13	BNP05YS-02	สับ	ปลด		BNP		- ไบมีด 115 เควี
14	เมื่อ กฟจ.สค.(บ้านแพ้ว) แจ้ง Short ground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
15	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ (ดำเนินการโดย Hotline กระเช้า)						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อ กฟจ.สค.(บ้านแพ้ว) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	KTE05YS-01	ปลด	สับ		KTE		- ไบมีด 115 เควี
18	KTE05YS-02	ปลด	สับ		KTE		- ไบมีด 115 เควี
19	BNP05YS-01	ปลด	สับ		BNP		- ไบมีด 115 เควี
20	BNP05YS-02	ปลด	สับ		BNP		- ไบมีด 115 เควี
21	KTE05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	BNP05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	จ่ายไฟ Close loop						
24	SMD02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	BNP05YB-01	Manual	Auto		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	KTE05YB-01	Manual	Auto		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	SMD02YB-01	Manual	Auto		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ไฟดับ พร้อมระบุจุด Short Ground. หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

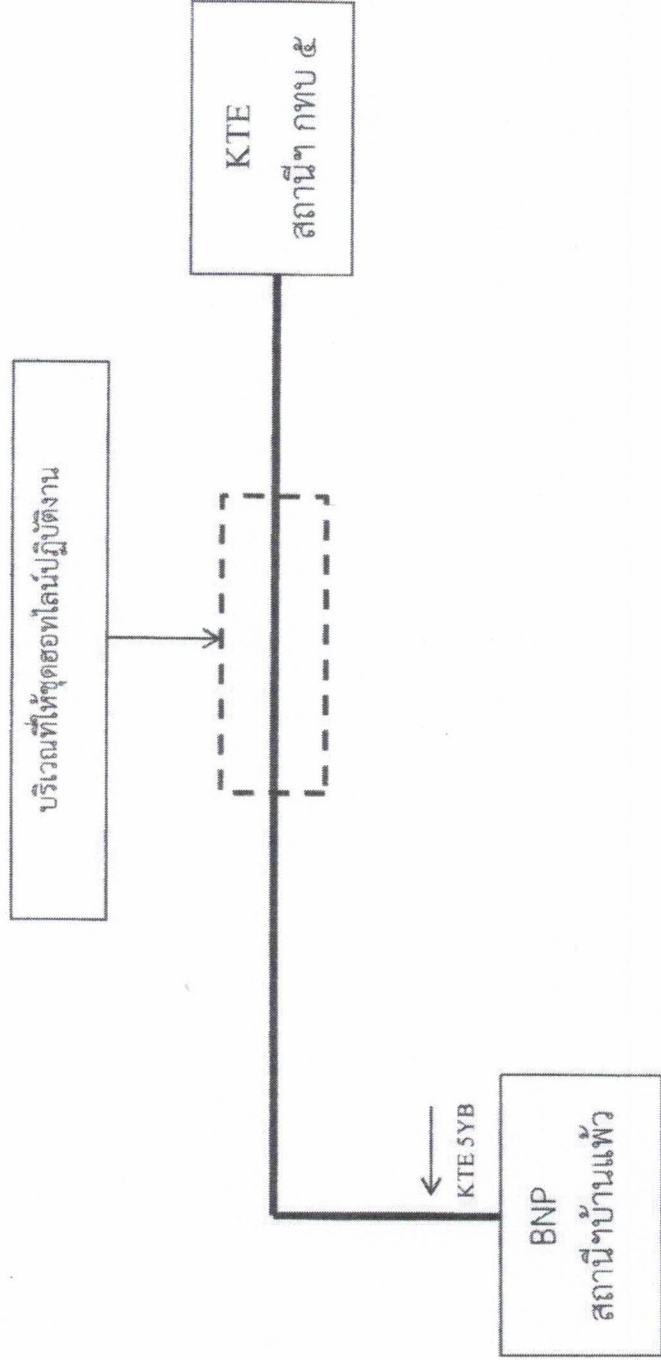

— เส้นที่แสดงพื้นที่ดับไฟปฏิบัติงาน  
ค้ำแหล่งจุดหรือตกราวด์  
≡

\*ปฏิบัติงานวันอังคารที่ ๑๙ ก.ค.๒๕๖๕
