



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔

Switching Deadline  
วันที่ 8 ก.ย. 64

เลขที่ ก.๓.สค.(ปบ.) ๔๓๙๙ /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช นนมนื่อ

วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟล.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า กฟล.สค.ชั้น๑ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	EKA๐๑	๑๒ ก.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย บริเวณ ช.โรงแก้ว	จุดปลดสายโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า	EKA๖S-๐๘ ปากช.โรงแก้ว	นายวิรัตน์ นาคสมัย โทร.๐๘๑-๔๔๙๗๘๑
๒	EKA๐๑	๑๒ ก.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		EKA๖S-๐๘ ปากช.โรงแก้ว	ปลายสาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณ ช.โรงแก้ว.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายอำนาจ เขียนทอง.....ตำแหน่ง.....ทผ.ปบ.....โทร.....๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐.....

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

( นายมานิช นนมนื่อ )

ตำแหน่ง.....รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟล.สค.ชั้น๑.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1,2 ฟีดเตอร์ EWA 1 จาก DDE ปกภ.โรงสกัด ถึง ปอชรสว  
ในวันที่ 12 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1173/64
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....


พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ อรุณประสิทธิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย อัทธวิท เทียมทอง

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

  
นาย อนันต์ อรุณประสิทธิ์ (นาย) 11 ก.ย. 64



ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไลน์ EKA01 บริเวณ DDE.ปากซอยโรงแก้ว ถึง ปลายสาย
2. กำหนดวันที่ทำงาน 12 ก.ย. 64 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สค. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1173/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 4 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 4 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 4 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายพนิต,นายศุภสวัสดิ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	EKA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		
3	EKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		
4	- ดับไฟเวลา 08.30 น.						
5	EKA06S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ช.โรงแก้ว
6	แจ้งขอทไลน์กระแสเข้าปลดจุดจัมเข้า DIS รหัส EKA06S-08 ออกทั้งสามเฟส						
7	หลังจากขอทไลน์กระแสเข้าปลดจุดจัมเข้า DIS รหัส EKA06S-08 ออกทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับกฟจ.สมุทรสาครรับทราบ						
9	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการ Test ไฟก่อนทำการ Short Ground						
10	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการ Short Ground จุด G2						
12	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
13	EKA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		
14	EKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
15	หลังจากกฟจ.สมุทรสาครปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
16	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
17	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
18	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครตรวจสอบ EKA06S-08 DIS.ปากซอยโรงแก้วให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส						
19	EKA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		
20	EKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		
21	- จ่ายไฟ						
22	แจ้งขอทไลน์กระแสเข้าจัมจุดจัมเข้า DIS รหัส EKA06S-08 เข้าทั้งสามเฟส						
23	หลังจากขอทไลน์กระแสเข้าจัมจุดจัมเข้า DIS รหัส EKA06S-08 เข้าทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
24	EKA06S-08	ปลด	สับ		สค.		DIS ช.โรงแก้ว
25	EKA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		
26	EKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						

ก่อน สฟ.400.ม.

DIS ติดตั้งชั่วคราวเลย ปากซอยประตูระบายน้ำทางน้ำจืด  
บ.กานดา

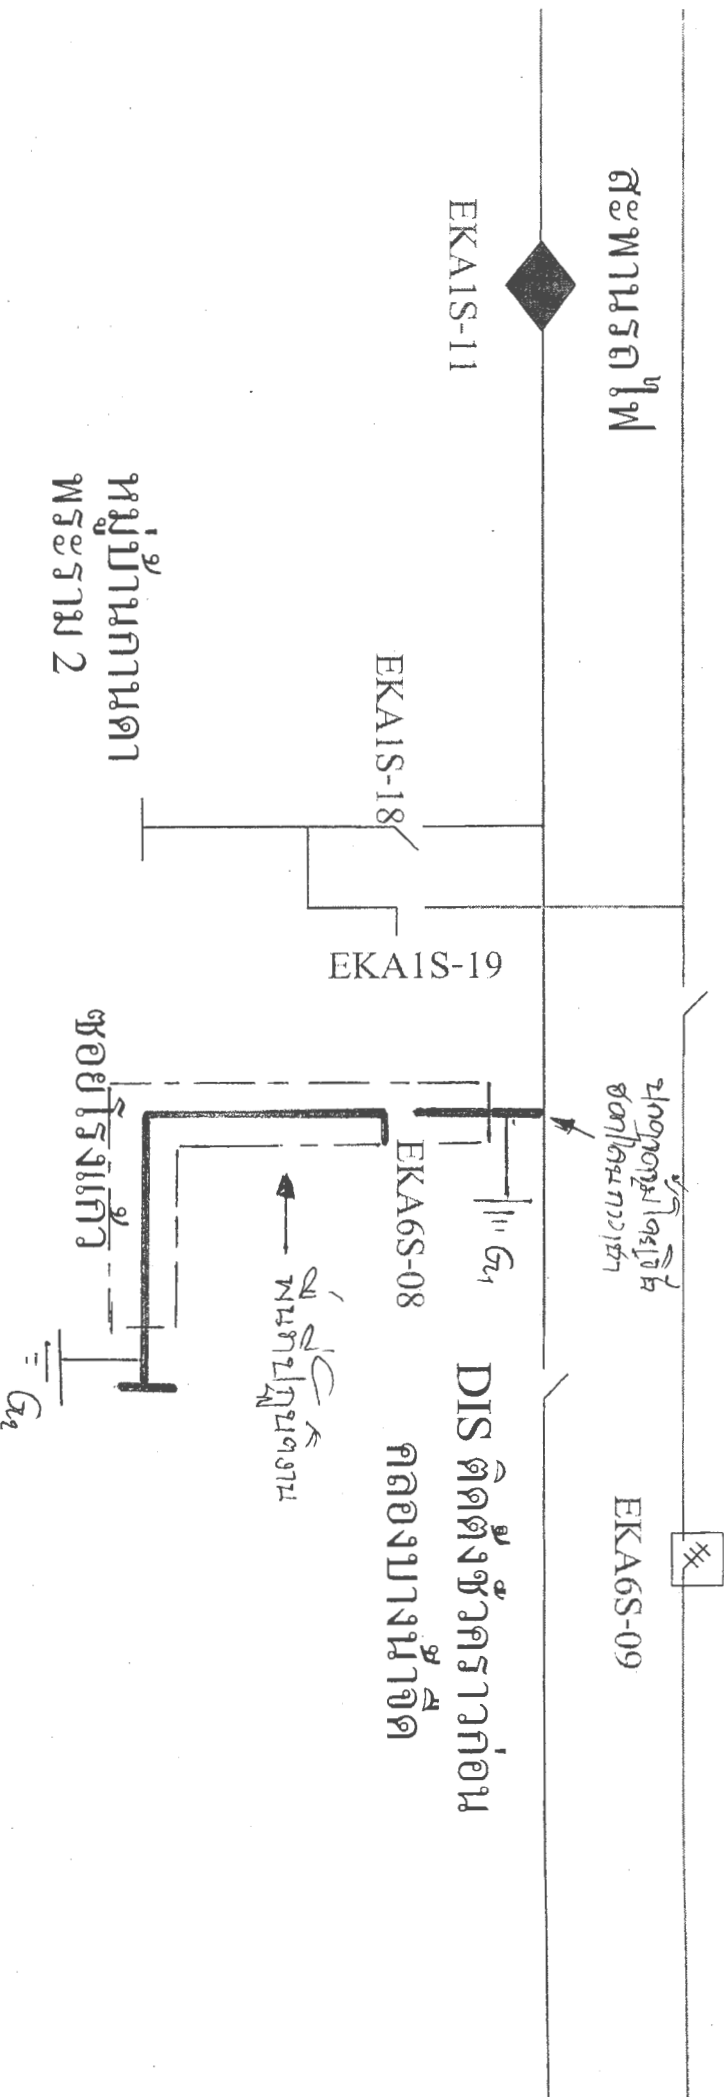

กำหนดการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

ก่อน สฟ.400.ม.

DIS ติดตั้งชั่วคราวเลย ปากซอยประตูระบายน้ำบางน้ำจืด  
บ.กานดา

