



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

10 ก.ย. 64

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.).- ๒๑๒๑/๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงศ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปักเสาเข็มใต้ไลน์แรงสูงรองรับวงจรใหม่เพิ่มระบบ ๒๒ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๓ KTU	๑๒ ก.ย. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เพื่อให้ ผจก.กทบ. ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ปักเสาใต้ไลน์ บริเวณหมู่ที่ ๑ ต.แคทราย	DIS ชั่วคราว ติดตั้งใหม่	SF๖ KTU ๓S-๐๘ โรงงานอิฐบุลล็อก	นายปรีชา แก้วสีม่วง ทผ.กส.กทบ. โทร. ๐๘๑-๒๕๑๕๒๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงานจำนวน ๒๐ ราย  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง ทผ.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร ๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผจก.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  ๑.๑  มีโอกาสชำรุด  ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์ )  
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

๖ กันยายน ๒๕๖๔

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. พิดเคอร์ KTU03 จาก PK 6๑ ติดใต้ไลน์ ถึง SF๖ KTU 3S-08.ร.ว. อีฮบ.๑๓.  
ในวันที่ 12 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1180/64  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทผ. สมชาย มาบัณฑิตย์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

( นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์ )

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น


ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้ว  
เสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	DIS ชค.ปากซอย รง.เดอะสตีล - SF6 KTU03S-08 โรงงานอิฐบล็อค					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ก.ย. 64	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1180/2564	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	10 กันยายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 กันยายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 กันยายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายภุชงค์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
4	DIS ชค.ไลน์KTU03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ		DIS ปากซอย รง.เดอะสตีล
5	แจ้ง กฟอ.กทบ.ตรวจสอบ SF6 KTU6S-08 ให้อยู่ตำแหน่ง Open พร้อม ล็อคคาน						
6	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1						
7	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2						
8	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
9	KTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU		-
10	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
11	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	KTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		-
13	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
14	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
15	DIS ชค.ไลน์KTU03	ปลด	สับ		กทบ		DIS ปากซอย รง.เดอะสตีล
16	KTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU		-
17	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



แผนผังสถานะปัจจุบัน ก้อนตลับไฟ บริเวณหมู่ที่ 1 ต.นคราย (เลขบ้านบ้านมีเขต)  
เพื่อให้ ผดส.ภาน. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี บีเคเสารแรงสูงขนาด 12.20 เมตร เชมไฮไดรอนร่ววงจรใหม่  
( ตามอนุมัติ ก.3 กวว.(วร).- 1314 สว. 7 ก.ค. 2564 ) WBS: P-TDD02.3-I-KTNNA.0006  
ในวันอาทิตย์ ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น.

หมายเหตุ  
มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจำนวน 20 ราย

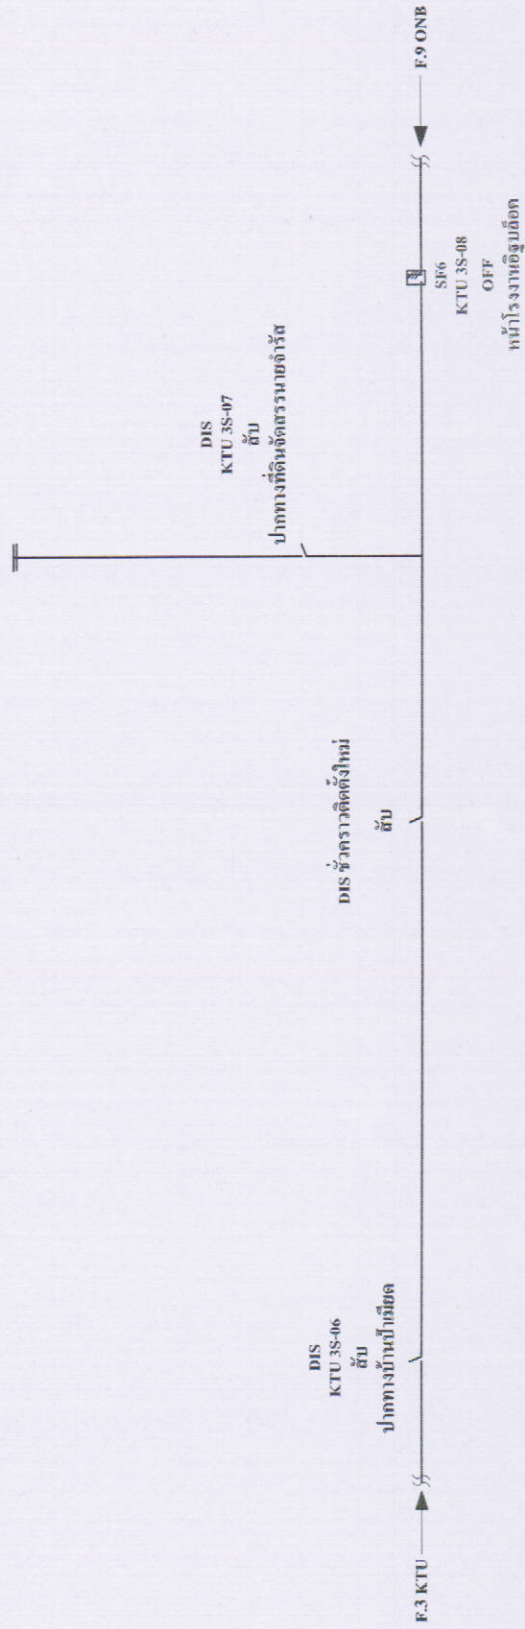

แผนผังสถานะปัจจุบัน หอสังเกตการณ์ บริเวณหมู่ที่ 1 ต.มทราย (ต.บ้านป่าเมียด)  
 เพื่อให้ ผศ.กาน. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี บีเคเสแรงสูงขนาด 12.20 เมตร แคมป์โรงรับวงจรใหม่  
 (ตามอนุมัติ ก.3 กวว.(วร).- 1314 ตว. 7 ก.ค. 2564) WBS: P-TDD02.3-I-KTNNA.0006  
 ในวันอาทิตย์ ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น.

หมายเหตุ มีไฟฟ้าได้รับผลกระทบจำนวน 20 ราย

เส้นทึบสีน้ำเงินในแผนที่แสดง 3 กอน.6 ตบไฟปฏิบัติงาน

จุด Shot Ground (G.1 – G.2)

