



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

15 ส.ค. 66

เลขที่ ก.๓ บล.(ป.บ.) ๑๗๑๔ /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หังสุวรรณ

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บั๊กเส้า พาดสายแรงสูง บริเวณ โค้งชายไข่ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BEU1	18 ส.ค.66	08.30 น.	16.30 น.	บั๊กเส้า พาดสายแรงสูง ๒๒ kV	BEU1S-10 BEU1S-11	BEU1S-14 BEU1S-11 จุดปลดสายแรง สูงข้ามถนน โดย ชอทไลน์	นายบุญฤทธิ์ พันธิ บุตร พง.6 ผกส

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) จาก แยกตาเพียง ถึง อบต.ลำพญาเก่า

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ทม.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ผจก.กฟอ.บางเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิดเดอร์ BEU1 จาก BEU 1S 10 ถึง BEU 1S-14  
ในวันที่ 18 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1181/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิดเดอร์ BEU1 จาก BEU 1S-11 ถึง PDE  
ในวันที่ 18 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1181/66

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ เกียรติคุณ ประสานงานขอตัดไฟกับ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์

(นายอภิสิทธิ์ เกียรติคุณ)  
๐๗๖.5 แทน ผอ.อป.ฯ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. บางเลน

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 2 .....แผ่น

แผนผังแนบ..... 1 .....แผ่น

ผจฟ. (สถานีฯ..... - .....)


เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกตาเพียง (BEU01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ส.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.บล.	งานที่ทำ	ปักเสา-พาดสายแรงสูง 22 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1181/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง		วันที่ 5 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดต่อนก่อนทำการสวิตชิง * หมายเหตุ กพอ.บล. ใช้บริเวณตาเพียง BEU04						
2	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		-
3	BEU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		- Load 5.4 MW
4	BEU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		- Load 1.8 MW
5	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV		-
6	BEV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		BEV		- Load 4.5 MW
7	ย้ายโหลด BEV03 บางส่วนไปรับไฟจาก BEU04						
8	BEU01S-14	ปลด	สับ		บล.		SF6 อบต.ลำพญา(เก่า)
9	BEU04S-03	ปลด	สับ		บล.		DIS แยกตาเพียง (Tie BEU04-BEV03)
10	BEV03S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS หน้า บ.เอเชียฯ
11	BEU01S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 อบต.ลำพญา(เก่า)
12	ย้ายโหลด BEU01 บางส่วนไปรับไฟจาก BEU04						
13	BEU01S-12	ปลด	สับ		บล.		DIS โคงงขายชาย(Tie BEU01-BEV03)
14	BEU01S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS โคงงขายชาย(ตั้งข้ามถนน)
15	เมื่อพร้อมดับไฟ						
16	BEU01S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 แยกตาเพียง
17	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการปลด DDE โลันวจร BEA01 บริเวณตั้งข้ามถนน (ตามผังแนบ) ออกทั้ง 3 เฟส (ปลดแบบมีไฟ)						
18	หลังจาก Hotline ปลด DDE โลันวจร BEA01 บริเวณตั้งข้ามถนน (ตามผังแนบ) ออกทั้ง 3 เฟส (ปลดแบบมีไฟ) เรียบร้อย						
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
23	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
24	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		-
25	BEU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		-
26	BEU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		-
27	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEV		-
28	BEV03R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		BEV		-
29	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
30	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
31	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
32	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
33	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
34	หลังจากผู้ควบคุมงาน ทำการปลด Short ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
35	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU	-	
36	BEU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU	-	
37	BEU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU	-	
38	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV	-	
39	BEV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		BEV	-	
40	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
41	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการเชื่อม DDE ไล่นวงจร BEA01 บริเวณดิ่งข้ามถนน (ตามผังแนบ) เข้าทั้ง 3 เฟส (เชื่อมแบบมีไฟ)						
42	หลังจาก Hotline เชื่อม DDE ไล่นวงจร BEA01 บริเวณดิ่งข้ามถนน (ตามผังแนบ) เข้าทั้ง 3 เฟส (เชื่อมแบบมีไฟ) เรียบร้อย						
43	BEU01S-10	ปลด	สับ		บล.	SF6	แยกตาเพียง
44	ย้ายโหลด BEU01 บางส่วนกลับจาก BEU04						
45	BEU01S-11	ปลด	สับ		บล.	DIS	โค้งขายขาย(ดิ่งข้ามถนน)
46	BEU01S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.	DIS	โค้งขายขาย(Tie BEU01-BEV03)
47	ย้ายโหลด BEV03 บางส่วนกลับจาก BEU04						
48	BEU01S-14	ปลด	สับ		บล.	SF6	อบต.ลำพญา(เก่า)
49	BEV03S-07	ปลด	สับ		บล.	DIS	หน้า บ.เอเชียฯ
50	BEU04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.	DIS	แยกตาเพียง (Tie BEU04-BEV03)
51	BEU01S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.	SF6	อบต.ลำพญา(เก่า)
52	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU	-	
53	BEU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU	-	
54	BEU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU	-	
55	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEV	-	
56	BEV03R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		BEV	-	
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

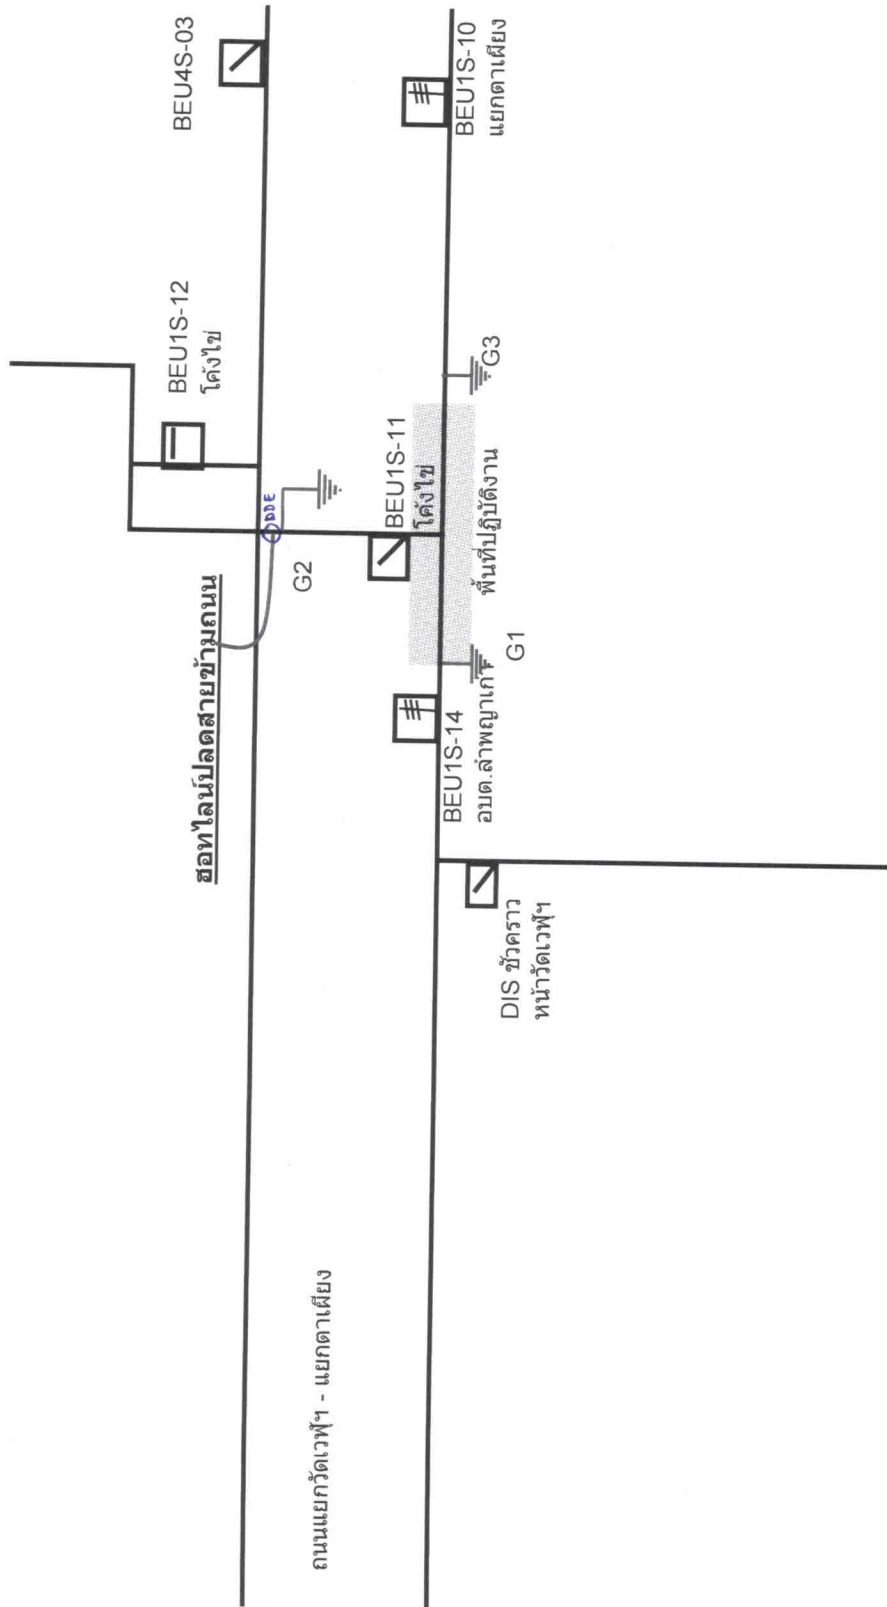

ผังดับไฟ 22 kV. วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โคงไซ
