



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.พทท. ๕๐๐ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธรินทร์ พงษ์สุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
 ส่งแบบฉบับ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๒๐ ส.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๑๑๕ เควี	SF6 แยกไฟสี่	UTG05R-01	นายอนุชา ชำนาญเรือ
	UTG09	๒๑ ส.ค. ๖๗	๑๐.๓๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๑๑๕ เควี	UTG09S-04	จุดตัด DDE	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ผ.ก.ปบ. โทร ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๔

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
 ๓. พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๓๖๐๐๓ , long: ๙๙.๗๕๕๒๑๔
 ๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๓๓๙๑๖๗ , long: ๙๙.๗๕๕๓๐๘

ลงชื่อ

(นายสุรวุฒิ บุญนาค)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG5 จาก SF6 ๖๓. แยกไฟสี่ ถึง UTG5R-01
 ในวันที่ 20 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1181/67
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ มีกมลพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ

(นายสุรวุฒิ บุญนาค)

อส.๓ หัวหน้าผ. คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กบบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. รฟค. ลบ., รฟค. ๒๓๓.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานีฯ -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทาสวิตชิง


บริเวณแยกไผ่สี- สระลงเรือ

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกไผ่สี- สระลงเรือ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ส.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1181/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์			วันที่	18 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	โหลด 8.13 MW
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	โหลด 16.3 MW
4	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	โหลด 2.32 MW
5	UTG05R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		กกจ.	R	สระลงเรือ
6	UTG09R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ลข.	R	บ้านตลุงเหนือ
7	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก UTG09						
8	UTG0BVB-01	ปลด	ล๊اب		UTG	CB	ขนานบัส
9	UTG05S-13	ปลด	ล๊اب		ลข.	DIS	ร้านจิ้งจอกค้ำวัสตุ
10	UTG05R-01	ล๊اب	ปลด		กกจ.	R	สระลงเรือ
11	UTG0BVB-01	ล๊اب	ปลด		UTG	CB	ขนานบัส
12	แจ้ง กฟส.กกจ. ทำการปลดสวิตชิงบัสมีดด้าน Load ของรีโคลสเซอร์ UTG05R-01 (สระลงเรือ) ออกทั้ง 3 เฟส						
13	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
14	SF6 ชั่วคราว	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		กกจ.	SF6	แยกไผ่สี
15	แจ้ง กฟส.กกจ. ตรวจสอบ SF6 รหัส UTG05S-08 (ดึงข้ามถนนแยกไผ่สี) อยู่สถานะ "ปลด" พร้อมล็อคคาน						
16	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียดและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
20	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	
21	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	
22	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	
23	UTG09R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ลข.	R	บ้านตลุงเหนือ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
25	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</i>							
26	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
29	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	
30	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	
31	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	
32	UTG09R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ลข.	R	บ้านตลิ่งเหนือ
33	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
34	SF6 ชั่วคราว	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทกจ.	SF6	แยกไฟสี่
35	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วน กลับจาก UTG09						
36	แจ้ง กฟส.ทกจ. ทำการสับสวิทช์ใบมีดด้าน Load ของรีโกลสเซอร์ UTG05R-01 (สละลงเรือ) เข้าทั้ง 3 เฟส						
37	UTG0BVB-01	ปลด	สับ		UTG	CB	ขนานบัส
38	UTG05R-01	ปลด	สับ คง Non-Reclosing		ทกจ.	R	สละลงเรือ
39	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.	DIS	ร้านจรุงเรืองค้าวัสดุ
40	UTG0BVB-01	สับ	ปลด		UTG	CB	ขนานบัส
41	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	
42	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	
43	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	
44	UTG05R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ทกจ.	R	สละลงเรือ
45	UTG09R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ลข.	R	บ้านตลิ่งเหนือ
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>							

சரிபார்க்க

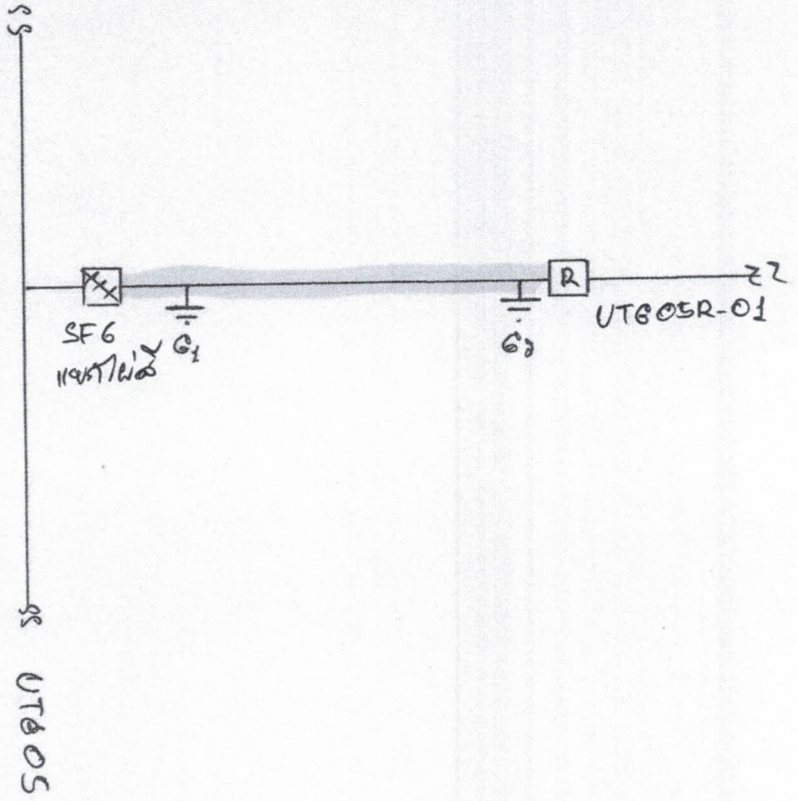

சரி
