



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.พทท. ๕๓๐ ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

19 ส.ค. 67

20 ส.ค. 67


ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๒๐ ส.ค.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๑๑๕ เควี	SF6 แยกไฟสี่	UTG05R-01	นายอนุชา ชำนาญเรือ
	UTG09	๒๑ ส.ค.๖๗	๑๐.๓๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๑๑๕ เควี	UTG09S-04	จุดตัด DDE	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ข.ผ.ก.ป. โทร ๐๙๔-๓๑๖๒๑๑๔


- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ๓. พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๓๖๐๐๓ , long: ๙๙.๗๕๕๒๑๔
๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๓๓๙๑๖๗ , long: ๙๙.๗๕๕๓๐๘

ลงชื่อ 
(นายสุรวุฒิ บุญนาค)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ UT๐9 จาก UT๐9S-04 ถึง จุดตัด DDE
ในวันที่ 21 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1181/67 1182/67
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข _____
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข _____
- พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ค. มิกษพัทธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ


(พงษ์ศักดิ์ ชพงษ์)
ว.ค.๓ กทม. ข.ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. ทพธ.๒๐; ทพธ.๕๓๖.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง.....2.....แผ่น

แผนผังแนบ.....1.....แผ่น



ผจพ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



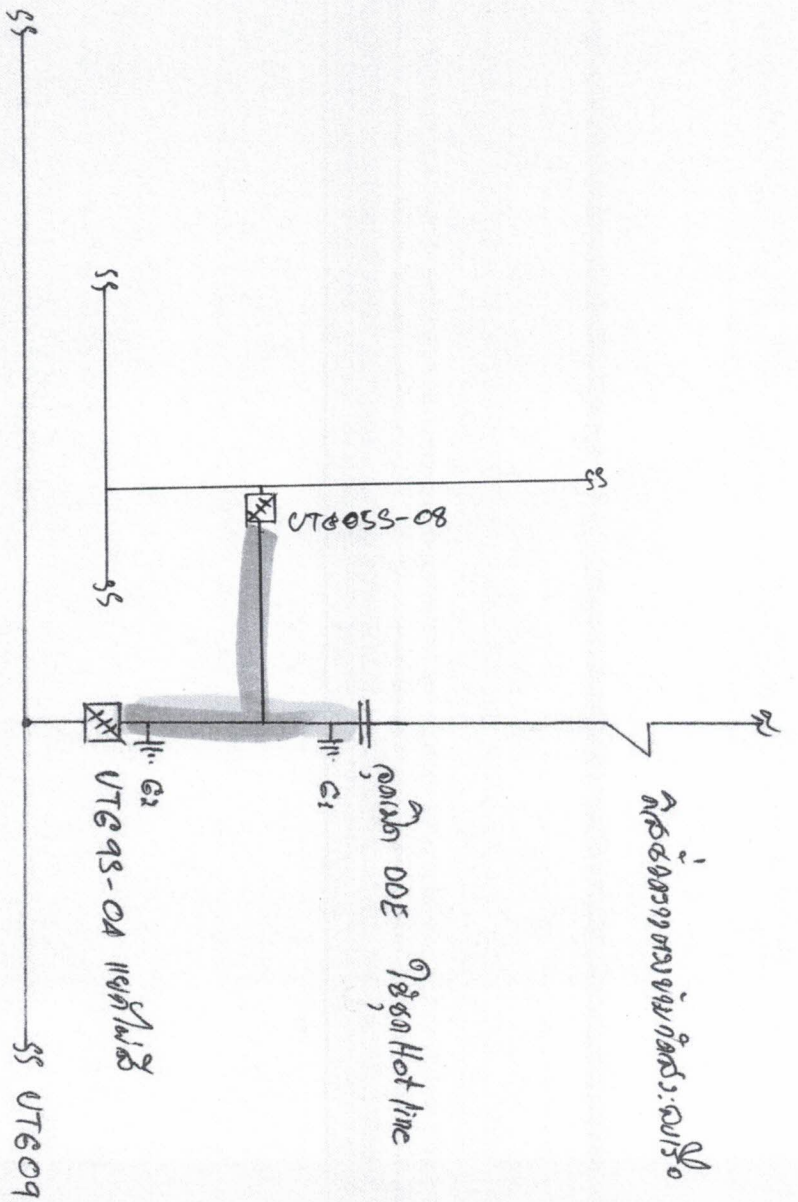
(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทาสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกไผ่สี- ตรงข้ามวัดสระลงเรือ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ส.ค. 67	ระหว่าง	10.30 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ 115 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1182/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	18 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,น.ส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมโนช 3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีระวัชร,นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	โหลด 8.13 MW
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	โหลด 16.3 MW
4	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	โหลด 1.98 MW
5	UTG05R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ทกจ.	R	สระลงเรือ
6	UTG09R-01	Normal	Non-Reclosing,GND		ลข.	R	บ้านตลุงเหนือ
7	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก UTG05						
8	Sw. by Pass	ปลด	สับ		ลข.	R	UTG09R-01 (บ้านตลุงเหนือ)
9	UTG09R-01	สับ	ปลด		ลข.	R	บ้านตลุงเหนือ
10	UTG0BVB-01	ปลด	สับ		UTG	CB	ขนานบัส
11	UTG05S-13	ปลด	สับ		ลข.	DIS	ร้านจรุงเรืองค้าวัสดุ
12	UTG09S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทกจ.	SF6	แยกไผ่สี
13	UTG0BVB-01	สับ	ปลด		UTG	CB	ขนานบัส
14	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
15	แจ้งชุดขอทไลน์ ทำการตัด DDE บริเวณตรงข้ามวัดสระลงเรือ ออกทั้ง 3 เฟส (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
16	แจ้ง กฟส.ทกจ. ตรวจสอบ SF6 รหัส UTG05S-08 (ดึงข้ามถนนแยกไผ่สี) อยู่สถานะ "ปลด" พร้อมล๊อคคาน						
17	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียดและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
21	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	
22	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	
23	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	UTG05R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ทกจ.		R	สละลงเรือ
25	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย							
26	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</i>								
27	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหนดกลับ							
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1							
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2							
30	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-	
31	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-	
32	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-	
33	UTG05R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ทกจ.		R	สละลงเรือ
34	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
35	แจ้งชุดขอทไลน์ ทำการเชื่อม DDE บริเวณตรงข้ามวัดสละลงเรือ เข้าทั้ง 3 เฟส (ไม่มีโหนดผู้ใช้ไฟ)							
36	ย้ายโหนด UTG09 บางส่วน กลับจาก UTG05							
37	UTG0BVB-01	ปลด	สับ		UTG		CB	ขนานบัส
38	UTG09S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทกจ.		SF6	แยกไฟสี่
39	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		ลข.		DIS	ร้านจรุงเรื่องค้ำวัสดุ
40	UTG0BVB-01	สับ	ปลด		UTG		CB	ขนานบัส
41	UTG09R-01	ปลด	สับ คง Non-Reclosing	GND	ลข.		R	บ้านตลุงเหนือ
42	Sw. by Pass	สับ	ปลด		ลข.		R	UTG09R-01 (บ้านตลุงเหนือ)
43	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	
44	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	
45	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	
46	UTG05R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ทกจ.		R	สละลงเรือ
47	UTG09R-01	Non-Reclosing, GND	Normal		ลข.		R	บ้านตลุงเหนือ
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>								



หมื่นอนันต์

(นายอนุชา ชำนาญเรือง)
 ๗๙.๓๗.๓๗.๑.๗๗๗.
