



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline  
วันที่ 15 ก.ย.64

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๒๑๓๐/๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายภคพงศ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปักเสา-พาดสายแรงสูงวงจรใหม่เพิ่ม ๑ วงจรระบบ ๒๒ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วันเดือนปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๓ KTU	๑๕ ก.ย. ๖๔	<del>๐๘.๐๐</del> น. ๐๘.๐๐	๑๗.๐๐ น.	เพื่อให้ ผจก.กทบ. ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ปักเสาและพาดสายเคเบิลแรงสูงเพิ่มอีก ๑ วงจร พื้นที่ชนแดน กฟน. บริเวณหมู่ที่ ๑ ต.แคราย	DIS KTU ๓S-๐๖ แยกบ้านป่าเมียด	DIS ชั่วคราวติดตั้งใหม่ (D.2) ชนแดน ออม. 100ยว/1๓๐ค/11ป/11คว	นายปรีชา แก้วสีม่วง หม.กส.กฟอ.กทบ. โทร. ๐๘๑-๒๕๑๕๒๘๘

11 ก.ย 2 ข้อจร.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงานจำนวน ๒๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง หม.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร ๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟน. (หากมีโอกาสชำรุด ผจก.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  ๑.๑  มีโอกาสชำรุด  ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*

(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

๗ กันยายน ๒๕๖๔

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ KTU03 จาก แยกบ้านป่าเมียด ถึง DIS ๐๓.๓๑๖,ใหม่ (P2) ๐๖๔๔๕ กฟน.อม. 1186/64 100ยว/1๓๐ค/11ป/11คว ในวันที่ 1๙ ก.ย ๖๔ ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 2 ข้อจร.

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย สมพร จิตรภน-ศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สมชาย มาบัณฑิตย์ 11 ก.ย. 64

(สมพร จิตรภน-ศักดิ์)  
๐๘๓.๗ 1๓๕๔ นว.ฉพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น

เรียน ผจก. กฟน.อม. , กฟอ. กทบ.  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจฟ. (สถานี)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้ว  
เสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

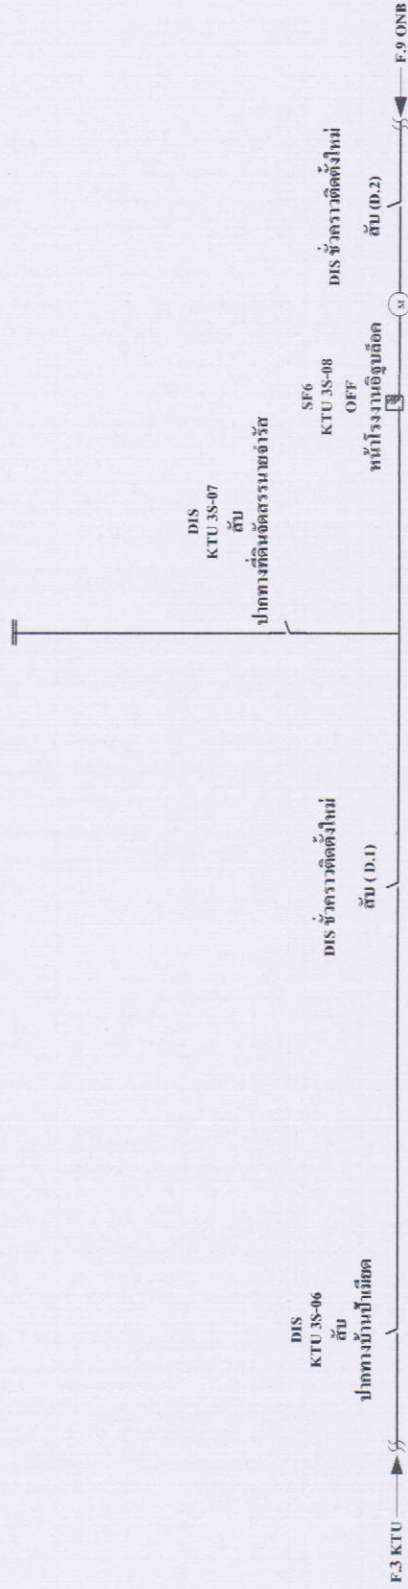
## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS KTU03S-06 (แยกบ้านป่าเมียด) - DIS ชค.ติดตั้งใหม่ (D2 ชนแดน กฟภ.อมน.)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ก.ย. 64	เวลา	<del>08.30</del> 08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.กทบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1186/2564	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	11 กันยายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 กันยายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 กันยายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		-
3	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
4	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
5	KTU03S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ		DIS บ้านยายเมียด
6	DIS ชค.ไลน์ONB09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS (D2)เลยมิเตอร์แบ่งแดน 2 ช่วงเสา
7	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1						
8	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2						
9	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
10	KTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU		-
11	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
12	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
13	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	KTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		-
15	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
16	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
17	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
18	DIS ชค.ไลน์ONB09	ปลด	สับ		อมน.		DIS (D2)เลยมิเตอร์แบ่งแดน 2 ช่วงเสา
19	KTU03S-06	ปลด	สับ		กทบ		DIS บ้านยายเมียด
20	KTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU		-
21	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
22	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แผนส่งสถานะปัจจุบัน ก่อนดับไฟ บริเวณพื้นที่ 1 ต.ทราย (โดยบ้านบ้านมีเขต)  
 เพื่อให้ สกส.ทท. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี บิดแรงสูงขนาด 12.20 เมตร แขนงได้นำรองรับวงจำหน่าย  
 และพาดสายเคเบิลแรงสูงพื้นที่ 1 วรรจ (งานขนแดน กฟน.)  
 (ตามอนุมัติ ก.3 กว. (วร.) - 1314 ล.ว. 7 ก.ล. 2564) WBS: P-TDD02.3-I-KTNN.A.0006  
 ในวันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น.

หมายเหตุ  
 มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจำนวน 23 ราย



แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังดับไฟ บริเวณหมู่ที่ 1 คมทราย (เลขบ้านเป็นสีแดง)  
 เพื่อให้ ศกส.ภทท. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 คิว บีที่เสถียรสูงขนาด 12.20 เมตร เชนโมไดร์จรับวงจรใหม่  
 และพาดสายเคเบิลแรงสูงเพิ่มเติมอีก 1 วงจร (งานขนดิน กฟน.)

(ตามอนุมัติ ก.3 กวว.(วร).- 1314 อ.ว. 7 ก.ภ. 2564) WBS: P-TDD02.3-I-KTNNA.0006

ในวันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น.

หมายเหตุ มีผู้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบจำนวน 23 ราย

เส้นที่ขึ้นมีสีน้ำเงินคือวงจรที่เตอร์ 3 ทบท.6 ต้นไฟปฏิบัติงาน

จุด Short Ground (G.1-G.2)

มิเตอร์แต่ละคน

