



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PUBLIC UTILITY REGULATORY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ คปบ.(กฟ.)-๘๕๒/๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายทัศนัย พงษ์สุวรรณจิล  
ชื่อผู้ส่ง นายไกรสร พวงหอม

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ศรีประจันต์

ด้วย กฟส.อ.ศรีประจันต์ จะขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนและปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายจากสายเปลือยเป็นสายเคเบิล บริเวณบ้านหนองสรวง - โรงสีคลองข่อม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SPC๐๓	๑๔ ส.ค.๒๕๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณโรงสีคลองข่อม	Dis วัดสามจูน SPC๓S-๑๗	SF๖ คลงข่อม DBA๘S-๐๕	นายจิระยุทธ อาจศิริ โทร.๐๘๗-๑๕๗- ๗๘๐๕
๒.	SPC๐๕	๑๔ ส.ค.๒๕๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านหนองสรวง	Dis ชด. วัดสามจูน SPC๕S-๕๐	จุดตัด DDE บ้านดอนกระเทือ	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีไหลัดผู้ใช้ไฟ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายธนัช...เชี่ยวชาญ...ตำแหน่ง...พวง.๖ ผจก.กฟส.อ.ศรีประจันต์...โทร...๐๖๔-๘๗๘-๘๘๕๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายไกรสร..พวงหอม..)

ตำแหน่ง..ผจก.กฟส.อ.ศรีประจันต์..

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SPC05 จาก SPC55-50 ถึง DDE บ้านดอนกระเทือ  
ในวันที่ 14 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1195/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิธวัช วัฒนชัย ๖๕.๑.๖๐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.อหิ์ เกียรติฯ

กรมพร ทัศนัยเกษมศรี  
นายกรมพร ทัศนัยเกษมศรี  
๐๐๓.๖ ปฏิบัติงานแทน น.ค.ป.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ คปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.อ.ศรีฯ

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 4 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี - )


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านหนองสรวง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ส.ค. 66	เวลา	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ศปจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1195/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีร์วัชร เสมามิ่ง		วันที่ 8 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายจิราวัฒน์, นายพิชชา, นายวีร์วัชร, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, น.ส.พิชชา, นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPC05R-01	Normal	Nonreclosing		ศปจ.	R	บ้านดอนปุรุ
3	เมื่อพร้อมดับไฟ						
4	DIS ชค. SPC05	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ศปจ.	DIS	วัดสามจุ่น
5	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
6	แจ้ง กฟจ.ศปจ Test ไฟ Shot Ground จุด G1						
7	แจ้ง กฟจ.ศปจ Test ไฟ Shot Ground จุด G2						
10	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้ง Test ไฟ Shot Ground ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
11	แจ้งปฏิบัติงานได้						
12	SPC05R-01	Nonreclosing	Normal		EGAT	R	บ้านดอนปุรุ
<b>** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า **</b>							
13	เมื่อ กฟส.ศปจ พร้อมดับไฟเชื่อม DDE บ้านดอนกระโทก ตามเอกสารแนบ 3						
14	ตรวจสอบ DIS ชั่วคราวบ้านหนองสรวง ดำเนินการรื้อถอนต่อตรง เรียบร้อย						
15	SPC03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศปจ.	R	หน้าโรงงานสุพรรณพิศดาร
16	SPC03S-18	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ศปจ.	DIS	ตรงข้ามโรงคลองชะอม
17	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
18	แจ้ง กฟจ.ศปจ Test ไฟ Shot Ground จุด G3						
19	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้ง Test ไฟ Shot Ground จุด G5 พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
20	แจ้งปฏิบัติงานได้						
21	เมื่อ กฟส.ศปจ เชื่อม DDE บ้านดอนกระโทก แล้วเสร็จ พร้อมย้ายไหลดกลับ						
22	แจ้ง กฟจ.ศปจ ปลด Shot Ground จุด G1						
23	แจ้ง กฟจ.ศปจ ปลด Shot Ground จุด G2						
24	แจ้ง กฟจ.ศปจ ปลด Shot Ground จุด G3						
25	SPC05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศปจ.	R	บ้านดอนปุรุ
26	จ่ายไฟ						
27	DIS ชค. SPC05	ปลด	สับ		ศปจ.	DIS	วัดสามจุ่น
28	ย้ายไหลด SPC05 กลับจาก SPC03						
29	SPC03S-18	ปลด	สับ		ศปจ.	DIS	ตรงข้ามโรงคลองชะอม
30	DIS ชค. SPC03	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ศปจ.	DIS	สะพานคลองชะอม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	SPC03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศปจ.		R	หน้าโรงงานสุพรรณฟู้ดแวร์
32	SPC05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศปจ.		R	บ้านดอนปรู
** สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด **								


แผนงานดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านสามจุ่น - โรงเรียนคลองชะอม

เอกสารแนบ 1

กฟศ.อ.ศรีประจันต์

\*แผนผังการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงานและพื้นที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน\*


วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566

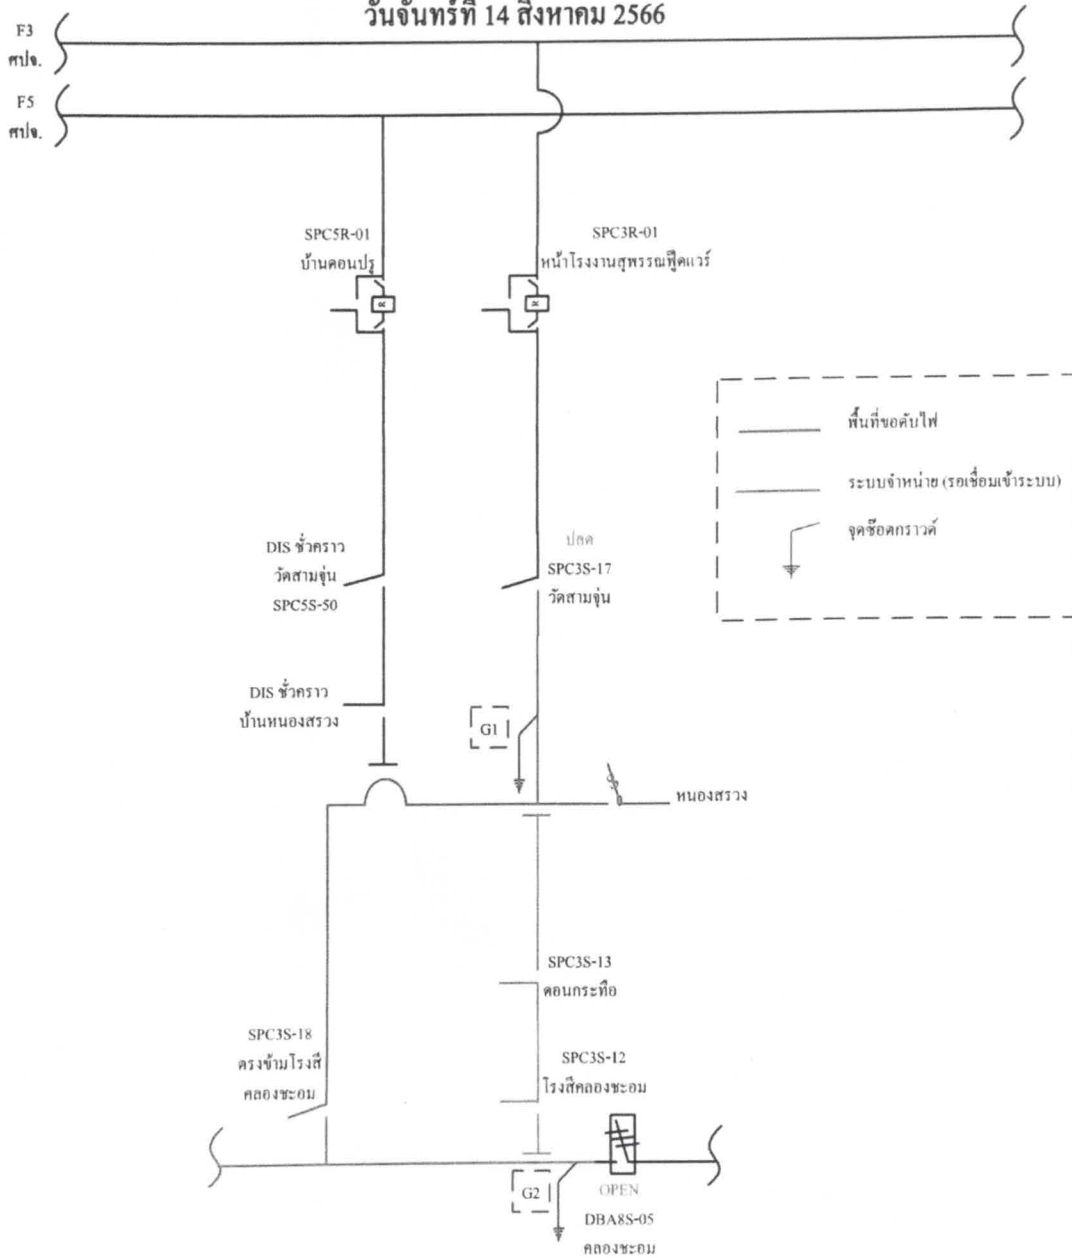

หมายเหตุ

1. งานดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านสามจุ่น - โรงเรียนคลองชะอม
2. วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.
3. (F3 สปจ.) ดับไฟจาก DIS วัดสามจุ่น SPC3S-17 - SF6 คลองชะอม DBA8S-05

**\*แผนผังการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน\***  
**วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566**

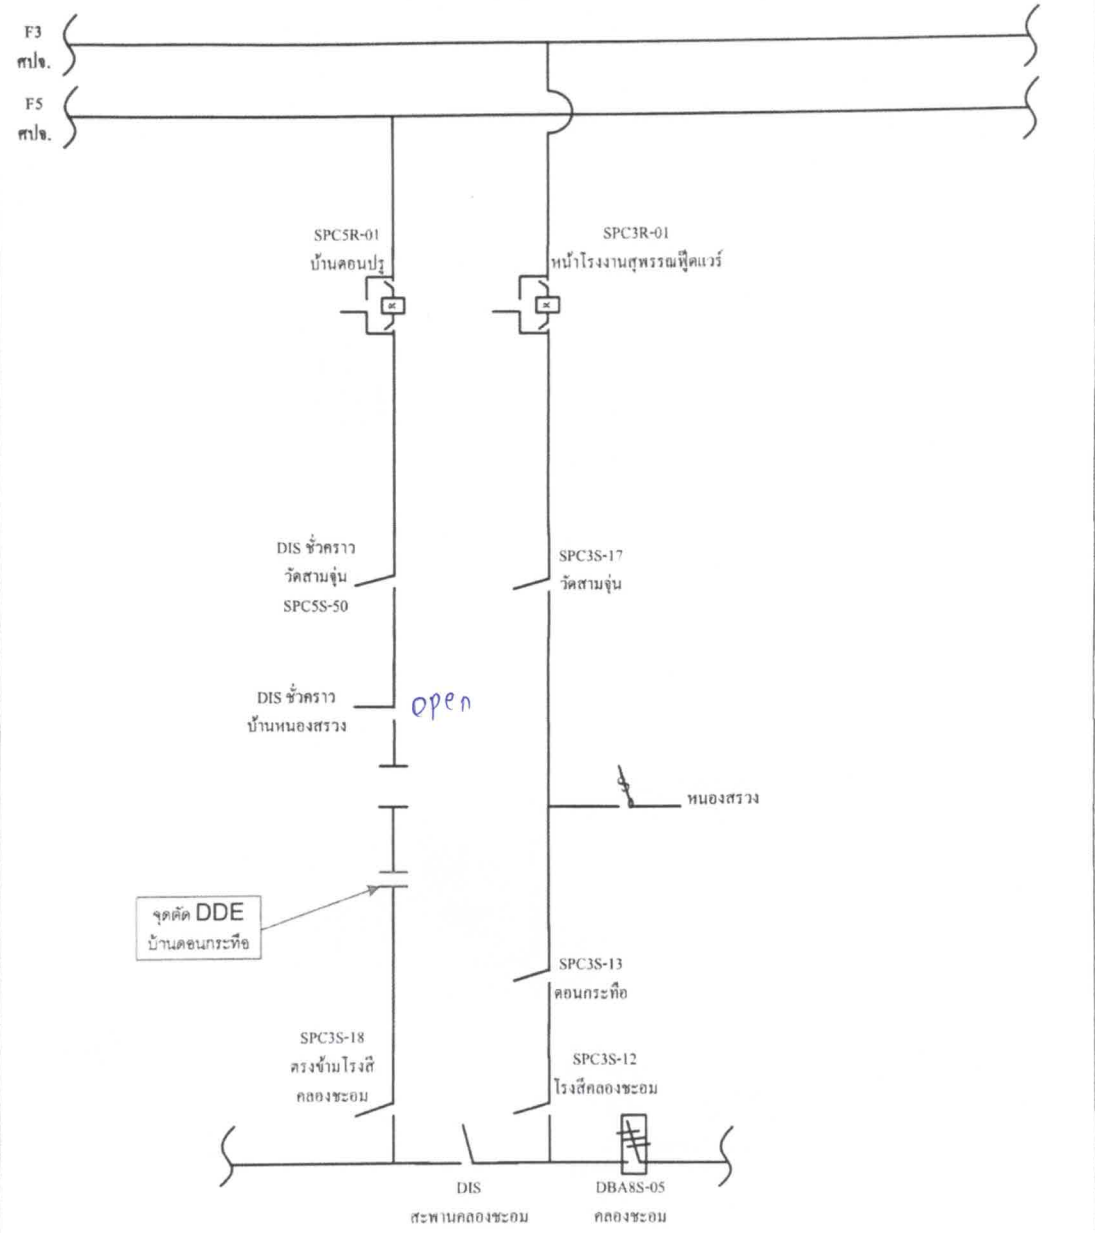

**หมายเหตุ**

- 1. (F3 สปจ.) จ่ายไฟถึงจุดตัด DDE บ้านดอนกระเทียม


แผนงานดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านสามจุ่น - โรงเรียนคลองชะอม

กฟ.ส.อ.ศรีประจันต์

เอกสารแนบ 3

\*แผนผังการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงานและพื้นที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน\*

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566

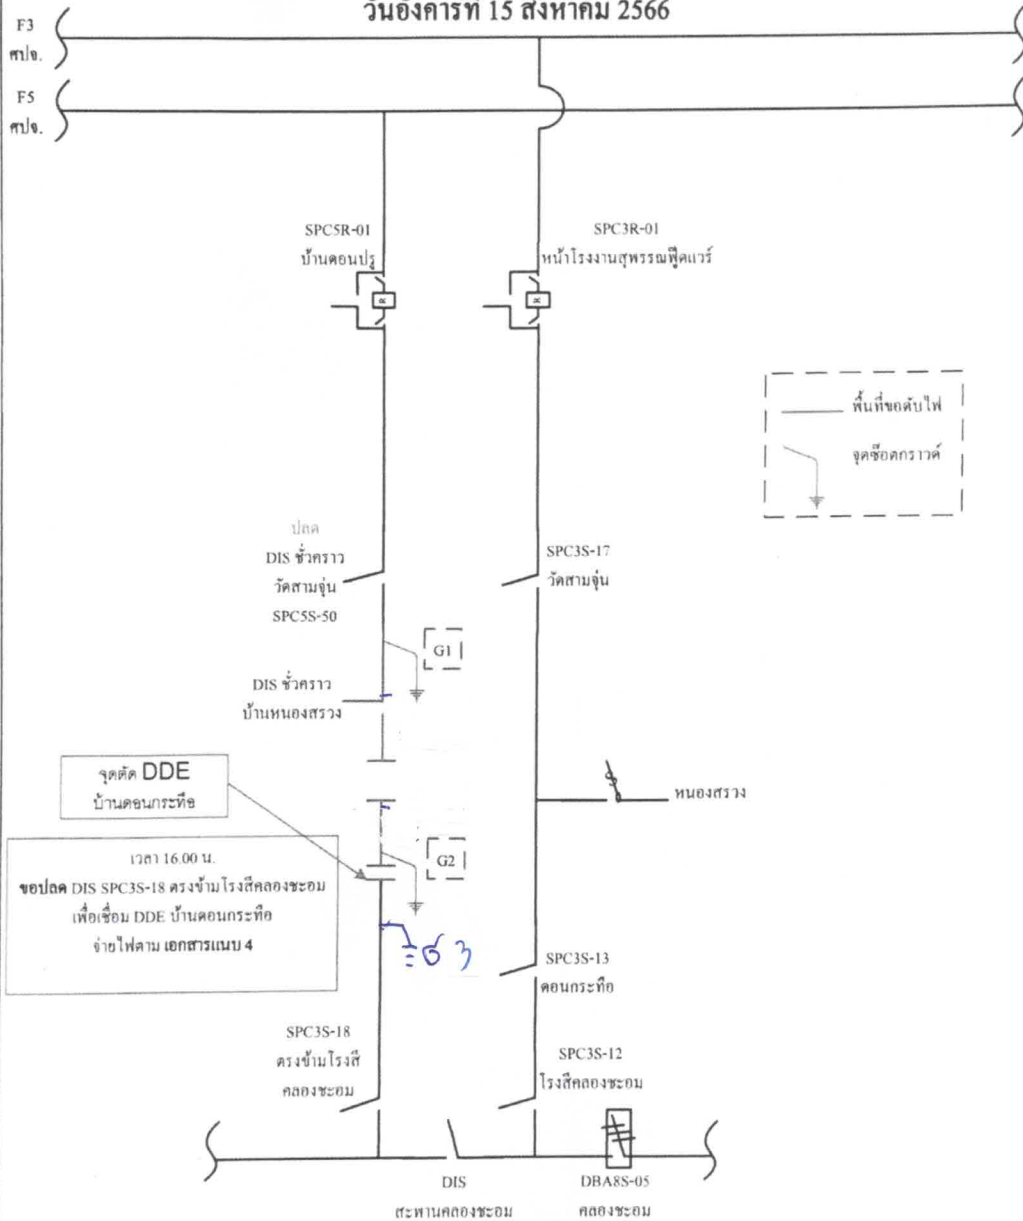

หมายเหตุ

1. งานดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านสามจุ่น - โรงเรียนคลองชะอม
2. วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.
3. (F5 สปจ.) ดับไฟจาก DIS ชั่วคราววัดสามจุ่น SPC5S-50 - จุดตัด DDE บ้านดอนกระเทียม

# แผนผังการจ่ายไฟเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

