



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

23 ส.ค. 67

วิญยอมดับไฟ

เลขที่ ก.ต.กฟส.กทท.(นน) - ๑๗๑/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช วาสูกวี

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทท.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทท. จะดำเนินการ...ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ เชียงสะพานท่าจีน ๒ จนถึง เสาต้น DDE มุ่งตรงข้าม
เสาสายส่ง SD-SA๒ หมายเลข ๒๘๑ พื้นที่ หมู่ที่ ๑ ต.สวนส้ม (เสาสัญญาณ TRUE หมายเลข SMK ๗๒๔๗A) สถานีไฟฟ้า กระทบแบน ๕
ตามแผนผังแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTE ๐๒	๒๕ ส.ค. ๒๕๖๗	๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ เชียง สะพานท่าจีน ๒ จนถึง เสาต้น DDE	เชียงสะพานท่าจีน ๒	เสาต้น DDE	นายนพพร ชาวไชยศรี
๒.	KTE ๐๗				มุ่งตรงข้ามเสาสายส่ง SD-SA๒ หมายเลข ๒๘๑ พื้นที่ หมู่ที่ ๑ ต.สวนส้ม (เสาสัญญาณ TRUE หมายเลข SMK ๗๒๔๗A)		เสาต้น DDE มุ่งตรงข้ามเสา สายส่ง SD-SA๒ หมายเลข ๒๘๑ พื้นที่ หมู่ที่ ๑ ต.สวนส้ม	ผ.บ. กฟส.กทท. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ เชียงสะพานท่าจีน ๒ จนถึง เสาต้น DDE มุ่งตรงข้ามเสาสายส่ง SD-SA๒ หมายเลข ๒๘๑...
พื้นที่ หมู่ที่ ๑ ต.สวนส้ม คือ ๑๕๙ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ผ.บ. กฟส.กทท. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๖๔๒๙๒๑ Long: ๑๐๐.๒๓๑๑๘๔
๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๖๓๔๘๕๗ Long: ๑๐๐.๒๒๑๐๕๖

(นายมาโนช วาสูกวี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทท.

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ KTE2 จาก KTE ๒S-11 ถึง DIS ๕๐. ไร่ สัญญาณ True
ในวันที่ 25 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1197/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก KTE ๒S-10 ถึง DDE ๕. ๕๖๖๖ ไร่ ๕๖๖๖
ในวันที่ 25 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิเศษ กสิณระดม ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย นพพร ชาวไชยศรี

20 ส.ค. 67

(นาย พิเศษ กสิณระดม)

อสก.๕ โทร. ๒๕๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. กทช.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 9 แผ่น


ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ ม.1 ต.สวนส้ม (KTE02,07)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ส.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	เวลา	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กทบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1197/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	20 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายโมฆ 2. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
3	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
4	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
5	KTE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
6	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
7	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
8	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
9	BNP04R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.	SCADA	R ริมคลองดำเนิน
10	BNP10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT, GND		บพว.	SCADA	R แยกวัดราช
11	ย้ายโหลด KTE07 บางส่วนไปรับไฟจาก BNP10						
12	KTEBVB-01	ปลด	สับ		KTE		- ขนานบัส
13	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		- ขนานบัส
14	BNP04S-12	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ริมคลองดำเนินตรงข้ามวัดสวนส้ม
15	BNP10S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ก่อนป้อมตำรวจ
16	KTE07S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ตรงข้ามร้านหมูกระทะเชิงสะพานทำจัน
17	BNP04S-12	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ริมคลองดำเนินตรงข้ามวัดสวนส้ม
18	KTEBVB-01	สับ	ปลด		KTE		- ขนานบัส
19	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		- ขนานบัส
20	ย้ายโหลด KTE02 บางส่วนไปรับไฟจาก KTE03						
21	KTE02S-16	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 แสนร์กรีสรอร์ท
22	KTE02S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS เชิงสะพานทำจันฝั่งบ้านแพ้ว
23	เมื่อพร้อมดับไฟ						
24	DIS.ชค.ไลน์ KTE02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ชค.เสาสัญญาณ True
25	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลดโหลด วงจร KTE07 บริเวณพื้นที่ดับ (ตามแผนผัง) ออก						
26	หลังจากทำการปลดโหลด วงจร KTE07 บริเวณพื้นที่ดับ (ตามแผนผัง) ออก เรียบร้อย						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการปลด DDE วงจร KTE07 บริเวณ บ.ธนนต์ โพลีแพค (ตามแผนผัง) ออก						
28	หลังจาก Hotline ทำการปลด DDE วงจร KTE07 บริเวณ บ.ธนนต์ โพลีแพค (ตามแผนผัง) ออก เรียบร้อย						


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
30	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
31	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
32	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G3						
33	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
34	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
35	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
36	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
37	KTE03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
38	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
39	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
40	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
41	BNP04R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		บพว.		R ริมคลองดำเนิน
42	BNP10R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		บพว.		R แยกวัดราช
43	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
44	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
45	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
46	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
47	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G3						
48	หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
49	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
50	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
51	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
52	KTE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
53	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
54	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
55	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
56	BNP04R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.		R ริมคลองดำเนิน
57	BNP10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		บพว.		R แยกวัดราช
58	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
59	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการเชื่อม DDE วงจร KTE07 บริเวณต้นบักอาร์มข้ามถนน (ตามแผนผัง) เข้า						
60	หลังจาก Hotline ทำการเชื่อม DDE วงจร KTE07 บริเวณต้นบักอาร์มข้ามถนน (ตามแผนผัง) เข้า เรียบร้อย						
61	Dis.ไลน์ KTE02	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ชค.เสาสัญญาณ True
62	ย้ายโหลด KTE02 บางส่วนกลับจาก KTE03						
63	KTE02S-11	ปลด	สับ		กทบ.		DIS เชิงสะพานท่าจีนฝั่งบ้านแพ้ว
64	KTE02S-16	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 แสนรักริสอร์ท

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนดับไฟ บริเวณ ถนน สค. 3011 (ฝั่งไป อ.บ้านแพ้ว)
 ตั้งแต่ เชิงสะพานท่าจีน 2 จนถึง พื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.สวนส้ม (เสาสัญญาณ TRUE หมายเลข SMK 7247A)
 เพื่อให้ชุดงาน ผบ.ภพ.ส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ เชิงสะพานท่าจีน 2
 จนถึง พื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.สวนส้ม (เสาสัญญาณ TRUE หมายเลข SMK 7247A)
 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. 2567 เวลา 8.30 – 17.00 น.

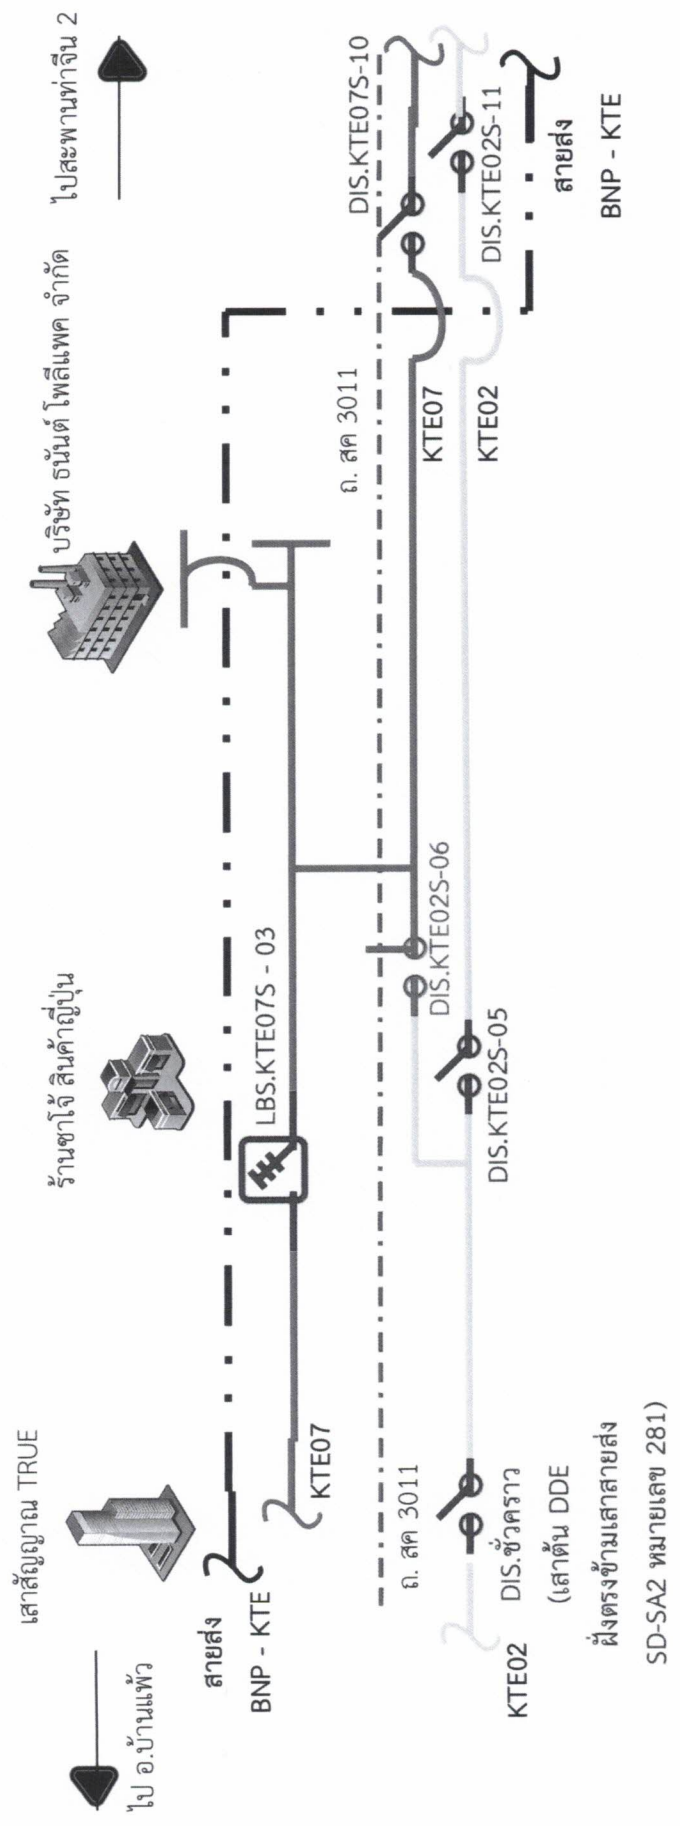

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 159 ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังดับไฟ บริเวณ ถนน สค. 3011 (ฝั่งไป อ.บ้านแพ้ว)
 ตั้งแต่ เชิงสะพานท่าจีน 2 จนถึง พื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.สวนส้ม (เสาสัญญาณ TRUE หมายเลข SMK 7247A)
 เพื่อให้ชุดงาน ผบ.กพล.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ เชิงสะพานท่าจีน 2
 จนถึง พื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.สวนส้ม (เสาสัญญาณ TRUE หมายเลข SMK 7247A)
 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. 2567 เวลา 8.30 – 17.00 น.

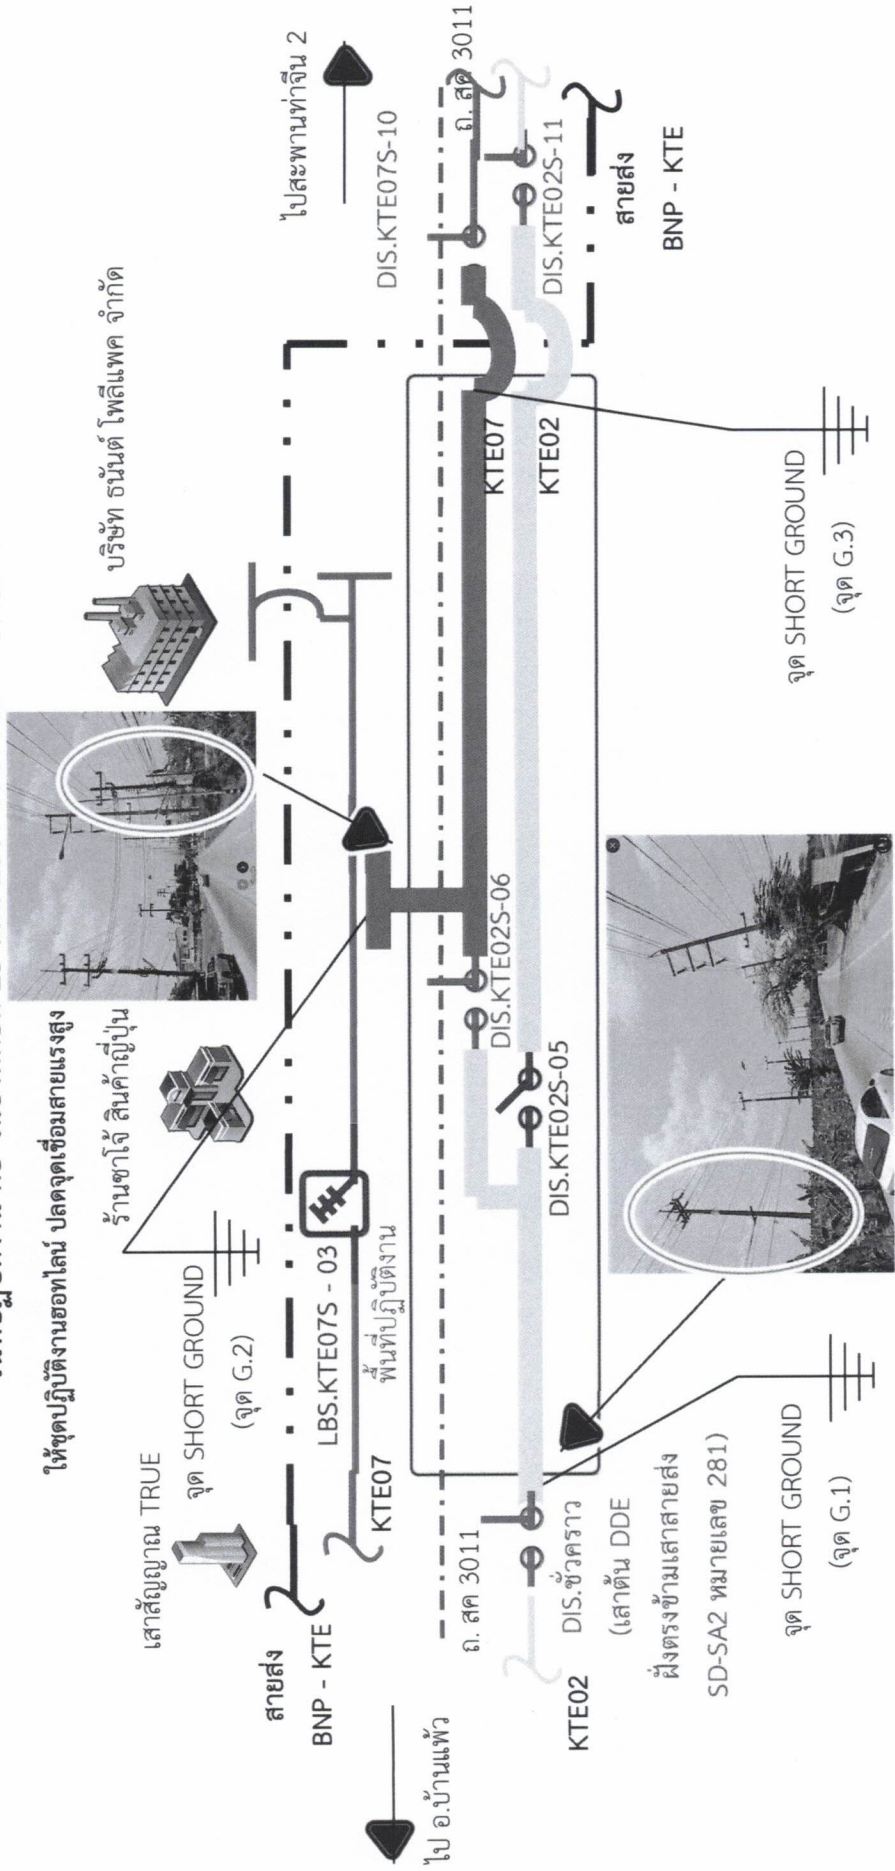

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 159 ราย

พื้นที่ดับไฟ
