

เลขที่ วก.ค.สปจ.(กป.)- ๑๐๓๕ /๒๕๖๔  
 ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
 ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔  
 ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ศรีประจันต์

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ศรีประจันต์ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง หลัง DIS ชั่วคราวตลาดนัดบ้านไร่ หมู่ที่ ๑ ต.วัง  
 อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SPC05 หลัง DIS ชั่วคราวตลาด นัดบ้านไร่	๒๓ ก.ย. ๒๕๖๔	๐๘.๓๐น.	๑๖.๓๐น.	เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง เป็นสายเคเบิล SAC ๑๘๕ ค.ม.ม.	DDEจุดAตรง ข้ามตลาดนัด บ้านไร่	DIS ชั่วคราวบ้าน คลองบาง	นายจิระยุทธ อางศิริ โทร.๐๘๗-๑๕๗-๗๘๐๕
๒.	SPC05 หลัง DIS ชั่วคราวตลาด นัดบ้านไร่	๒๓ , ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๔	๐๘.๓๐น.	๑๖.๓๐น.	เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง เป็นสายเคเบิล SAC ๑๘๕ ค.ม.ม.	DIS ชั่วคราว ตลาดนัดบ้าน ไร่	DIS ชั่วคราวบ้าน คลองบาง	นายจิระยุทธ อางศิริ โทร.๐๘๗-๑๕๗-๗๘๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีโหลดยุ้ใช้ไฟ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิระยุทธ อางศิริ ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ศรีประจันต์ โทร. ๐๘๗-๑๕๗-๗๘๐๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี.)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ศรีประจันต์

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. ทพิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ SPC05 จาก DDEจุด A ขึ้นตลาดนัดบ้านไร่ Dis ๕๓ บ้านคลองบาง  
 ในวันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1199/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมิทธิ์ สันตสุข ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจิระยุทธ อางศิริ

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)  
 ผ.จก. ๗ กฟส.ศรีประจันต์

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
 เรียน ผ.จก. กฟภ.๓  
 อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)  
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น  
 แผนผังแนบ 1 แผ่น  
 ผคฟ. (สถานี )  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

หน้า 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	DIS ชค.ตลาดนัดบ้านไร่ - DIS ชค.บ้านคลองบาง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ก.ย. 64	เวลา	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ศปจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1199/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายฤกษ์ศักดิ์ รักนตรสาคร		วันที่ 12 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายฤกษ์ศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
3	SPC03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศปจ.		R หน้าโรงงานสุพรรณฟู้ดส์แวร์
4	ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนไปปรับไปจาก SPC03						
5	SPC03S-13	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS ตอนกระทือ
6	DIS ชค.ไลน์ SPC05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS บ้านคลองบาง
7	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
8	DIS ชค.ไลน์ SPC05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS ตลาดนัดบ้านไร่
9	แจ้ง กฟส.ศปจ.ทำการไลน์โหลดบริเวณจุดที่ทำงานออกทั้งหมด						
10	เมื่อ กฟส.ศปจ.ทำการไลน์โหลดบริเวณจุดที่ทำงานออกทั้งหมด						
11	แจ้ง Hotline ทำการตัด DDE จุด A ออกทั้ง 3 เฟสได้						
12	แจ้ง Hotline ทำการตัด DDE จุด A ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
13	แจ้งพื้นที่ไต่บับให้ผู้ควบคุมทราบ						
14	แจ้งพนักงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1						
15	แจ้งพนักงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2						
16	SPC03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศปจ.		R หน้าโรงงานสุพรรณฟู้ดส์แวร์
17	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
18	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
****สิ้นสุด Switching ช่วงแรก****							
19	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	แจ้งพนักงานปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
21	แจ้งพนักงานปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
22	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
23	SPC03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศปจ.		R หน้าโรงงานสุพรรณฟู้ดส์แวร์
24	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
25	แจ้ง Hotline ทำการเชื่อม DDE จุด A เข้าทั้ง 3 เฟสได้						
26	แจ้ง Hotline ทำการเชื่อม DDE จุด A เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
27	DIS ชค.ไลน์ SPC05	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS ตลาดนัดบ้านไร่

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนกลับจาก SPC03						
29	DIS ชด.ไลน์ SPC05	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS บ้านคลองบาง
30	SPC03S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		ดอนกระเทียม
31	SPC03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศปจ.		R หน้าโรงงานสุพรรณฟุตส์แวย์
32	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****							

แผนผังเชิงเก็ลไลน์

ดับไฟเพื่อเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง

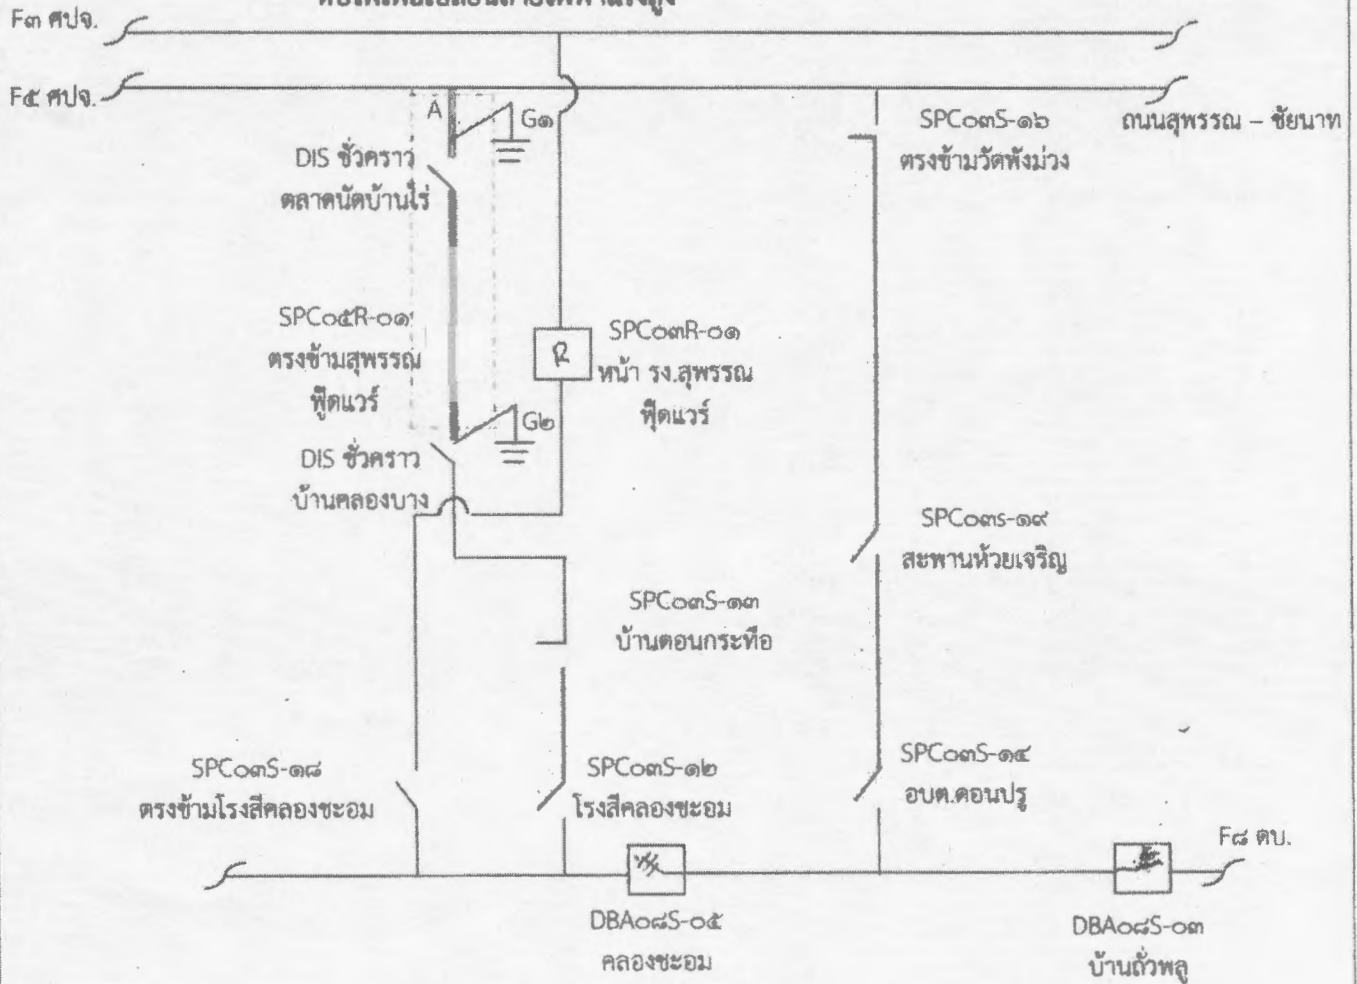

หมายเหตุ

๑. ดับไฟเพื่อเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงเป็นสายเคเบิล ๑๘๕ SAC
๒. วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
๑๔. จ่าย DIS SPC๐๓S-๑๓ บ้านดอนกระเทียม
๑๕. ปลดปลด DIS ชั่วคราวบ้านคลองบาง
๓. ปลด DIS ชั่วคราวตลาคันด์บ้านไร่
๔. ขอทไลน์สุพรรณ ตัดเด็ดจุด A
๕. จั้ม ช็อตกราวด์ G๑ , G๒
๖. งานแล้วเสร็จ
๗. ปลด ช็อตกราวด์ G๑ , G๒
๘. ขอทไลน์สุพรรณ จั้มเด็ดจุด A
๙. จ่าย DIS ชั่วคราวตลาคันด์บ้านไร่
๑๐. จ่าย DIS ชั่วคราวบ้านคลองบาง
๑๑. ปลด DIS SPC๐๓S-๑๓ บ้านดอนกระเทียม
๑๒. เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
