



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.บปม.(กป.) ๖๒ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายศุภวัฒน์ คุชรประกอนกิจ

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.นวางปลาแก้ว


ด้วยการไฟฟ้า อ.นวางปลาแก้ว จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.นวางปลาแก้ว
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	BAM๐๑	๓๐ ม.ค. ๖๗	๑๐.๐๐	๑๔.๐๐	๑. แก๊ซ DIS. รหัส BAM๐๑S-๑๐ ชำรุด จำนวน ๑ ชุด ๒. แก๊ซ Preformed Deadend ชำรุด จำนวน ๒ ชุด ๓. แก๊ซจุดร้อน BAM๐๑S-๑๐	จุดตัดกลาง สเปน	จุด DE หน้าหมู่บ้าน SM การ์เด็น	นายอาคม แจ้งสว่าง

พื้นที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่บ้าน SM. การ์เด็น

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายกิตติวัชร ทองงาม ตำแหน่ง วศก.๖ ผจก.กฟส.อ.บปม โทร. ๐๕๕-๕๙๕๒๓๖๓ พื้นที่ที่
ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายศุภวัฒน์ คุชรประกอนกิจ)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.นวางปลาแก้ว

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BAM01 จาก จุดตัด DDE ควบคุมถึง ปลานสาม BAM01
ในวันที่ 30 ม.ค. ๖7 ตั้งแต่เวลา 10:๐๐ น. ถึง 14:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 119/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
ผศ.กรส.ศูนย์ฯ นาง สุภัทรา วสันตวงศา ผศ.สาธิตการของดับไฟกับ อ.ก.บ.บ. วัชร ทองงาม
(นางสาวพิชช พงษ์ศิริ
วศก.5 กฟภ.บ.บ. กฟภ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. บปม.
อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

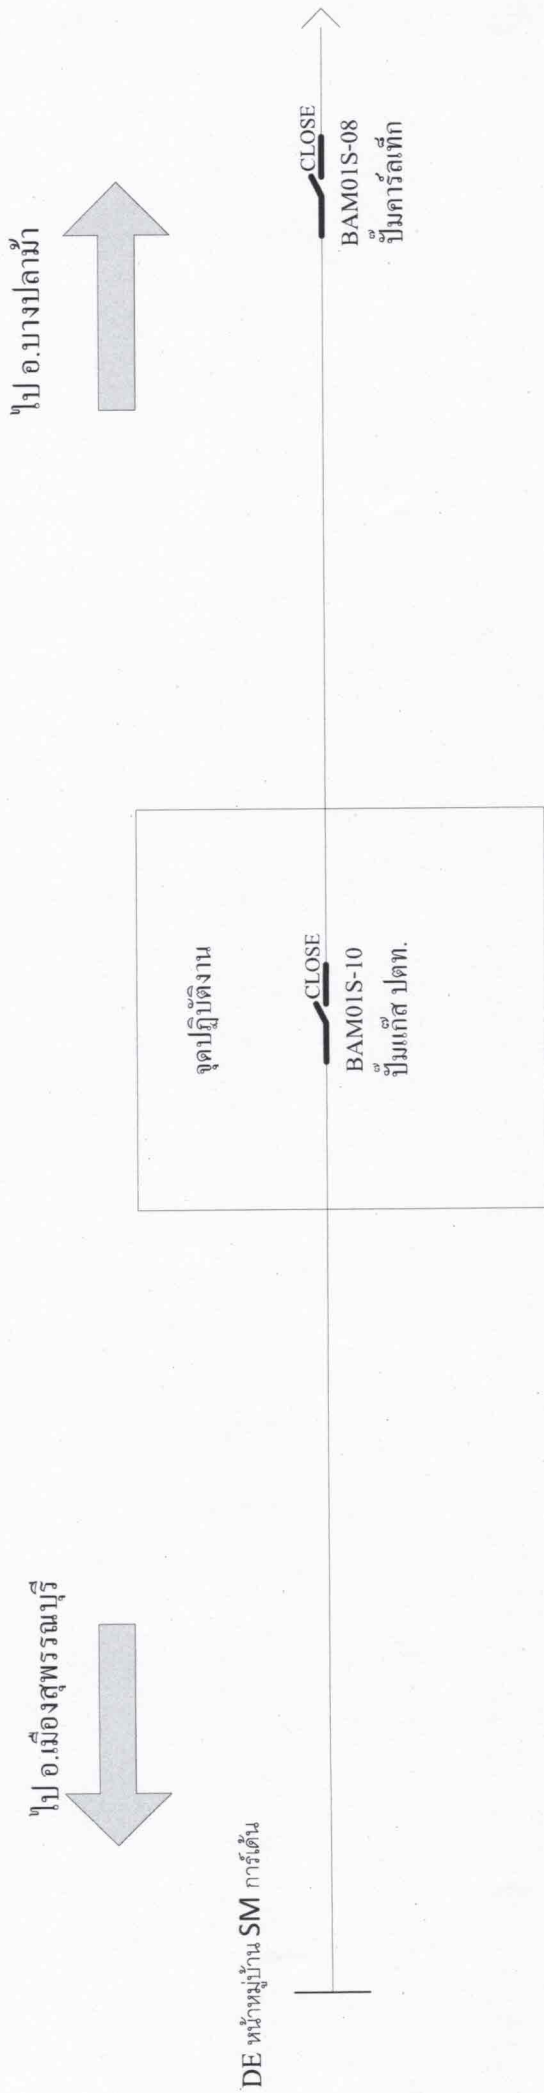

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis รหัส BAM01S-10 บริเวณหมู่บ้าน SM การ์เด็น				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ม.ค. 67	เวลา	10.00 น.	ถึง	14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บปม.	งานที่ทำ	แก้ไข Dis รหัส BAM01S-10	ตามใบขอปฏิบัติงาน	119/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุกษา วงศ์บุญมาก			วันที่	21 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		Load = 2.0 MW
3	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 10.00 น.						
4	BAM01S-10	สับ	ปลด(ใช้โพลบัสเตอร์)		บปม.		DIS ปุ่มแก๊ส ปตท.
5	จุดตัด DDE กลางสแปน (ระหว่างไลน์แยก ม.เกษตร - BAM01S-10) ถึง BAM10S-10 ไม่มีโหลด						
6	แจ้ง HL ทำการตัด DDE กลางสแปน (ระหว่างไลน์แยก ม.เกษตร - BAM01S-10) ออกจากกันทั้งสามเฟส						
7	หลังจาก HL ทำการตัด DDE กลางสแปน (ระหว่างไลน์แยก ม.เกษตร - BAM01S-10) ออกจากกันทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.บปม. รับทราบ						
9	แจ้ง กฟส.บปม. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
10	แจ้ง กฟส.บปม. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
11	เมื่อ กฟส.บปม. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
13	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
15	แจ้ง กฟส.บปม. ปลด Short Ground จุด G1						
16	แจ้ง กฟส.บปม. ปลด Short Ground จุด G2						
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
18	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	แจ้ง HL ทำการเชื่อม DDE กลางสแปน (ระหว่างไลน์แยก ม.เกษตร - BAM01S-10) เข้าทั้งสามเฟส						
21	หลังจาก HL ทำการเชื่อม DDE กลางสแปน (ระหว่างไลน์แยก ม.เกษตร - BAM01S-10) เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
22	BAM01S-10	ปลด	สับ		บปม.		DIS ปุ่มแก๊ส ปตท.
23	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Singleline diagram ก่อนดับกระแสไฟฟ้า



- หมายเหตุ**
- แสดงพื้นที่จ่ายกระแสไฟฟ้า
 - - - แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้า
 - ↓ แสดงจุดช็อคกราวด์
 - แสดงจุดตัดกลางสเปน

ผู้ควบคุมงาน นายอคม แจ็งสว่าง
 จป. นายอคม แจ็งสว่าง

ก่อน Switching

แผนผัง Singleline diagram หลังดับกระแสไฟฟ้า



- หมายเหตุ**
- แสดงพื้นที่จ่ายกระแสไฟฟ้า
 - - - แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้า
 - ↓ แสดงจุดช็อตกราวด์
 - แสดงจุดตัดกลางสแปน

ผู้ควบคุมงาน นายอาคม แจ็งสว่าง
 จป. นายอาคม แจ็งสว่าง

หลัง Switching
