



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ลญ.(กป.)- ๔๕๕ / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายสมหมาย ขึ้นดั่ง
ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ แปนเขียว

Switching Deadline

22 ส.ค. 66

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ต.ลาดหญ้า

ผู้รับ..... กป.บ.(ก.๓)
เลขทะเบียน..... 494
วันที่..... 10 ส.ค. 2566
เวลา..... 10 : 44

ด้วย.....กฟส.ต.ลาดหญ้า.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้ง Disconnecting Switch ๒๒ kv จำนวน ๑ จุด .ส/ป.ปริฟอร์ม
ชำรุด จำนวน ๒๐ จุด ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผน ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SVA๐๑	๒๕ ส.ค.๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ติดตั้ง Disconnecting Switch ๒๒ kv จำนวน ๑ จุด , ส/ป.ปริฟอร์ม ชำรุด ๒๐ จุด /บริเวณบ้านโป่งหวาย ถึง แยกเข้าที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์	DIS ชั่วคราว บ้านท่าสนุน SVA15-10	สุตรระบบ จำหน่าย	นายพงษ์ศักดิ์ ปิ่นตะศิริ ๐๘๙-๘๐๒-๑๘๘๒

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจรัสพล โยษิตพล ตำแหน่ง พงษ.๗ เบอร์โทร ๐๘๔-๘๘๔-๙๙๑๔
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุเทพ แปนเขียว)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ต.ลาดหญ้า

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ 1 ฟีดเดอร์ SVA๐1 จาก SVA 15-10 ถึง ปลายรัง
ในวันที่ 25 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08:๐๐ น. ถึง 16:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1213/2566
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อนุประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ พช ตรีภพ โยษิตพล.

(Signature)

(นายตรีภพ โยษิตพล)
๐๙๖.5 ทน.พ.จพ.

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๑๖, กฟภ.๓๓, กฟภ.๑๖.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผน
แผนผังแนบ 2 แผน
ผจพ. - (สถานี)
-

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 7 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)


1. สถานที่ทำงาน ไลน์ SVA01 บริเวณอำเภอศรีสวัสดิ์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 25 ส.ค. 66 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ลญ. งานที่ทำ ติดตั้งDIS.และปรับปรุงระบบ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1213/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 12 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 12 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 12 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัฒน์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนและป้องกันก่อนทำการสวิตชิง						
2	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing		รถทรน-		RE เขาต๊ับเต่า
3	- ดับไฟเวลา 08.00 น.						
4	SVA01S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถทรน-		DIS บ้านท่าสนุน
5	Dropไลน์ SVA01	สับ	ปลด		รถศว-		D/O 
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.ลาดหญ้ารับทราบ						
7	แจ้งกฟส.ลาดหญ้า Test ไฟดับพร้อม Short ground จุด G1						
8	แจ้งกฟส.ลาดหญ้า Test ไฟดับพร้อม Short ground จุด G2						
9	แจ้งกฟส.ลาดหญ้าลง Wesafe ก่อนปฏิบัติงาน						
10	แจ้งกฟส.ลาดหญ้าปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
11	SVA01R-01	Nonreclosing	Normal		รถทรน-		RE เขาต๊ับเต่า
%%%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงเช้า %%%%%%%%%%							
12	หลังจากกฟส.ลาดหญ้าปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
13	แจ้งกฟส.ลาดหญ้าทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
14	แจ้งกฟส.ลาดหญ้าทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนและป้องกันก่อนทำการสวิตชิง						
16	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing		รถทรน-		RE เขาต๊ับเต่า
17	ตรวจสอบ DIS.ติดตั้งใหม่รหัส SVA01S-11 บริเวณลงเขาก่อนแพเจ็จิม ใหม่สับเข้าไว้ทั้งสามเฟส						
18	- จ่ายไฟ						
19	SVA01S-10	ปลด	สับ		รถทรน-		DIS บ้านท่าสนุน
20	Dropไลน์ SVA01	ปลด	สับ		รถศว-		D/O 
21	SVA01R-01	Nonreclosing	Normal		รถทรน-		RE เขาต๊ับเต่า
%%%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิง %%%%%%%%%%							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

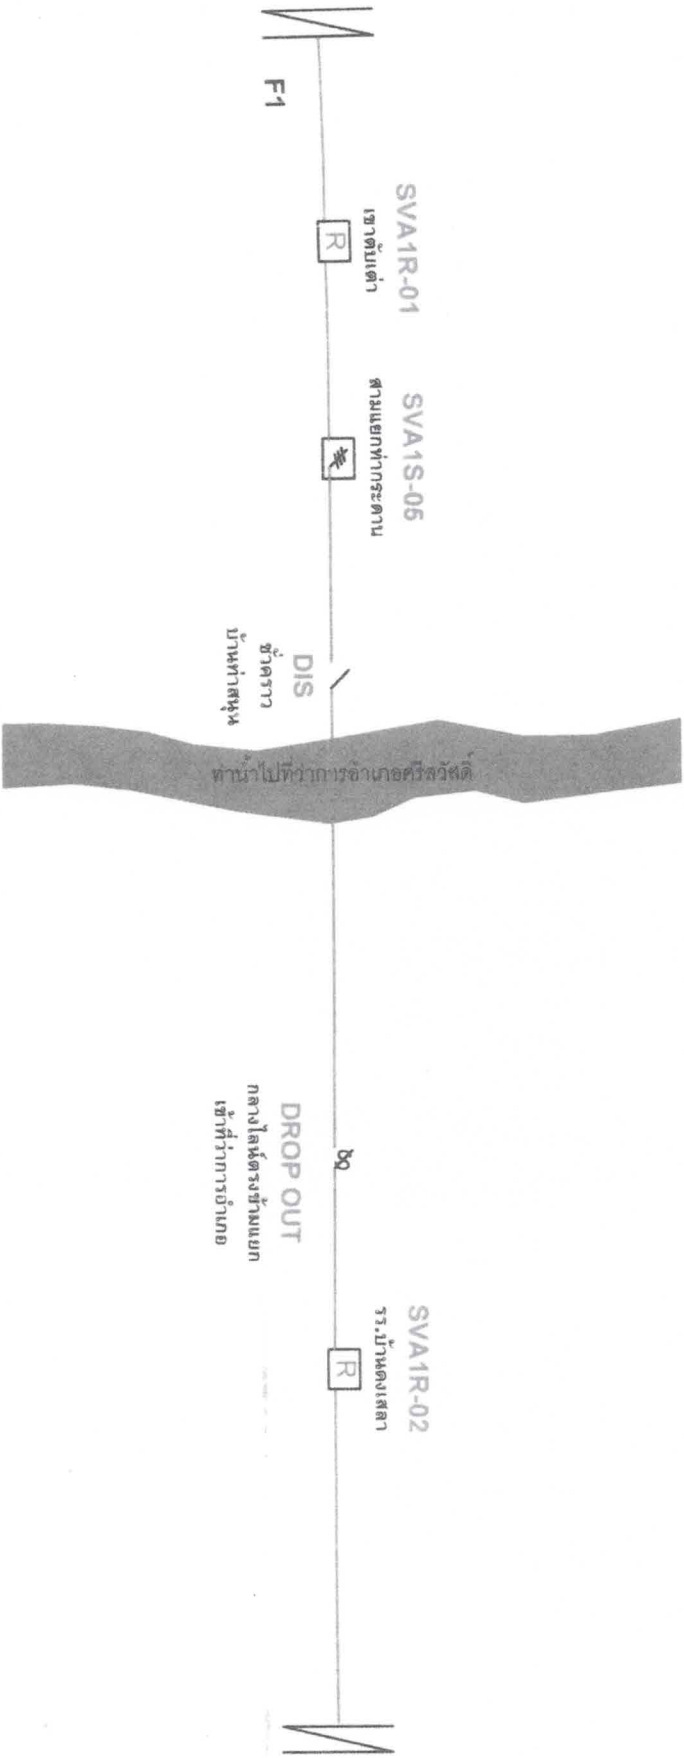

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

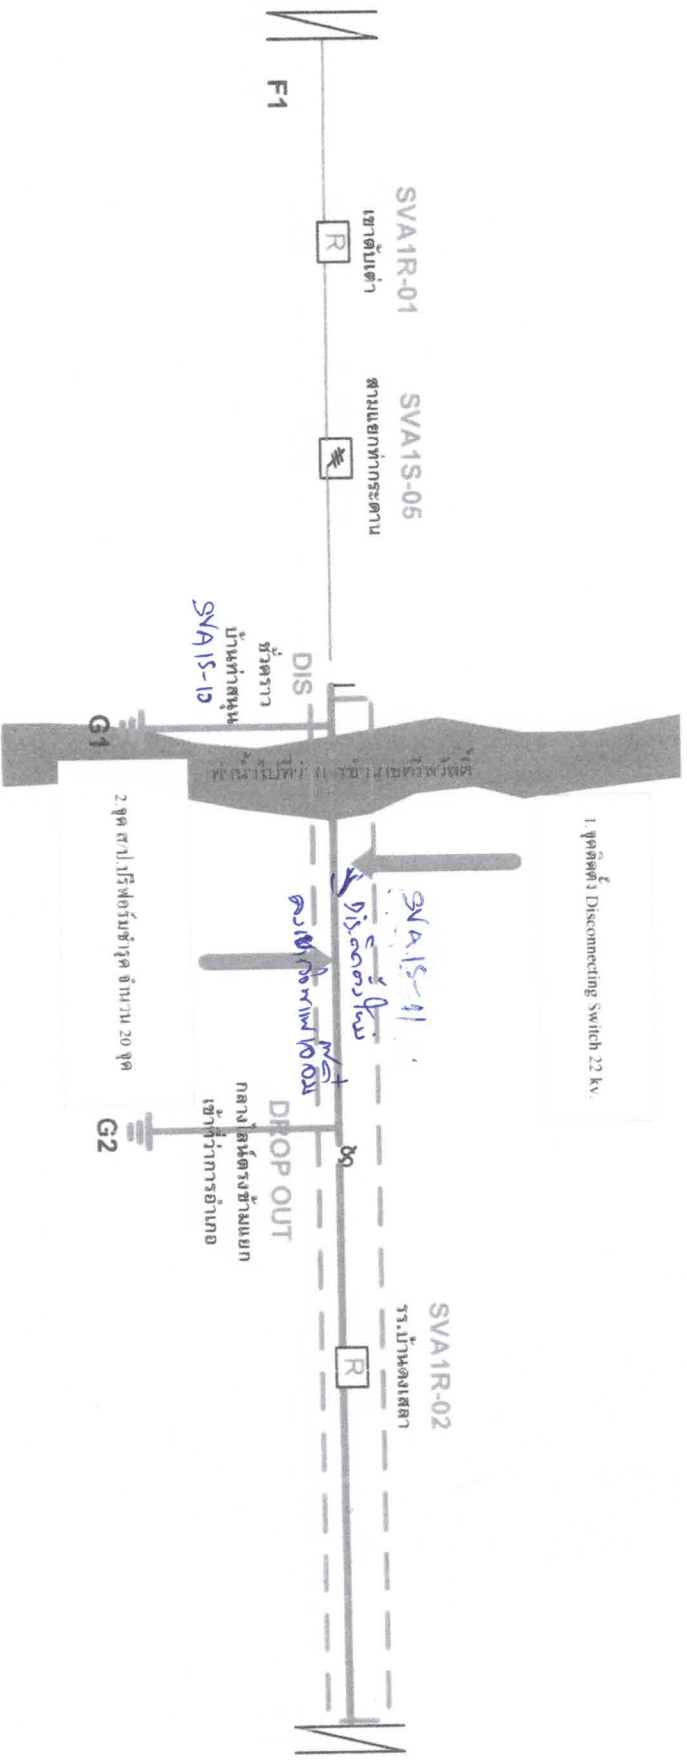

1. จุดตัดไฟ Disconnecting switch 22 kv.

2. จุด ตัด ไฟ ฟีด บริเวณ จำนวน 20 จุด

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

