



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 29 ก.ค. 65

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๓
ชื่อผู้รับ นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายชัชชัย เข็ญสุวรรณ

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ด.(ท.) กฟภ.สท.

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี จะขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี 2 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	8 สท.	30/07/65	08.00	17.00	พาดสายแรงสูง 185ค.ม.ม.	DDE ร.ร.เทรน อินน์	Disชั่วคราว สถานีสุพรรณ2	โทร.๐๙๐-๑๕๓๙๑๑๑ นายปรีชา ทองระย้า
๒.	8 สท.	31/07/65	08.00	17.00	ย้ายเสาแรงสูงต้นDDEวัดกุฎี ทอง	DDEก่อนวัดกุฎี ทอง	Disชั่วคราววัด ราชา	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง พ.จ.อ. (ส.ท.) โทร. ๐๙๐-๑๕๓๙๑๑๑๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.ส.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายชัชชัย เข็ญสุวรรณ.....)

ตำแหน่ง ร.จ.ด.(ท.) สท.ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ด.กฟภ.สท.....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ 9PA9 จาก DDE.SS.เทรนอินน์ ถึง Dis.๑๑.๒
ในวันที่ 30 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1224/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.จ.ร.ร. อ.ระเฒ่า ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผ.จ.ด.กฟภ.สท.ป.บ.ป

29 ก.ค. 65

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จ.ด.

ก.น.อ.ล.ว.

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

๐๙๐.๑๕๓๙๑๑๑๑

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผน

แผนผังแนบ 1 แผน

ผ.จ.ด. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ SPA09 สถานีไฟฟ้าสุพรรณบุรี บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าสุพรรณบุรี 2				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ก.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูง 185 ตร.มม.	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1224/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	24 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายพิชชา,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนเฑียร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
3	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
4	- เปลี่ยนทางจ่ายไฟไลน์ SPA09						
5	SPA07S-08	ปลด	สับ		สพ.		DIS หมู่บ้านจามจรี
6	DIS ชค. SPA09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หน้าสถานีฯ สุพรรณบุรี 2
7	- ดับไฟไลน์ SPA09 เวลา 08.00 น.						
8	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการปลดโหลดผู้ใช้ไฟออกทั้งหมดก่อนทำการตัด DDE.						
9	หลังจาก กฟจ.สพ. ทำการปลดโหลดผู้ใช้ไฟออกทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย						
10	แจ้ง Hot Line กระเช้าทำการตัด DDE.ไลน์ SPA09 บริเวณโรงแรมเทรนอินน์ออกได้ทั้งสามเฟส (ตามผังแนบ)						
11	หลังจาก Hot Line กระเช้าทำการตัด DDE.ไลน์ SPA09 บริเวณโรงแรมเทรนอินน์เสร็จเรียบร้อย						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟจ.สพ.รับทราบ						
13	แจ้งกฟจ.สพ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
14	แจ้งกฟจ.สพ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
15	แจ้งให้กฟจ.สพ. ลงใน WE SAFE						
16	แจ้งกฟจ.สพ. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
17	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
18	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
19	หลังจากกฟจ.สพ. ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
20	แจ้งกฟจ.สพ. ทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
21	แจ้งกฟจ.สพ. ทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
22	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
23	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
24	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
25	- จ่ายไฟไลน์ SPA09						
26	แจ้ง Hot Line กระเช้าทำการจัม DDE.ไลน์ SPA09 บริเวณโรงแรมเทรนอินน์เข้าได้ทั้งสามเฟส						
27	หลังจาก Hot Line กระเช้าทำการจัม DDE.ไลน์ SPA09 บริเวณโรงแรมเทรนอินน์เสร็จเรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้งกฟจ.สพ.นำโหนดผู้ใช้ไฟเข้าได้ทั้งหมด						
29	- เปลี่ยนทางจ่ายไฟไลน์ SPA09						
30	DIS ชค. SPA09	ปลด	สับ		สพ.		DIS หน้าสถานีฯ สุพรรณบุรี 2
31	SPA07S-08	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หมู่บ้านจามจรี
32	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
33	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.


ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ด้วยในวันที่...๓๐...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๕... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...Dis ชั่วคราวสถานีสุพรรณ๒ - DDEโรงแรมเทรอนอินน์...เพื่อ...พาดสายระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒เควี สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเตอร์ ..๙.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Dis ชั่วคราวสถานีสุพรรณ๒ - DDEโรงแรมเทรอนอินน์ กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายปรีชา ทองระย้า..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔..เป็นผู้ควบคุมงานและให้และให้นายวรพล สุทธิไกร ตำแหน่ง ท.กส.สพ. โทร ๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙ เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แนบผังเชิงกลไลไลน์

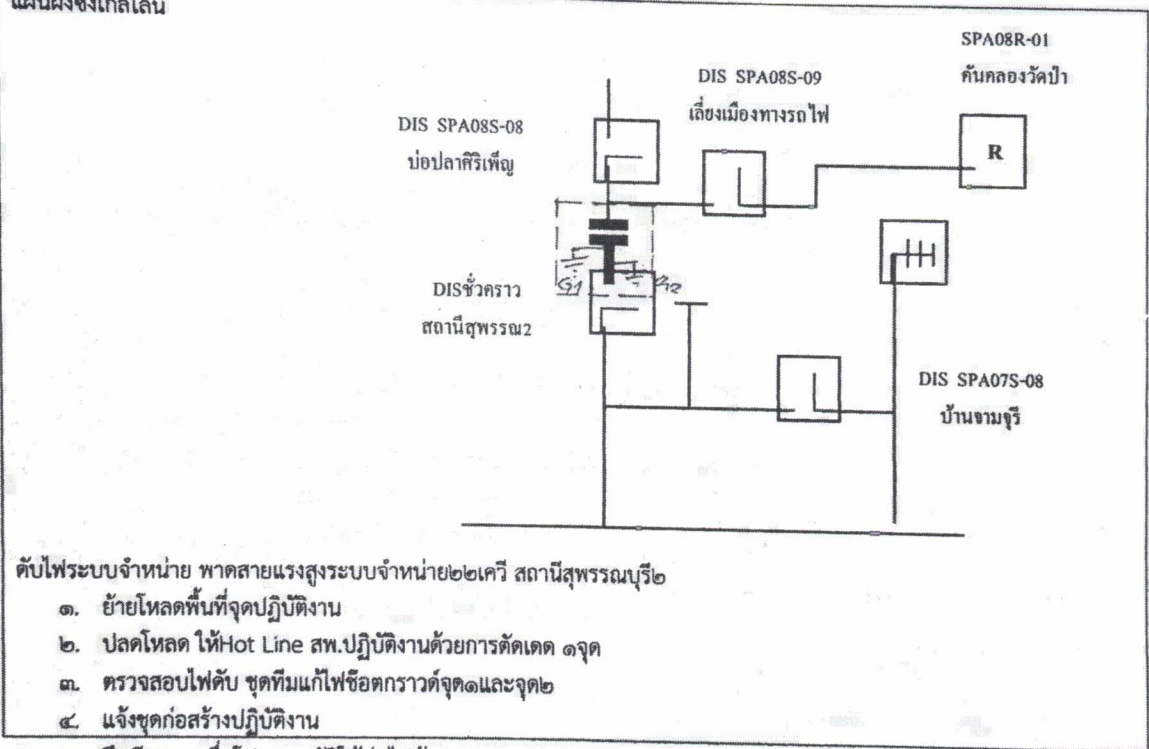

ดับไฟระบบจำหน่าย พาดสายแรงสูงระบบจำหน่าย๒๒เควี สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
๒. ปลดโหลด ให้ Hot Line สพ.ปฏิบัติงานด้วยการตัดเคต ๑จุด
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อตกกรวดจุด๑และจุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟจ.สพ.

Sr.
(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พงช.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐
