



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
RR PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

27 ส.ค. 67

## วิทย์ขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พท. ๕๕๑ / ๒๕๖๗  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธ์นันท์ พชรสุวรรณชล  
 ชื่อผู้ส่ง นายศักดิ์สิทธิ์ พรวยศรี

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗  
 ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)  
 ตำแหน่ง หน.ก.บ.ร.ษ.ผ.จ.ก.พ.ส.พท.พท.

ด้วยการไฟฟ้า พท.พท. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง  
 สังเขปนแบบ จำนวน ๕ แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๒๗ ส.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	SF6 แยกไฟสี่	ดิสชั่วคราว ร้านเงิน	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๒	UTG05	๒๘ ส.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	ดิสชั่วคราว ห้องแถววัด สระลงเรือ	ดิสชั่วคราวบ้าน หนองเจริญสุข	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๓	UTG05	๒๙ ส.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	ดิสชั่วคราว บ้านหนอง เจริญสุข	ดิสชั่วคราว บ้านกรอกตาโพธิ์	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๔	UTG05	๓๐ ส.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	ดิสชั่วคราว บ้านกรอกตา โพธิ์	ดิสชั่วคราว <u>๖๖ ๖/๓๓ AU 1๕๖๐</u>	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง หน.ก.บ. โทร. ๐๘๕-๓๑๖๒๐๑๕

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
 ๓.  พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๓๕๙๘๖, long: ๙๙.๗๕๕๒๑๕  
 ๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๔๐๘๖๖๙, long: ๙๙.๗๒๘๘๙๘

ลงชื่อ.....  
 (นายศักดิ์สิทธิ์ พรวยศรี.....)  
 ตำแหน่ง หน.ก.บ.ร.ษ.ผ.จ.ก.พ.ส.พท.พท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓  
 เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๕ พิดเดอร์ UTG05 จาก ร้านเงิน ถึง Dis ๖๓.บ้านหนองเจริญสุข  
 ในวันที่ 28.๘.๖7 ตั้งแต่เวลา ๐8:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1225/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิมลกร ชิตระดม: ๕๕๑ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ

นางสาวศิลา พงษ์ศิริ  
 ๖๕๕.๕ ๓๗๗๗.๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.พนง, กฟผ.ชง

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. \_\_\_\_\_ (สถานี \_\_\_\_\_ )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นศรปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ UTG05 DIS ชค.หน้าห้อง <del>หน้า</del> แยกวัดสระลงเรือ - DIS ชค.หนองเจริญสุข		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ส.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ 22 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1225/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 22 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิระวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิทย์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
4	UTG05R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ทกจ.	R	สระลงเรือ
5	UTG09R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		กจ	R	บ้านตลุงเหนือ
6	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG09						
7	UTGBVB-01	ปลด	ล๊ับ		UTG	-	ขนานบัส
8	UTG05S-13	ปลด	ล๊ับ			DIS	จุดแยกตัวจุด (ข้างถนน)
9	DIS ชค.UTG05	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ.	DIS	ห้องแถวหน้าวัดสระลงเรือ
7	UTGBVB-01	ล๊ับ	ปลด		UTG	-	ขนานบัส
10	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
11	DIS ชค.UTG05	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ.	DIS	หนองเจริญสุข
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พทน.ทราบ						
13	แจ้ง กฟส.พทน. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
14	แจ้ง กฟส.พทน. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
15	แจ้ง กฟส.พทน.ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
16	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
17	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
18	UTG05R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ทกจ.	R	สระลงเรือ
19	UTG09R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		กจ	R	บ้านตลุงเหนือ
20	แจ้ง กฟส.พทน.ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	หลังจาก กฟส.พทน.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
22	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
23	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
24	UTG05R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ทกจ.	R	สระลงเรือ
25	UTG09R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		กจ	R	บ้านตลุงเหนือ
26	แจ้ง กฟส.พทน.ทำการปลด Short Ground จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้ง กฟส.พทน.ทำการปลด Short Ground จุด G2						
28	DIS ชค.UTG05	ปลด	สับ		ทกจ.		DIS หนองเจริญสุข
29	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนกลับจาก UTG09						
30	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG	-	ขนานบัส
31	DIS ชค.UTG05	ปลด	สับ		ทกจ.	DIS	ห้องแถวหน้าวัดสระลงเรือ
32	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลจ	DIS	ลจ.วัดแก้ว (ช่างกท)
33	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG	-	ขนานบัส
34	UTG05R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ทกจ.	R	สระลงเรือ
35	UTG09R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ลจ	R	บ้านตลุงเหนือ
36	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
37	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แบบวัดอุณหภูมิ

วันที่ 28 ต.ค. 67

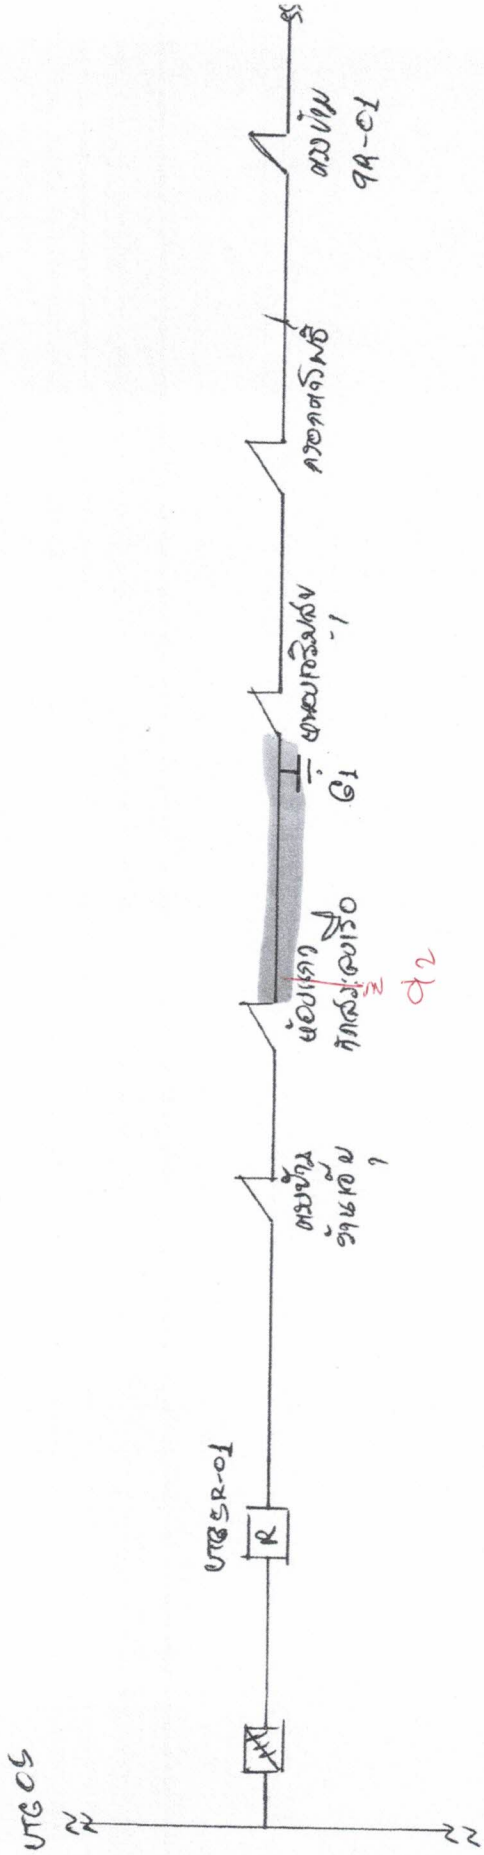

อุณหภูมิ
