



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๑๘๓๕/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณรัมย์

ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

Switching Deadline

17 ส.ค. 66

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงาน...ติดตั้ง SF6 รหัส SMJ 05S-03 ตัดไลน์ F.5 SMJ.....ตามแผนผังส่งแบบ
จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMJ ๐๕	๑๘ ส.ค. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ชุดงานออนไลน์กระแสเข้า กทบ. และชุดงานซ่อม ย่อย กทบ.ติดตั้ง SF๖ รหัส SMJ ๐๕S-๐๓ บริเวณริมคลองสี่แยก รร.บ้านดอน หน้า บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด	จุดปลด DDE	Dis ชั่วคราว ศาลรูปไก่ โค้งมะขวิด	นายสมชาย มาบัณฑิตย์ หม.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร.๐๘๒-๐๐๔๔๔๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง หม.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร ๐๘๒-๐๐๔๔๔๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SMJ 05 จาก จุดปลด DDE สาย ๕ ถึง Dis ชค ศาลรูปไก่ โค้งมะขวิด
ในวันที่ 18 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09-00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1231/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริวัฒน์ ภัคธณิน ประสานงานการขอดับไฟกับ นายดิษฐ์ชาต อา บัดเคอษฐ์
17 ส.ค. 66

(นาย ศิริวัฒน์ ภัคธณิน)

อสก.๕ ๖แทน ๒๕.๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 3 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ. (กทบ.)

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี) -



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณริมคลองสี่แยก รร.บ้านดอน หน้า บริษัท กลฟ์เท็กซ์ จำกัด		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ส.ค. 66	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ติดตั้ง SF6 SMJ05S-03 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1231/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก		วันที่ 17 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช, นายวรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายจิรวัดน์, นายอมร, นายวิรัช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMJ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		- Load = 20.1 MW
3	SMJ-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		- Load = 15.3 MW
4	SMJ05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		- Load = 7.4 MW
5	SMJ10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		- Load = 3.9 MW
6	ย้ายโหลด SMJ05 บางส่วนไปจ่ายจาก SMJ10						
7	SMJBVB-01	ปลด	ล๊ับ		SMJ		- ขนานบัส
8	SMJ05S-05	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		กทบ.		SF6 ท้อยชอยที่ดินสุรพล(คลองแนว)
9	DIS ชค. SMJ05	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ศาลโกโด้งมะขวิด
10	SMJBVB-01	ล๊ับ	ปลด		SMJ		- ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.						
12	แจ้ง Hot Line ทำการปลดจุด DDE ตามผังแนบ 1 จุด						
13	เมื่อ Hot Line ทำการปลดจุด DDE ตามผังแนบ 1 จุดแล้วเสร็จ						
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
17	เมื่อแจ้ง Shortground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
18	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ (ขณะปฏิบัติงานตั้ง "OFF" Auto Reclose SMJ10 ไว้ตลอด)						
19	SMJ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		-
20	SMJ-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		-
21	SMJ05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
23	SMJ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		-
24	SMJ-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		-
25	SMJ05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		-
26	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้ง Hot Line ทำการเชื่อม DDE ตามผังแนบ 1 จุด						
29	เมื่อ Hot Line ทำการเชื่อม DDE ตามผังแนบ 1 จุดแล้วเสร็จ						
30	ย้ายโหลด SMJ05 บางส่วนกลับจาก SMJ10						
31	SMJBVB-01	ปลด	สับ		SMJ		- ขนานบัส
32	DIS ชค. SMJ05	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ศาลโกโจ้งมะขวิด
33	SMJ05S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ท้อยชอยที่ดินสุรพล(คลองแนว)
34	SMJBVB-01	สับ	ปลด		SMJ		- ขนานบัส
35	SMJ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		-
36	SMJ-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		-
37	SMJ05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		-
38	SMJ10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนผังปัจจุบัน ก่อนตัดไฟฟ้า บริเวณตู้แยก รร.บ้านดอน ตั้งช่วงตู้กระแสชาวิต
เพื่อให้ชุดงานสอท่าเล่น กฟอ.กทบ. และชุดงานซ่อมย่อย กฟอ.กทบ. ติดตั้ง SF6 SMJ10S-03

บริเวณหน้าบริษัท กัลฟ์เท็กซ์ จำกัด (ริมคลองสี่แยก รร.บ้านดอน)
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

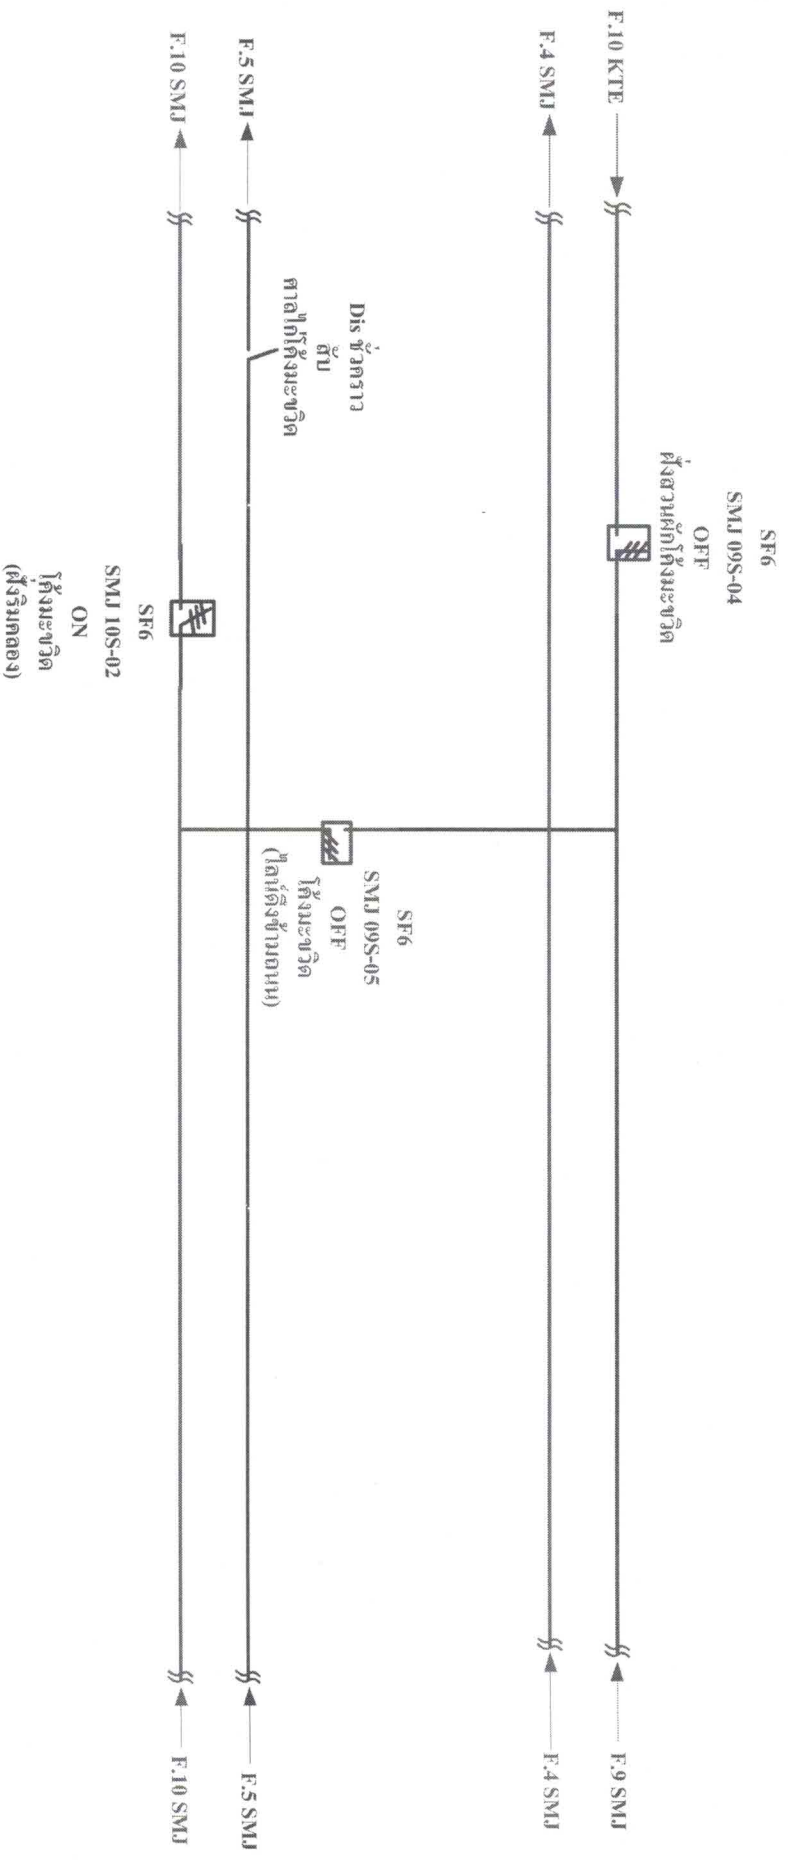


หมายเหตุ อนุมัติฯ ให้ดำเนินการตามการตัดไฟฟ้าปฏิบัติงาน

แผนผังปัจจุบัน **หลังดับไฟ** บริเวณสี่แยก รร.บ้านดอน ถึงช่วงโรงตั้งมะขวิด

เพื่อให้ชุดงานออกที่ไลน์ กฟอ.กทบ. และชุดงานซ่อมย่อย กฟอ.กทบ. ติดตั้ง SF6 SMJ10S-03

บริเวณหน้าบริษัท กลีฟท์ทรี จำกัด (ริมคลองสี่แยก รร.บ้านดอน)

วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

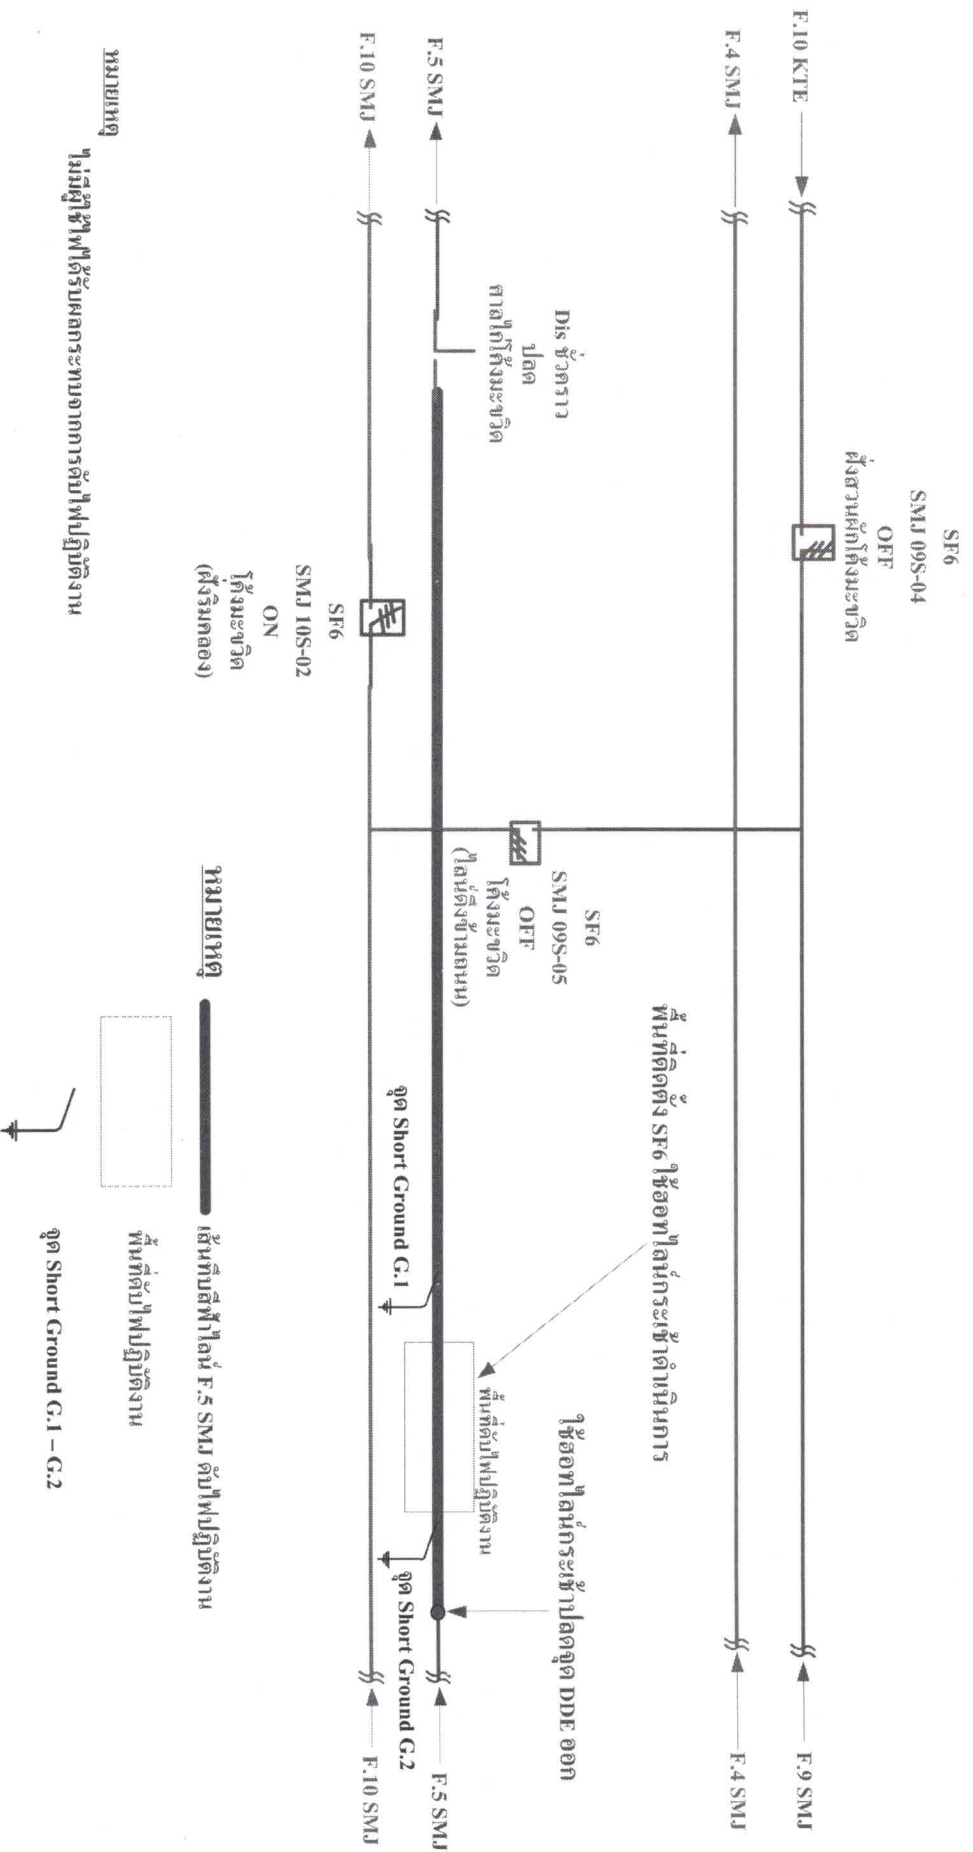

หมายเหตุ

ขอมติผู้รับไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

เส้นทึบสีฟ้า ไลน์ F.5 SMJ ดับไฟปฏิบัติงาน

พื้นที่ดับไฟปฏิบัติงาน

จุด Short Ground G.1 – G.2



แผนผังปัจจุบัน หลังจ่ายไฟคืนระบบตามปกติ บริเวณสี่แยก รร.บ้านดอน ถึงวังโค้งมะขวิด
 เพื่อให้ชุดงานสอนที่เล่น กฟอ.กทบ. และชุดงานซ่อมย่อย กฟอ.กทบ. ติดตั้ง SF6 SMIJ05S-03

บริเวณหน้าบริษัท กอล์ฟเท็กซ์ จำกัด (ริมคลองสี่แยก รร.บ้านดอน)
 วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

