



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๒๒๓๕ /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายภักตพงศ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บั๊กเสาคู่ไดร์ไลน์แรงสูงบริเวณหมู่ ๔ ต.สวนหลวง
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วันเดือนปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๕ KTA	๒๖ ก.ย. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เพื่อให้ ผจก.กทบ. ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เครือ บั๊กเสาคู่ไดร์ไลน์ บริเวณหมู่ที่ ๔ ต.สวนหลวง	DIS KTA ๕S-๐๕	DIS KTA ๕S-๐๕	นายเดิมนักดี วิริยพรสวัสดิ์ พงษ.๗ ผจก.กทบ. โทร. ๐๘๖-๓๕๓๖๑๕๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงานจำนวน ๑๕ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง หม.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร ๐๘๒-๐๐๕๔๕๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผจก.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๒๖ กันยายน ๒๕๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ KTA5 จาก KTA 5S-05 ถึง KTA 5S-08
ในวันที่ 26 กย. 64 ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง 17:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1238/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อนุสรณ์ ครอบประพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมชาย มาบัณฑิตย์

(อนุสรณ์ ครอบประพันธ์)
๑๑๓-๒๓๖ น. ๐๖.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(กฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ.กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์

นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน ไลน์ KTA05 บริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่ถึก
2. กำหนดวันที่ทำงาน 26 ก.ย. 64 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.กทบ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1238/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 21 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 21 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 21 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์และสวิตก่อนทำการ Switching						
2	KTA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
3	- ดับไฟไลน์ KTA05 เวลา 08.30 น.						
4	KTA05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		รถทบ-		DIS หมู่บ้านพฤษ์ลาดา
5	ตรวจสอบสถานะ KTA05S-08 DIS. ปากซอยบ้านผู้ใหญ่ถึกให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ. กระทบแบนรับทราบ						
7	แจ้งกฟอ. กระทบแบน Test ไฟว่าดับเรียบร้อยก่อนทำการ Short Ground						
8	แจ้งกฟอ. กระทบแบนทำการ Short ground จุด G1						
9	แจ้งกฟอ. กระทบแบนทำการ Short ground จุด G2						
10	แจ้งกฟอ. กระทบแบนปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
11	KTA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
	***** สิ้นสุด Switching เช้า *****						
12	หลังจากกฟอ. กระทบแบนปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
13	แจ้งกฟอ. กระทบแบนทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
14	แจ้งกฟอ. กระทบแบนทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
15	ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์และสวิตก่อนทำการ Switching						
16	KTA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
17	- จ่ายไฟไลน์ KTA05						
18	KTA05S-05	ปลด	สับ		รถทบ-		DIS หมู่บ้านพฤษ์ลาดา
19	KTA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
	***** สิ้นสุด Switching *****						

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนอินเ็ฟ บริเวณหมู่ที่ 4 ต.สวนหลวง
เพื่อให้ สกส.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ปีกา-พาดสายแรงสูง
ในวันที่ สกส.กทบ. ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น.

WBS: I-63-I-KTN64.MS.2002
(ตามอนุมัติ ก.3 กทบ.(ปน.)- 102 สว. 22 ค.ล. 2563)

หมายเหตุ
มีผู้ให้ได้รับผลกระทบจำนวน 15 ราย

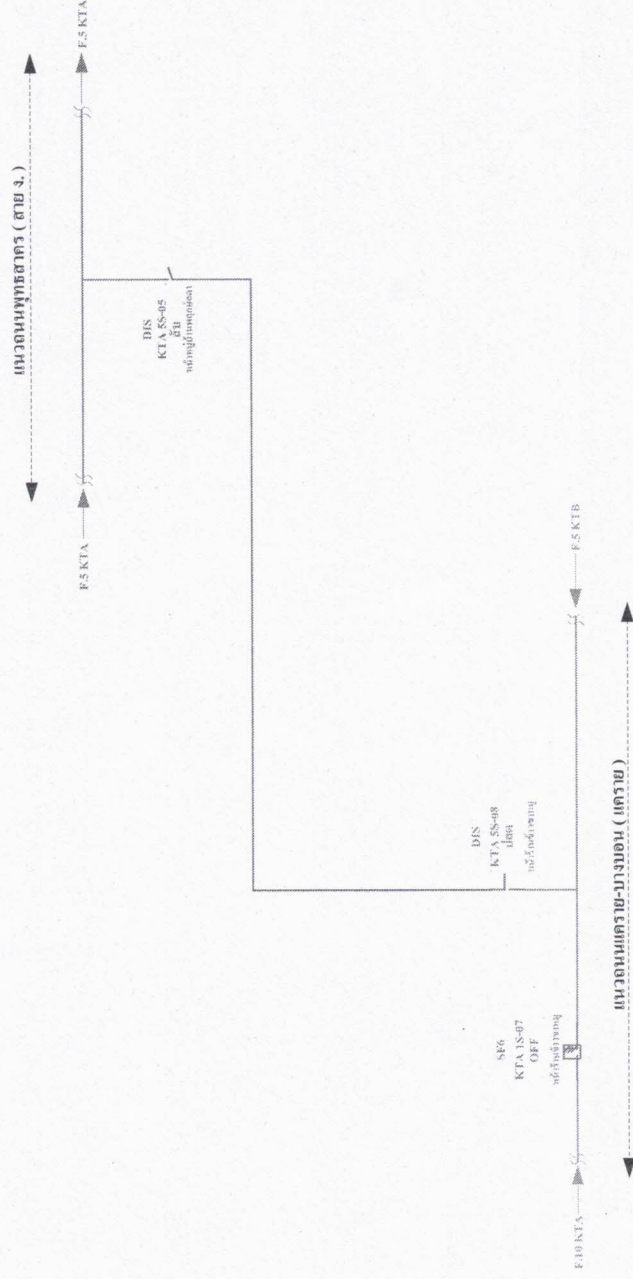

แผนผังสถานะปัจจุบัน ณตั้งต้นไป บริเวณหมู่ที่ 4 ต.สวนหลวง
 เพื่อให้ ผศ.กท. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ปีกเสา-พาดสายแรงสูง
 ในวินาทีที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น.
 WBS: I-63-I-KTN64.MS.2002
 (ตามอนุมัติ ก.3 กทป.(ป.บ.)- 102 ลว. 22 ต.ก. 2563)

หมายเหตุ
 มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจำนวน 15 ราย

วงรีสีแดงที่ติดอร์ 5 กทป.1 เส้นที่นับลำดับไฟปฏิบัติงาน

จุด Shot Ground (G.1 - G.2)

