



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ส.กฟส.สค.๒(บพ) ๘๒๓ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณเชล

ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ แป้นเขียว

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.๒(บพว)

ด้วย กฟส.สค.๒(บพว) ขอตัดไฟ วงจรที่ ๐๔ สถานีบ้านแพ้ว เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณสะพานวัดมอญ ถึง สะพานหลักสอง ตามแผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน ๓. แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BNP๐๔	๗ ก.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณสะพานวัดมอญ ถึง สะพานหลัก	BNP๔S-๐๕ (หน้าวัดมอญ)	BNP๔S-๐๖ (สะพานหลักสอง)	นายเจชา คงพุกา ตำแหน่ง พง.๗ โทรศัพท์ ๐๘๓-๔๒๘๘๓๕๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณสะพานวัดมอญ วัดหลักสอง ริมคลองดำเนินสะดวก.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรฐนันท์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ช.ม.บ.บ.โทร ๐๘๖-๓๖๓๓๓๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ (ก.๑) เริ่มต้น Lat ๑๓.๖๐๑๐๓๔ Long ๑๐๐.๑๒๕๓๗๒

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๖๐๖๕๕๐ Long ๑๐๐.๑๔๐๕๗๗

เรียน ผจก.กฟจ.สมุทรสาคร

เพื่อโปรดทราบ

(นายสุเทพ แป้นเขียว)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.๒(บพว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1. ฟีดเดอร์ BNP๐๔ จาก BNP๔S-๐5 ถึง BNP๔S-๐6 (สะพานหลักสอง)

ในวันที่ ๗ ก.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1242/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง



ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย คัมภรต จิตรมนะสิทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรรฐนันท์ บัวสงค์

ผจก.กฟจ.สมุทรสาคร  
๑๕๓.๖ แทน ผจก.บ




## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สะพานวัดมอญ ถึง สะพานหลักสอง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สค2.(บพว.)	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1242/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 30 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 30 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวรรณ, นายวิวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP	-	-
2	BNP04R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.	R	รีมคองดำเนิน
3	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	-
4	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	LOAD 1.08 MW
5	ย้ายโหลด BNP04 บางส่วนไปรับไฟจาก KTE02 (กฟส.สค2(บพว.)แจ้งว่าย้ายโหลดคงสภาพไว้ 1 เดือน)						
6	BNP04S-12	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	รีมคองดำเนินตรงข้ามวัดสวนส้ม
7	BNP04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.	SF6	สะพานหลักสอง
8	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
9	BNP04S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.	SF6	หน้าวัดมอญ
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สค2.(บพว.)ทราบ						
11	แจ้ง กฟส.สค2(บพว.)ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
12	แจ้ง กฟส.สค2(บพว.)ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
13	แจ้ง กฟส.สค2(บพว.)ทำการตัด DDE ที่ 2 จุดได้						
14	เมื่อ กฟส.สค2(บพว.)ทำการตัด DDE ที่ 2 จุดแล้วเสร็จ						
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สค2(บพว.)ทราบ						
16	แจ้งให้ กฟส.สค2(บพว.)ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
17	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP	-	-
18	BNP04R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		บพว.	R	รีมคองดำเนิน
19	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE	-	-
20	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE	-	-
21	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้						
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
22	เมื่อ กฟส.สค2(บพว.)แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
23	BNP04R-02	Normal	Nonreclosing		บพว.	R	รีมคองดำเนิน
24	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	-
25	แจ้ง กฟส.สค2(บพว.)ทำการปลด Short Ground จุด G1						
26	แจ้ง กฟส.สค2(บพว.)ทำการปลด Short Ground จุด G2						
27	BNP04S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.	SF6	หน้าวัดมอญ
28	BNP04S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.	SF6	สะพานหลักสอง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	BNP04R-02	Nonreclosing	Normal		บพว.		R	รีมคองดำเนินการ
30	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-	-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมดของ***								

แผนผัง Single Line Diagram ก่อนปฏิบัติงาน

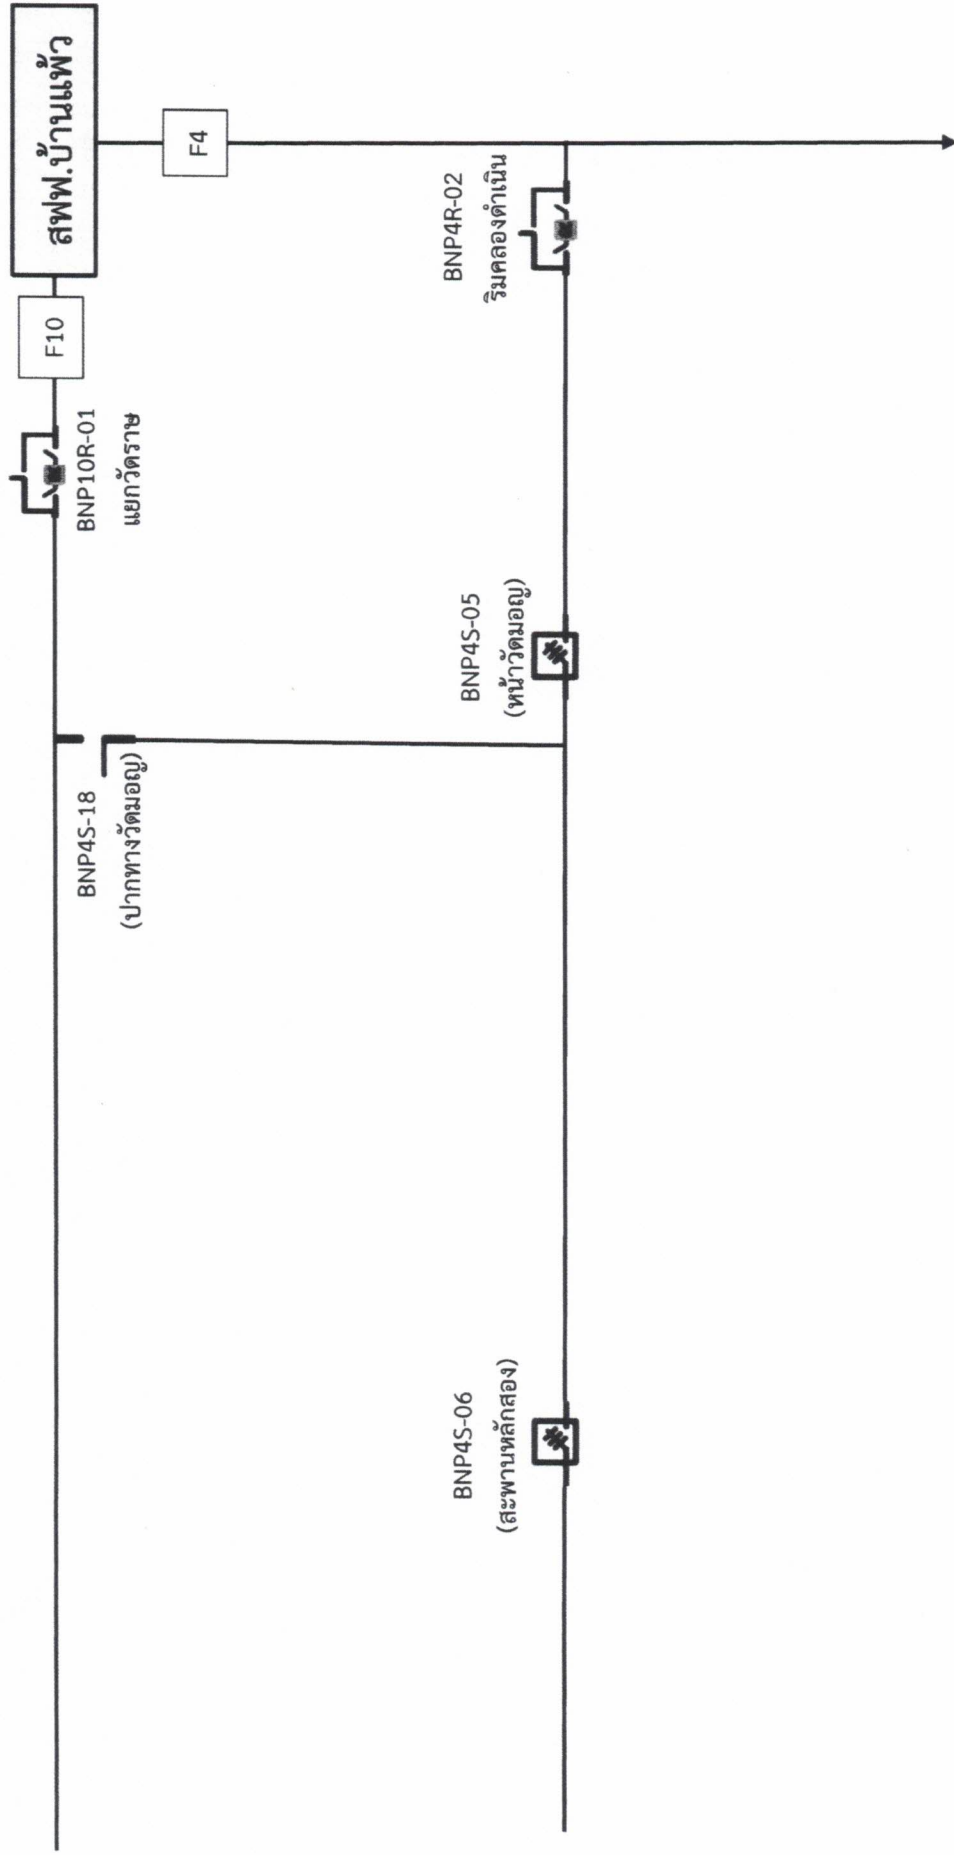

# แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่เฟดที่ไพบ่ พร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

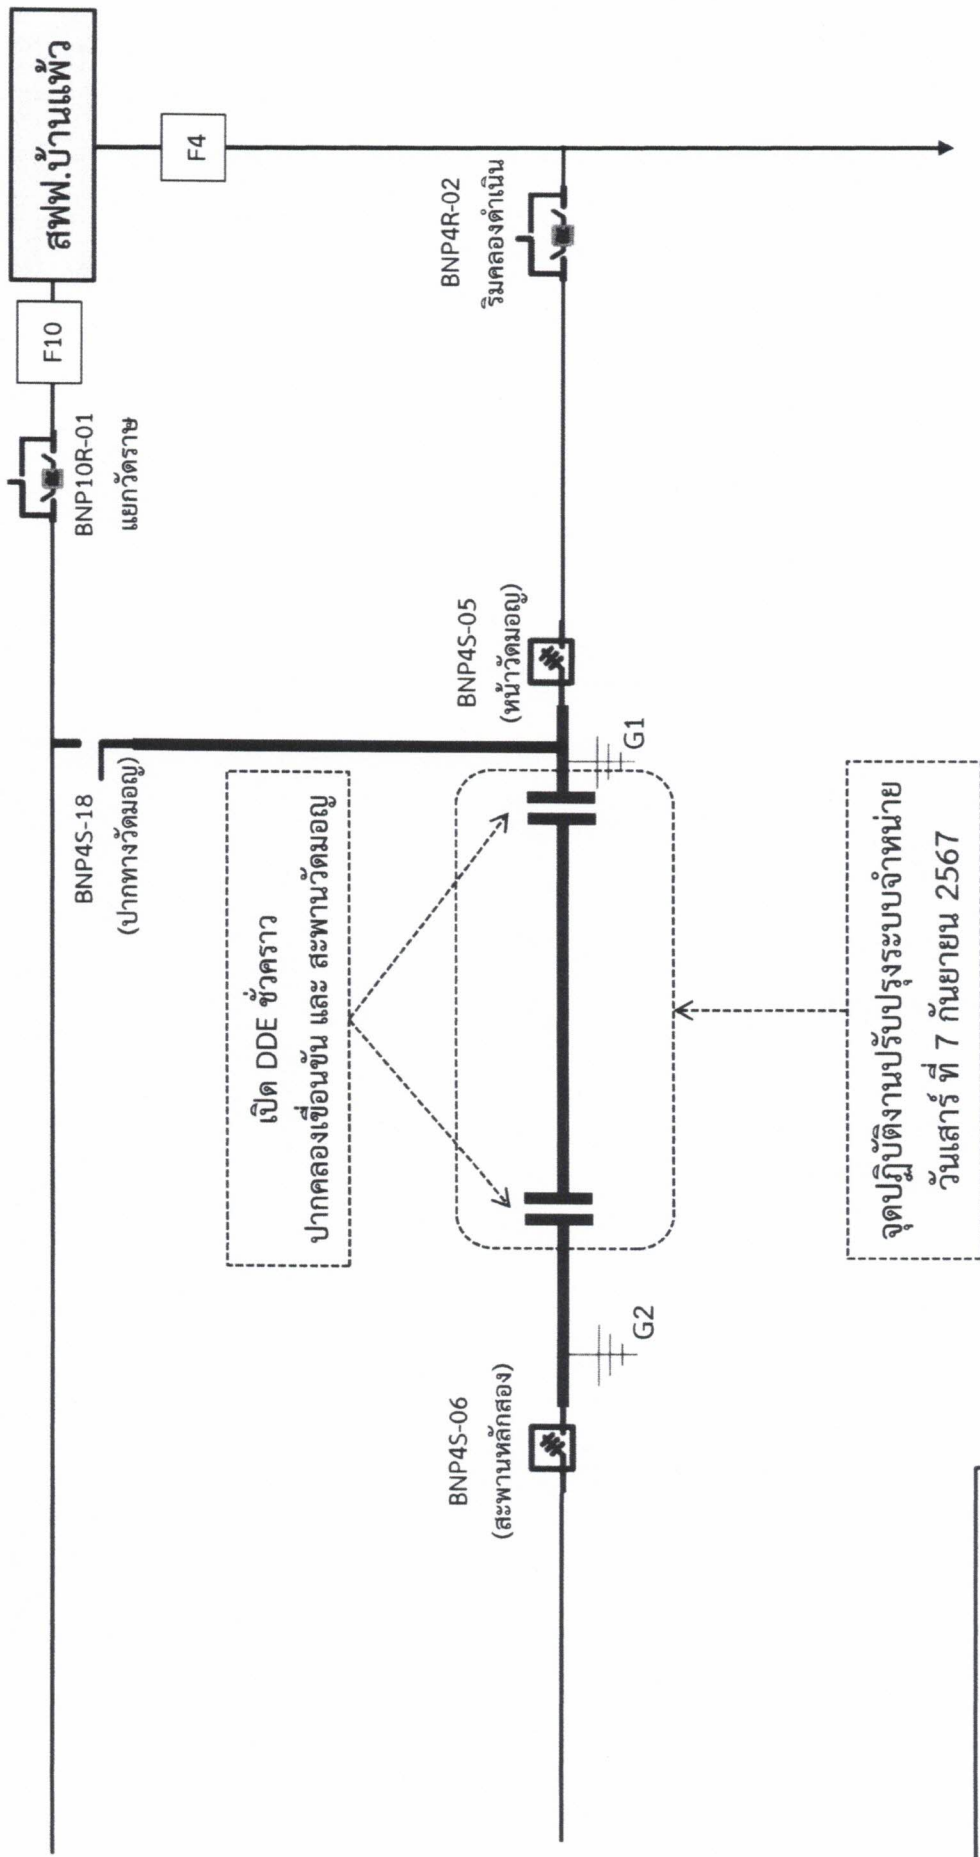

— เส้นทึบแสดงพื้นที่ไพบ่

⊥ ตำแหน่งจุด Short Ground

จุดปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย  
วันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2567

แผนผัง Single Line Diagram หลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

