



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นข.(ปบ.) 60๗9 /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา

ชื่อผู้ส่ง นายนพรัตน์ เคารพไทย

Switching Deadline

วันที่ 29 ก.ย. 64

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้า NCB  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/<br>บริเวณ                                   | จาก                               | ถึง  | ผู้ควบคุมงาน                     |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| ๑.  | NCA4YB   | ๕ ต.ค. ๖๔    | ๑๔.๐๐       | ๐๘.๐๐   | ย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้า<br>โรงเรียนภัทรญาณ<br>(งานถนนมอเตอร์เวย์) | -จุดจัมหน้า<br>รง.ฟาร์มอิท        | -NCA4YS-07   | วิรัช นิกโกคานันท์<br>๐๙๙๘๘๗๘๐๗๗ |
| ๒.  | NCB6VB   | ๕ ต.ค. ๖๔    | ๑๗.๐๐       | ๐๘.๐๐   |  | - NCB6S-01                        | - NCB6S-04<br>- NCB6S-02<br>- NCB6S-03<br>- NCB2S-08     |                                  |
| ๓.  | NCB7VB   | ๕ ต.ค. ๖๔    | ๑๗.๐๐       | ๐๘.๐๐   |  | -Dis ชั่วคราว<br>ก่ายเดี่ยวห้อยขา | - NCB7S-02<br>-Dis ชั่วคราว<br>ตรงข้ามรถตู้<br>-NCB1S-11 |                                  |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ชุมชนหน้าโรงเรียนภัทรญาณ จำนวน ๑ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชลิต สีขาวซ่า ตำแหน่ง ทล.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี โทร ๐๘๑-๗๐๕๕๒๕๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายนพรัตน์ เคารพไทย )

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ nskv จาก จุดจัมหน้าฟาร์มอิท ถึง NCA4YS-07  
ในวันที่ 5๐๑๖4 ตั้งแต่เวลา 14.๐๐ น. ถึง 8.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1250/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ 5๐๑๖4 ตั้งแต่เวลา 19.๐๐ น. ถึง 8.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นพรัตน์ เคารพไทย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชลิต สีขาวซ่า

( นายชลิต สีขาวซ่า )  
๐๐๓. 1๓๓๗ ๗. ๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. มฟอ.นธ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 3 แผ่น


ผจฟ. 1 (สถานี NEB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 13.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |  |          |                         |        |                           |
|------------------------|--|----------|-------------------------|--------|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สายส่ง 115 KV.ไลน์ NCB06,07 บริเวณสะพานข้ามทางรถไฟ รร.ภัทรญาณ  |          |                         |        |                           |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 5 ต.ค. 64  | ระหว่าง  | 17.00 น.                | ถึง    | 08.00 น.                  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กพอ.นช.  | งานที่ทำ | ย้ายแนวเสาแรงสูง 22 kV. |        | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1250/64 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวิน  |          |                         | วันที่ | 24 กันยายน 2564           |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          |                         | วันที่ | 24 กันยายน 2564           |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |  |          |                         | วันที่ | 24 กันยายน 2564           |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต,นายศุภสวัสดิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |                         |        |                           |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ               | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                   |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|----------------------------|
| 1   | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง          |                                      |                         |      |              |            |                            |
| 2   | NCA04YB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | NCA          |            |                            |
| 3   | NCS-KT4A  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual           |      | EGAT         |            |                            |
| 4   | NCA06VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | NCA          |            | โหลด= 2.37 MW.             |
| 5   | SAC-TP1   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual           |      | SAC          |            |                            |
| 6   | SAC09VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | SAC          |            | โหลด= 0.9 MW.              |
| 7   | PMB-TP1   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual           |      | PMB          |            |                            |
| 8   | PMB04VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | PMB          |            | โหลด= 7.36 MW.             |
| 9   | NCB02YB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | NCB          |            |                            |
| 10  | NCB-TP2   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual           |      | NCB          |            |                            |
| 11  | NCB06VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | NCB          |            | โหลด= 3.82 MW.             |
| 12  | NCB07VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | NCB          |            | โหลด= 3.08 MW.             |
| 13  | - ย้ายโหลด NCB2YB-01 ไปจ่ายจาก NCB3YB-01                |                                      |                         |      |              |            |                            |
| 14  | NCB03YB-01  | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | NCB          | CB         | เบรกเกอร์ 115 เควี         |
| 15  | NCB02YB-01  | สับ                                  | ปลด                     |      | NCB          | CB         | เบรกเกอร์ 115 เควี         |
| 16  | NCA04YS-07  | สับ                                  | ปลด ล็อคกุญแจ           |      | นช.          | ABS        | ตรงข้ามประปา               |
| 17  | - ย้ายโหลด NCB06 ไปจ่ายจาก NCA06                        |                                      |                         |      |              |            |                            |
| 18  | NCA06S-09   | ปลด                                  | สับ                     |      | นช.          | SCADA SF6  | ตรงข้ามท่าตำหนัก(วงจรถ่าง) |
| 19  | NCB06S-03   | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน            |      | นช.          | SF6        | โรงสีสหกรณ์                |
| 20  | ตรวจสอบ NCB02S-08 ให้เปิดวงจรโซลาร์"OFF"พร้อมล็อคคานไว้ |                                      |                         |      | นช.          | SF6        | ธนาคารทกส.(ล่าง)           |
| 21  | - ย้ายโหลด NCB06 ไปจ่ายจาก PMB04                        |                                      |                         |      |              |            |                            |
| 22  | NCB06S-06   | ปลด                                  | สับ                     |      | นช.          | SCADA SF6  | ร้านตู้                    |
| 23  | NCB06S-04   | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน            |      | นช.          | SCADA SF6  | ข้างทางรถไฟ                |
| 24  | - ย้ายโหลด NCB07 ไปจ่ายจาก SAC09                        |                                      |                         |      |              |            |                            |
| 25  | NCB07S-14   | ปลด                                  | สับ                     |      | นช.          | SF6        | วัดตุ๊กตา                  |
| 26  | NCB06S-02   | ปลด                                  | สับ                     |      | นช.          | SF6        | ฟาร์มลิขิต                 |
| 27  | DIS ชค.NCB07  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)    |      | นช.          | DIS        | ตรงข้ามรถตู้(วงจรถบ)       |
| 28  | NCB06S-02   | สับ                                  | ปลด                     |      | นช.          | SF6        | ฟาร์มลิขิต                 |
| 29  | - เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 KV เวลา 14.00 น.            |                                      |                         |      |              |            |                            |

| ที่  | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                        |
|--|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|---------------------------------|
| 30   | แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้าทำการปลดจุดจัมสายส่ง 115 kV. บริเวณหน้าโรงงานฟาร์อีสท์                      |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 31   | หลังจากชุดขอทไลน์กระเช้าทำการปลดจุดจัมสายส่ง 115 kV. บริเวณหน้าโรงงานฟาร์อีสท์เสร็จเรียบร้อยแล้ว |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 32   | - เมื่อพร้อมดับไฟ ระบุจำหน่าย 22 kV เวลา 17.00 น.  |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 33   | DIS ชค.NCB07   | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | นช.          |            | DIS กว้างเดี่ยวห้อยขา(วงจรถ่วง) |
| 34   | NCB06VB-01   | สับ                                  | ปลด                  |      | NCB          |            |                                 |
| 35   | NCB06S-01  | สับ                                  | ปลด                  |      | นช.          | DIS        | POT HEAD F.6                    |
| 36   | ตรวจสอบNCB01S-11 ให้เปิดวงจรโชว์"OFF"พร้อมล๊อคคานไว้   |                                      |                      |      | นช.          | SF6        | ร้านขาหมูฮ่องเต้(บน)            |
| 37   | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.นครชัยศรีรับทราบ  |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 38   | แจ้งกฟอ.นครชัยศรีทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1  |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 39   | แจ้งกฟอ.นครชัยศรีทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2  |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 40   | แจ้งกฟอ.นครชัยศรีทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3  |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 41   | แจ้งกฟอ.นครชัยศรีทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4  |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 42   | แจ้งกฟอ.นครชัยศรีปฏิบัติงานได้ทุกชุด   |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 43   | NCA04YB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | NCA          |            |                                 |
| 44   | NCS-KT4A   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | EGAT         |            |                                 |
| 45   | NCA06VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | NCA          |            |                                 |
| 46   | SAC-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | SAC          |            |                                 |
| 47   | SAC09VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SAC          |            |                                 |
| 48   | PMB-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | PMB          |            |                                 |
| 49   | PMB04VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | PMB          |            |                                 |
| 50   | NCB03YB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | NCB          |            |                                 |
| 51   | NCB-TP2  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | NCB          |            |                                 |
| 52   | NCB07VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | NCB          |            |                                 |
| %%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า (วันที่ 5 ต.ค.64) %%%%%%%%%% |  |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 53   | หลังจากกฟอ.นครชัยศรีปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด (ตอนเช้าวันที่ 6 ต.ค.64)                               |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 54   | แจ้งกฟอ.นครชัยศรีทำการปลด Short ground จุด G1 ออก  |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 55   | แจ้งกฟอ.นครชัยศรีทำการปลด Short ground จุด G2 ออก  |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 56   | แจ้งกฟอ.นครชัยศรีทำการปลด Short ground จุด G3 ออก  |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 57   | แจ้งกฟอ.นครชัยศรีทำการปลด Short ground จุด G4 ออก  |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 58   | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง   |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 59   | NCA04YB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | NCA          |            |                                 |
| 60   | NCB03YB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | NCB          |            |                                 |
| 61   | NCS-KT4A   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | EGAT         |            |                                 |
| 62   | NCA06VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | NCA          |            |                                 |
| 63   | SAC-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | SAC          |            |                                 |
| 64   | SAC09VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SAC          |            |                                 |
| 65   | PMB-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | PMB          |            |                                 |
| 66   | PMB04VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | PMB          |            |                                 |
| 67   | NCB-TP2  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | NCB          |            |                                 |

| ที่   | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ               | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                        |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|---------------------------------|
| 68  | NCB07VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | NCB          |            |                                 |
| 69  | - จ่ายไฟ NCB06,07   |                                      |                         |      |              |            |                                 |
| 70  | DIS ชค.NCB07  | ปลด                                  | สับ                     |      | นช.          |            | DIS กว้างเดี่ยวห้อยขา(วงจรถ่าง) |
| 71  | NCB06S-01   | ปลด                                  | สับ                     |      | นช.          |            | DIS POT HEAD F.6                |
| 72  | NCB06VB-01  | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | NCB          |            |                                 |
| 73  | ให้ปลดล๊อคคาน NCB01S-11 ออกอย่างเดียว   |                                      |                         |      | นช.          |            | SF6 ร้านชาหมูฮ่องเต้(บน)        |
| 74  | - ย้ายโหลด NCB06 กลับจาก PMB04  |                                      |                         |      |              |            |                                 |
| 75  | NCB06S-04   | ปลด                                  | สับ                     |      | นช.          | SCADA      | SF6 ข้างทางรถไฟ                 |
| 76  | NCB06S-06   | สับ                                  | ปลด                     |      | นช.          | SCADA      | SF6 ร้านตุ๋                     |
| 77  | - ย้ายโหลด NCB07 กลับคืนจาก SAC09   |                                      |                         |      |              |            |                                 |
| 78  | NCB06S-02   | ปลด                                  | สับ                     |      | นช.          |            | SF6 ฟาร์มลิขิต                  |
| 79  | DIS ชค.NCB07  | ปลด                                  | สับ                     |      | นช.          |            | DIS ตรงข้ามรถตู้(วงจรถบน)       |
| 80  | NCB06S-02   | สับ                                  | ปลด                     |      | นช.          |            | SF6 ฟาร์มลิขิต                  |
| 81  | NCB07S-14   | สับ                                  | ปลด,ล๊อคคาน             |      | นช.          |            | SF6 วัดตุ๊กตา                   |
| 82  | - ย้ายโหลด NCB06 กลับจาก NCA06  |                                      |                         |      |              |            |                                 |
| 83  | NCB06S-03   | ปลด                                  | สับ                     |      | นช.          |            | SF6 โรงสีสหกรณ์                 |
| 84  | NCA06S-09   | สับ                                  | ปลด                     |      | นช.          | SCADA      | SF6 ตรงข้ามท่าตำหนัก(วงจรถ่าง)  |
| 85  | ให้ปลดล๊อคคาน NCB02S-08 ออกอย่างเดียว   |                                      |                         |      | นช.          |            | SF6 ธนาคารชกส.(ล่าง)            |
| 86  | - พร้อมทำการจัม DDE.115 kV.หน้าโรงงานฟาร์มอีสท์   |                                      |                         |      |              |            |                                 |
| 87  | ตรวจสอบ NCA04YS-07 ให้เปิดวงจรถูกออกไว้ทั้งสามเฟส   |                                      |                         |      | นช.          |            | ABS ตรงข้ามประปา                |
| 88  | แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้าทำการจัมจุดจัมสายส่ง 115 kV. บริเวณหน้าโรงงานฟาร์มอีสท์                  |                                      |                         |      |              |            |                                 |
| 89  | หลังจากชุดฮอทไลน์กระเช้าทำการจัมจุดจัมสายส่ง 115 kV. บริเวณหน้าโรงงานฟาร์มอีสท์เสร็จเรียบร้อย |                                      |                         |      |              |            |                                 |
| 90  | - ย้ายโหลด NCB2YB-01 กลับจาก NCB3YB-01  |                                      |                         |      |              |            |                                 |
| 91  | NCA04YS-07  | ปลด                                  | สับ                     |      | นช.          |            | ABS ตรงข้ามประปา                |
| 92  | NCB02YB-01  | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | NCB          |            | CB เบรกเกอร์ 115 เควี           |
| 93  | NCB03YB-01  | สับ                                  | ปลด                     |      | NCB          |            | CB เบรกเกอร์ 115 เควี           |
| 94  | NCA04YB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | NCA          |            |                                 |
| 95  | NCB02YB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | NCB          |            |                                 |
| 96  | NCS-KT4A  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto             |      | EGAT         |            |                                 |
| 97  | NCA06VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | NCA          |            |                                 |
| 98  | SAC-TP1   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto             |      | SAC          |            |                                 |
| 99  | SAC09VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | SAC          |            |                                 |
| 100   | PMB-TP1   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto             |      | PMB          |            |                                 |
| 101   | PMB04VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | PMB          |            |                                 |
| 102   | NCB-TP2   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto             |      | NCB          |            |                                 |
| 103   | NCB06VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | NCB          |            |                                 |
| 104   | NCB07VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | NCB          |            |                                 |
| %%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ทั้งหมด %%%%%%%%%% |   |                                      |                         |      |              |            |                                 |

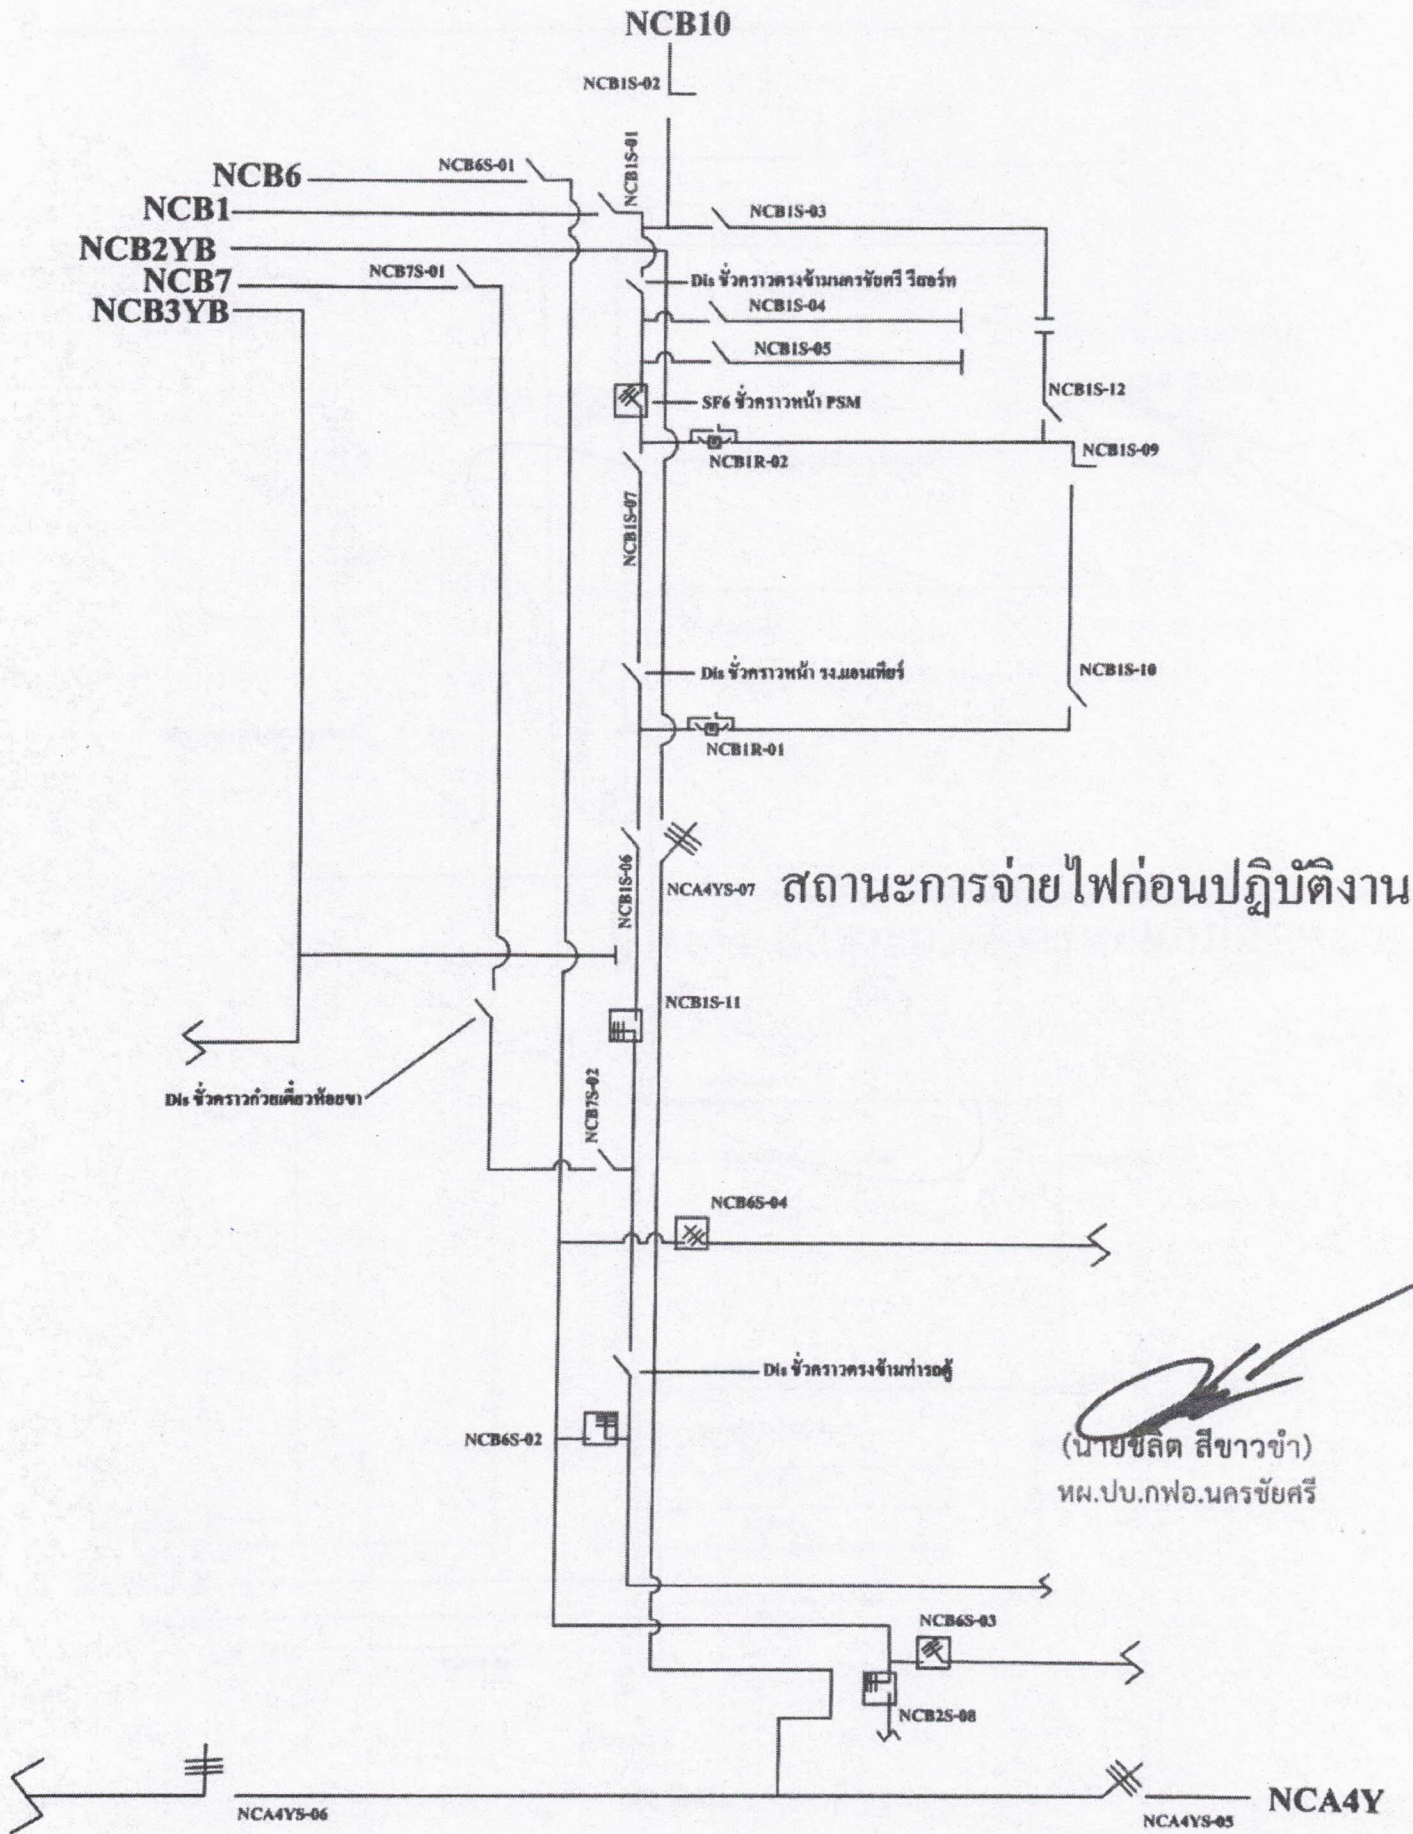

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

(นายชิลิต สีขาวขำ)  
 ทผ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี

NCB10

NCBIS-02

NCB6

NCB6S-01

NCB1

NCB2YB

NCB7

NCB3YB

NCB7S-01

NCBIS-03

Dis ชั่วคราวตรงข้ามนครชัยศรี

NCBIS-04

NCBIS-05

SF6 ชั่วคราวหน้า PSM

NCBIR-02

NCBIS-12

NCBIS-09

NCBIS-07

Dis ชั่วคราวหน้า รบมอนเทอ์

NCBIR-01

NCBIS-10

NCBIS-06

NCA4YS-07

### สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

- G.1 ขาหม้อแปลง 2 วงจร (กฟอ.นช ดำเนินการ)
- G.2 หน้ากวดเดียวที่ห้วยขา (กฟอ.นช ดำเนินการ)
- G.3 ครงข้ามท่ารถคู่ 2 วงจร (กฟอ.นช ดำเนินการ)
- G.4 ปากทาง รร แบบบู (กฟอ.นช ดำเนินการ)

Dis ชั่วคราวกวดเดียวที่ห้วยขา

G.2

G.1

บริเวณที่ปฏิบัติงาน

G.3

G.4

NCB6S-04

Dis ชั่วคราวตรงข้ามท่ารถคู่

NCB6S-02

(นายชลิต สีขาวขำ)  
ทผ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี

Hot line เปิดจุดข้ามหน้า ว.จ.ฟาร์ม  
วันที่ 5 ตค 64 (14.00) และขอข้ามเข้าวันที่ 5 ตค 64


NCA4YS-06

NCA4YS-05

NCA4Y

NCB6S-03

NCB2S-08

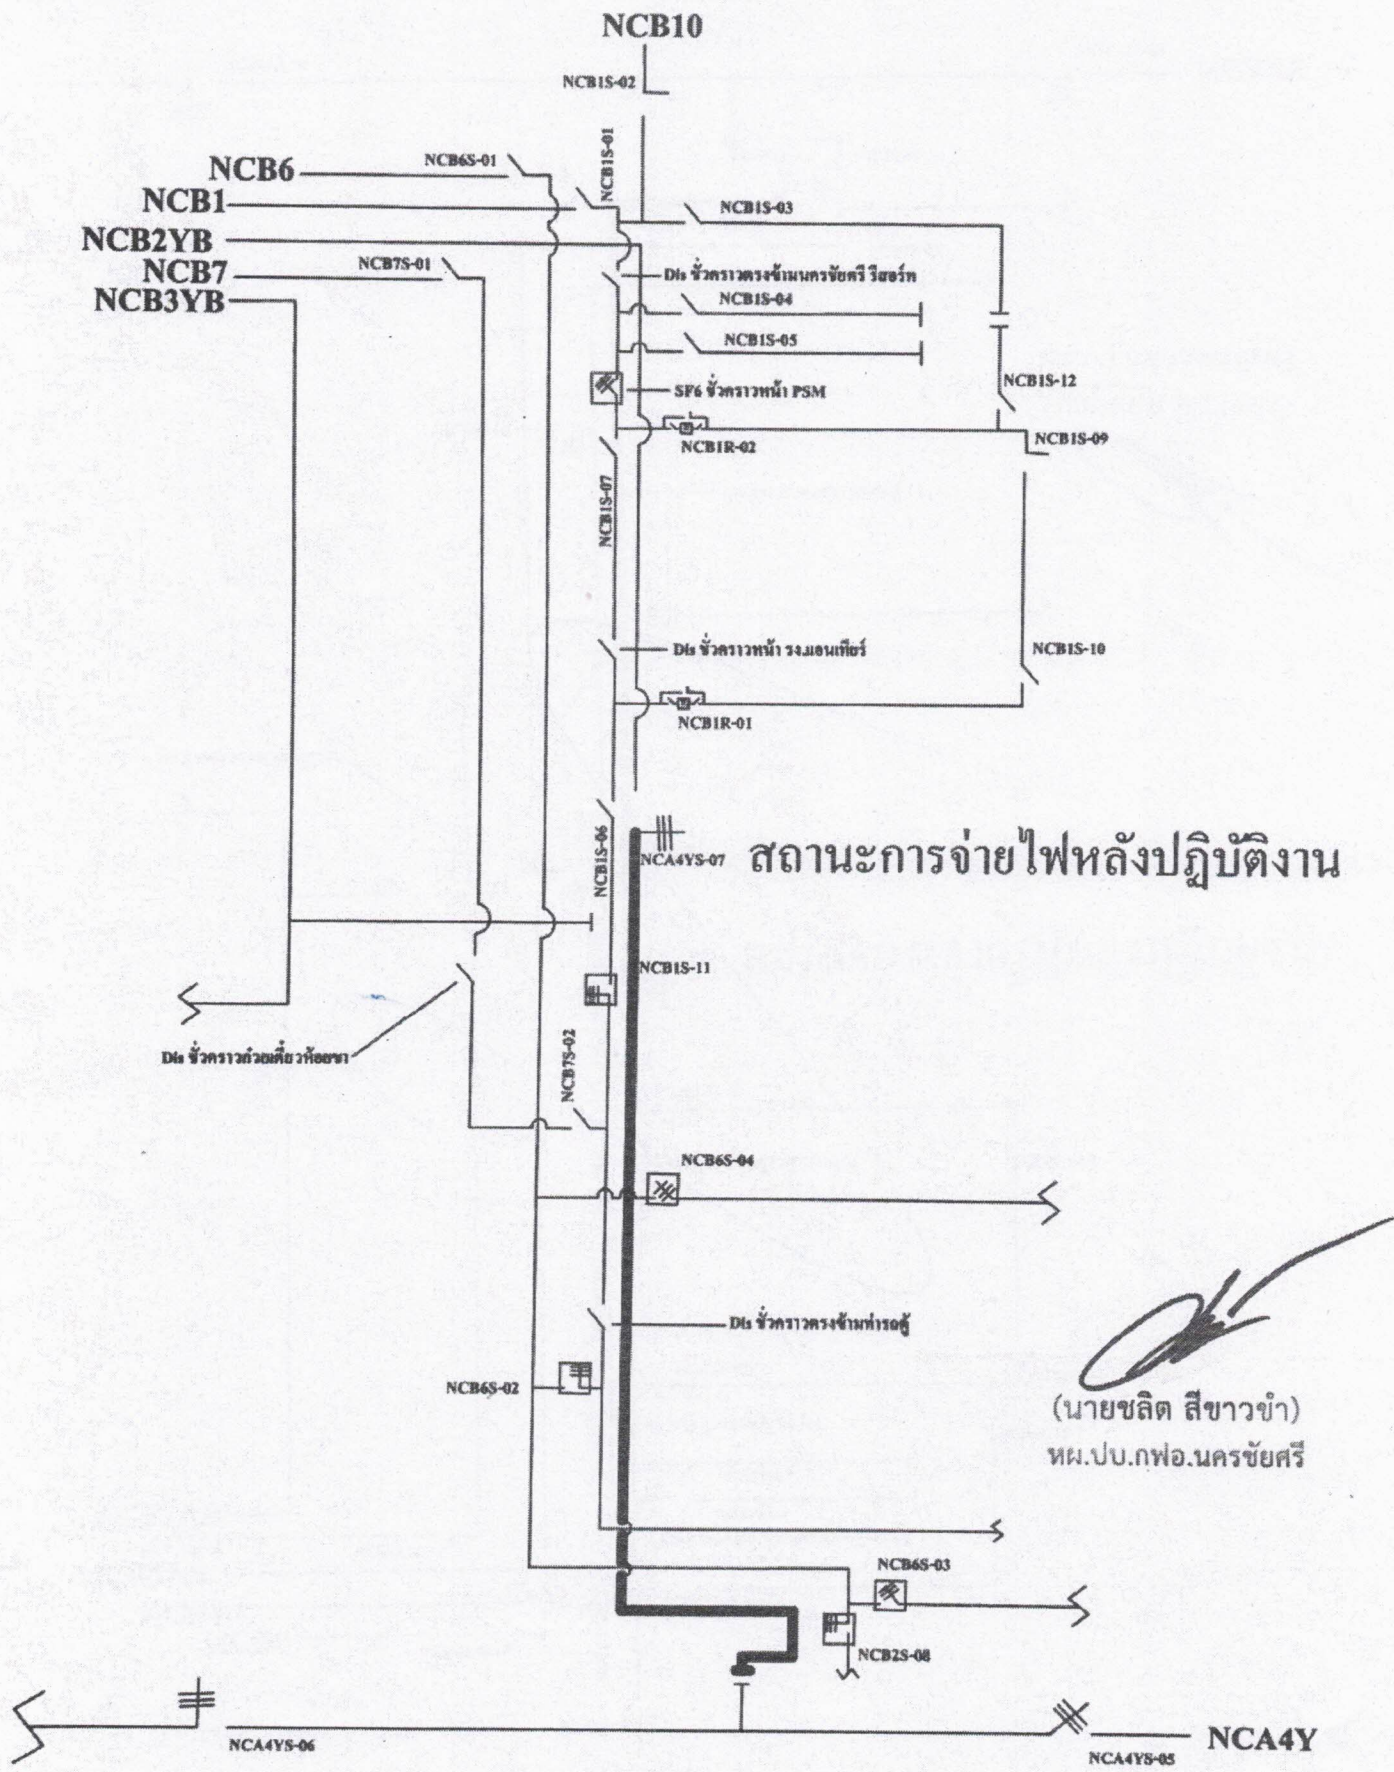

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

(นายชลิต สีขาวขำ)  
 ทม.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี
