



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

24 ส.ค. 66

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ป.บ.)- ๑๙๐๙/๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงาน...เชื่อมสายแรงสูงเข้าหม้อแปลงผู้ใช้ไฟงาน BU.....ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๒ KTE	๒๕ ส.ค. ๖๖	๑๒.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.	เพื่อให้ชุดงาน ผบ.เชื่อม ไลน์แรงสูงเข้าหม้อแปลง ผู้ใช้งาน BU บริเวณเชิง สะพานท่าจันทน์หลังเสาต้น Riser Pole	SF๖ KTE๐๒S-๐๔ หน้าโรงชั้น	DIS KTE ๐๒S-๑๑ เชิงสะพานท่าจันทน์ ฝั่งบ้านแพ้ว	นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ท.ป.บ.กฟอ.กทบ. โทร.๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงานประมาณ ๑ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง ท.ป.บ.กฟอ.กทบ. โทร ๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  ๑.๑  มีโอกาสชำรุด  ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายอารุณ จรดล )

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ KTE๐๒ จาก KTE๒S-๐4 ถึง KTE๒S-11  
ในวันที่ 25 ส.ค.๖๖ ตั้งแต่เวลา 12.0๐ น. ถึง 13.0๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1261/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นีร์ภัท โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ จดข.ล.ม.ท.ช มาบัณฑิตย์

( นาย นีร์ภัท โพธิ์พันธ์ )

อด.ก.๔ แทน ผ.ด.พ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.กทบ. , กฟภ.ส.๒(ขพ.)

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เชิงสะพานท่าจีน (KTE02)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ส.ค. 66	ระหว่าง	12.00 น.	ถึง	13.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	เชื่อมไลน์หม้อแปลง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1261/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	23 สิงหาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	[Signature]			วันที่	23 สิงหาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	[Signature]			วันที่	23 สิงหาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายมนตรีทร,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		- -
3	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		- -
4	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- LOAD = 8 MW
5	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- LOAD = 2 MW
6	BNP10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.		R แยกวัดราษ
7	ย้ายโหลด KTE07 บางส่วน ไปรับไฟจาก BNP10						
8	BNP10S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ก่อนป้อมตำรวจ
9	KTE07S-03	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 รั้นขายของเก่าญี่ปุ่น
10	ย้ายโหลด KTE02 บางส่วน ไปรับไฟจาก KTE07						
11	KTEBVB-01	ปลด	สับ		KTE		- ขนานบัส
12	KTE02S-06	ปลด	สับ		กทบ.		DIS คริวสมัยเก่า (วงจรล่าง)
13	KTE02S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กทบ.		SF6 โรงงานชั้นแสงเจริญ
14	KTEBVB-01	สับ	ปลด		KTE		- ขนานบัส
15	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 12.00 น.						
16	KTE02S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS เชิงสะพานท่าจีนฝั่ง กทบ.
17	KTE02S-11	สับ	ปลด		กทบ.		DIS เชิงสะพานท่าจีนฝั่ง บพว.
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
19	แจ้ง กฟอ.กทบ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
20	แจ้ง กฟอ.กทบ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
21	แจ้งให้ กฟอ.กทบ. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
22	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		- -
23	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		- -
24	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
25	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
26	BNP10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal,ALT		บพว.		R แยกวัดราษ
27	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
28	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
29	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		- -
30	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- -
32	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- -
33	BNP10R-01	Normal,ALT	Nonreclosing, ALT		บพว.		R แยกวัดราษ
34	แจ้ง กฟอ.กทบ. ปลด Short ground จุด G1						
35	แจ้ง กฟอ.กทบ. ปลด Short ground จุด G2						
36	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
37	KTE02S-11	ปลด	ล๊ับ		กทบ.		DIS เจริงสะพานทำเงินฝั่ง บพว.
38	KTE02S-10	ปลด	ล๊ับ		กทบ.		DIS เจริงสะพานทำเงินฝั่ง กทบ.
39	ย้ายโหลด KTE02 บางส่วน คีนจาก KTE07						
40	KTEBVB-01	ปลด	ล๊ับ		KTE		- ขนานบัส
41	KTE02S-04	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		กทบ.		SF6 โรงงานชั้นแสงเจริญ
42	KTE02S-06	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS คริวสมัยเก่า (วงจรถ่วง)
43	KTEBVB-01	ล๊ับ	ปลด		KTE		- ขนานบัส
44	ย้ายโหลด KTE07 บางส่วน คีนจาก BNP10						
45	KTE07S-03	ปลด	ล๊ับ		กทบ.	SCADA	SF6 ร้านขายของเก่าญี่ปุ่น
46	BNP10S-05	ล๊ับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 ก่อนป้อมตำรวจ
47	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		- -
48	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		- -
49	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
50	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
51	BNP10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพว.		R แยกวัดราษ
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนผังปัจจุบัน ก่อนตัดไฟ บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งกระทุ่มแบน - ฝั่งบ้านแพ้ว  
 เพื่อให้ชุดงาน ผบ.บ. และ ผกส.กทบ. เชื่อมสายแรงสูงเข้าหม้อแปลงผู้ใช้ไฟ (งาน BU)  
 ตามอนุมัติที่ กทบ.(บค).-๑๘๑/๒๕๖๖ ดว. ๖ มิ.ย. ๒๕๖๖

WBS:C-66-I-KTNC.S.0181.02.2

วันศุกร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

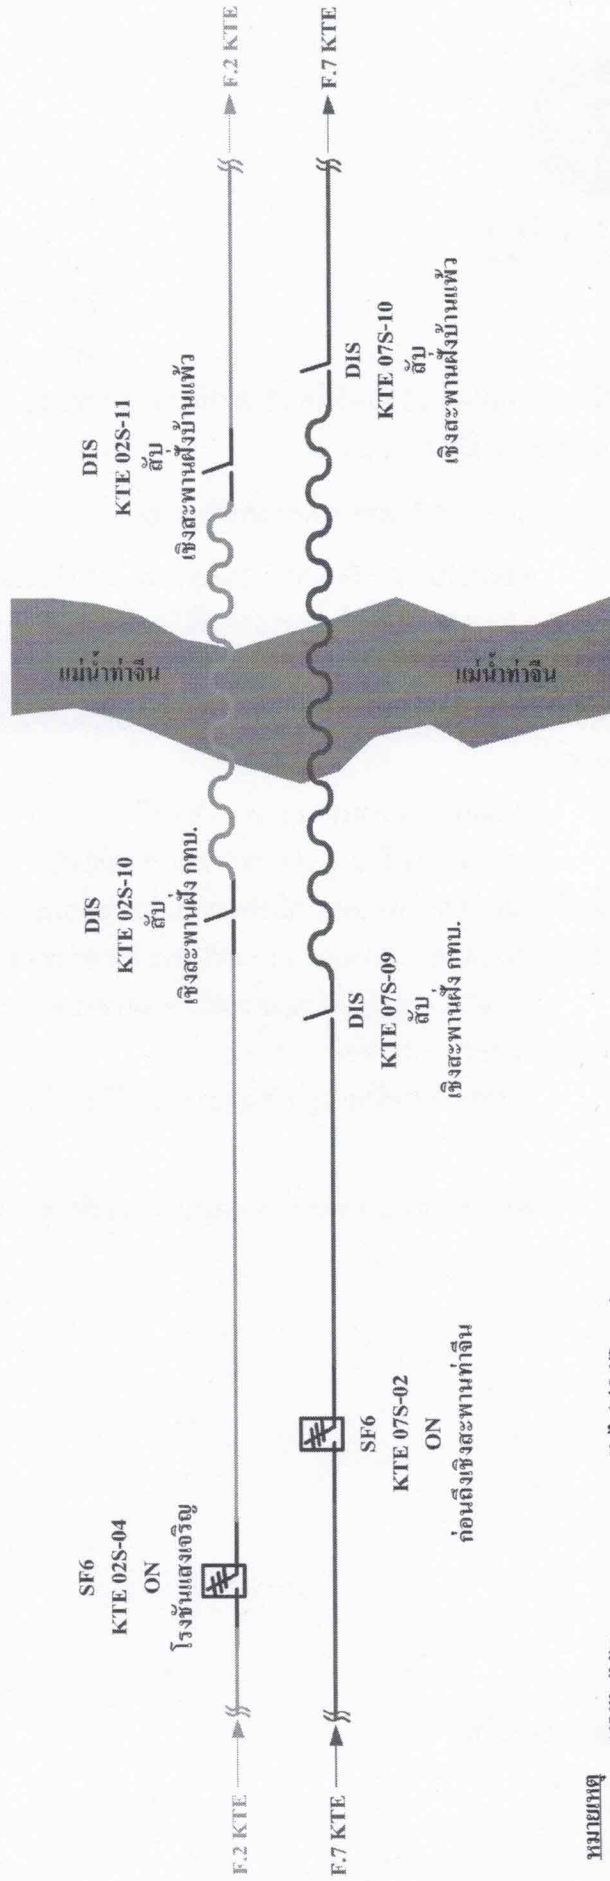


หมายเหตุ

มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการตัดไฟปฏิบัติงานจำนวน ๑ ราย

แผนผังปัจจุบัน หลังดับไฟ บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งกระทุ่มแบน - ฝั่งบ้านแพ้ว  
 เพื่อให้ชุดงาน ผบ. และ ผคส.กทบ. เชื่อมสายแรงสูงเข้าห้อแปลงผู้ใช้ไฟ ( งาน BU )  
 ตามอนุมัติที่ กทบ.(บค).-๑๘๑/๒๕๖๖ ดว. ๖ มิ.ย. ๒๕๖๖

WBS: C-66-I-KTNC.S.0181.02.2

วันศุกร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

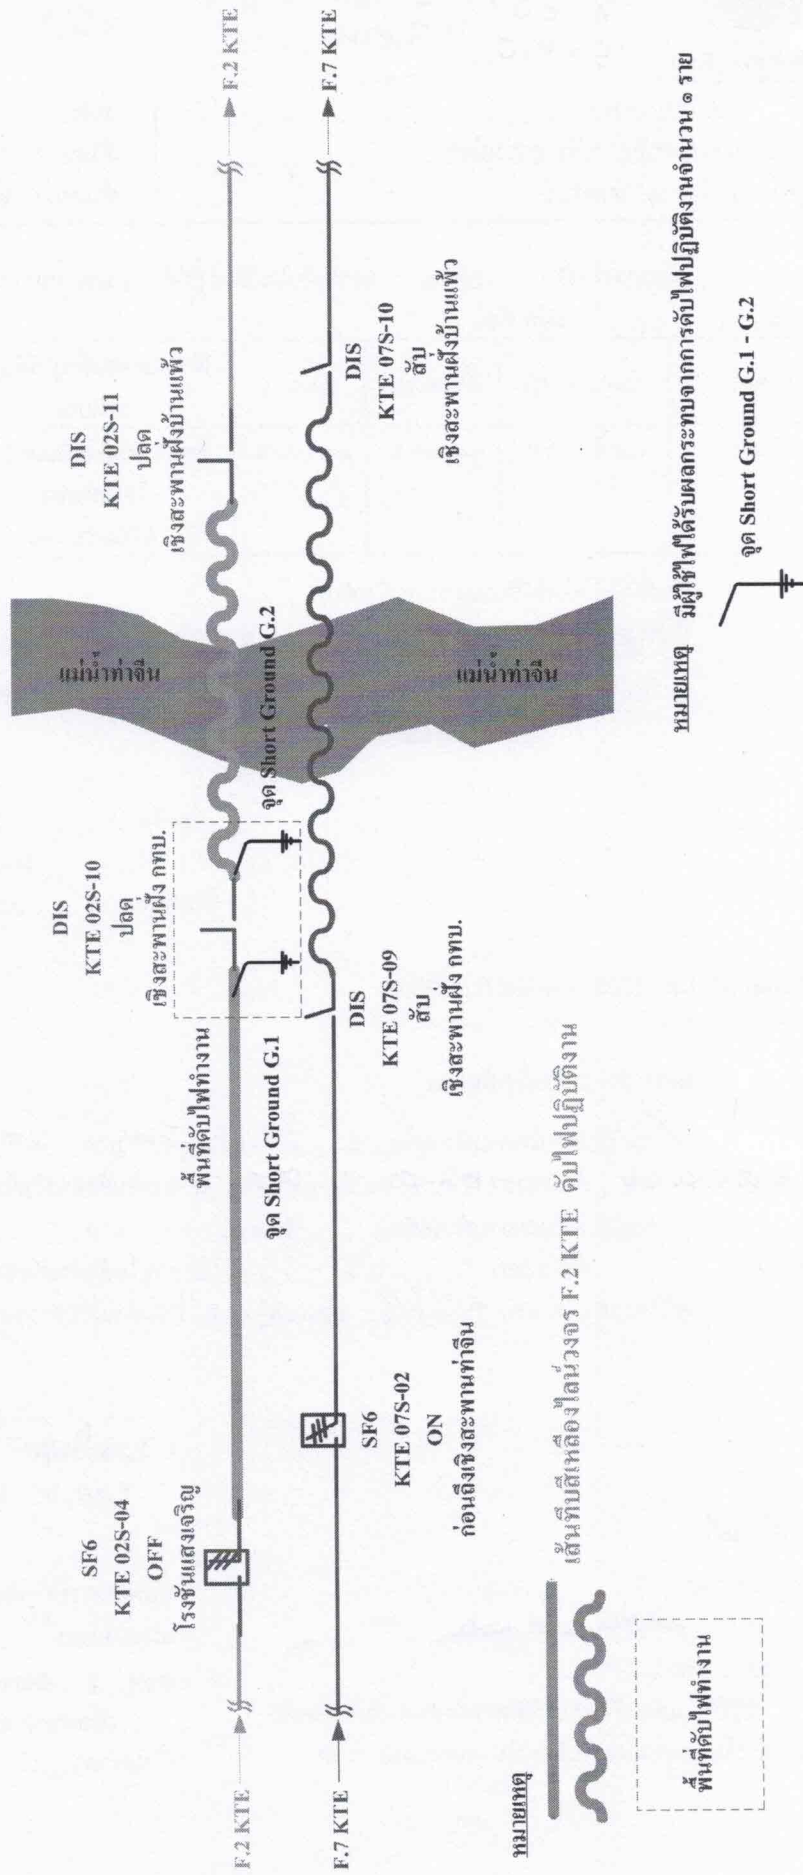

หมายเหตุ มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงานจำนวน ๑ ราย

จุด Short Ground G.1 - G.2
