



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ อทง.(บพ.) ๓๖๙๙/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นาย สมบูรณ์ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสราวุธ ฤกษ์มณี

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อท.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงสถานีไฟฟ้า อุทอง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผน ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วันเดือนปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTG๐๒	๘ ส.ค. ๒๕๖๕	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อดำเนินการ พาดสายข้ามถนน ขนาด ๑๑๕ SO.MM. หน้าสถานี กฟอ.อุทอง ๒ (ขค.)	DIS ชั่วคราว ฝั่งตรงข้าม ป้อมบางจาก	SF๖ ชั่วคราว ข้างลานตากข้าว	นายจกกล ไพธิกุล พงษ.ส.ปบ.กฟอ.อุทอง ๐๘๒๒๖๐๙๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบได้ับ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจกกล ไพธิกุล ตำแหน่ง ขณ.ปบ.กฟอ.อุทอง โทร ๐๘๕-๒๖๖๘๘๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชั่วคราว ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชั่วคราว ๑.๒ ไม่มีโอกาสชั่วคราว
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสราวุธ ฤกษ์มณี)

ตำแหน่ง จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อท.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเคอร์ UTG 2 จาก SF6 บังลาคตากข้าว ถึง Dis.ตรงข้าม ป้อมบางจาก

ในวันที่ ๗ ส.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1263/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.อสิริณี อรรถประพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทพ.พทก ไพธิกุล

(นายอสิริณี อรรถประพันธ์)
๒๓.๘ ๓๓.๘.๖๕.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. อทง.

อท.บช.(ก.๓), อท.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผน
แผนผังแนบ 2 แผน

ผจฟ. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ UTG02 บริเวณ SF6 ช้างลานตากข้าว - DIS.ตรงข้ามปั้มบางจาก					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.อทง.	งานที่ทำ	พาดสายข้ามถนน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1263/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	1 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายฉนิต,นายมนอช			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	แจ้ง VSPP บ.อุททองไปโอพาวเวอร์หยุดขนานก่อนทำการย้ายโหลด						
3	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
4	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
5	UTG07VB-01	Auto	Manual		UTG		
6	UTG02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	RE	บ้านหนองไฉ่
7	- ย้ายโหลด UTG02 ไปจ่ายจาก UTG07						
8	UTG02S-15	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 ดึงข้ามถนนบ้านหนองไฉ่
9	UTG02S-16	ปลด	สับ		อทง.		DIS ตรงข้ามสภต.พลับพลาไชย
10	DISชค.UTG07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS ตรงข้ามปั้มบางจาก
11	UTG02S-15	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 ดึงข้ามถนนบ้านหนองไฉ่
12	- ดับไฟเวลา 08.00 น.						
13	SF6ชค.UTG07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อทง.		SF6 ช้างลานตากข้าว
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กพอ.อุททองรับทราบ						
15	แจ้งกพอ.อุททอง Test ไฟ Short Ground จุด G1						
16	แจ้งกพอ.อุททอง Test ไฟ Short Ground จุด G2						
17	แจ้งกพอ.อุททองลงข้อมูล WeSafe เ						
18	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
19	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
20	UTG07VB-01	Manual	Auto		UTG		
21	UTG02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	RE	บ้านหนองไฉ่


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	แจ้งกฟอ.อุททองปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
23	หลังจากกฟอ.อุททองปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
24	แจ้งกฟอ.อุททองปลด Short Ground จุด G1 ออก						
25	แจ้งกฟอ.อุททองปลด Short Ground จุด G2 ออก						
26	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
27	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
28	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
29	UTG07VB-01	Auto	Manual		UTG		
30	UTG02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	RE	บ้านหนองไธ้
31	- จ่ายไฟ						
32	SF6ชค.UTG07	ปลด	สับ		อทง.		SF6 ช่างลานตากข้าว
33	- ย้ายโหลด UTG02 กลับคืนจาก UTG07						
34	UTG02S-15	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	ดึงข้ามถนนบ้านหนองไธ้
35	DISชค.UTG07	ปลด	สับ		อทง.		ตรงข้ามบึงบางจาก
36	UTG02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		ตรงข้ามสภต.พลับพลาไชย
37	UTG02S-15	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	ดึงข้ามถนนบ้านหนองไธ้
38	แจ้ง VSPP บ.อุททองไปโอพาวเวอร์ชันานไฟได้ตามปกติ						
39	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
40	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
41	UTG07VB-01	Manual	Auto		UTG		
42	UTG02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	RE	บ้านหนองไธ้
%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

สถานะจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

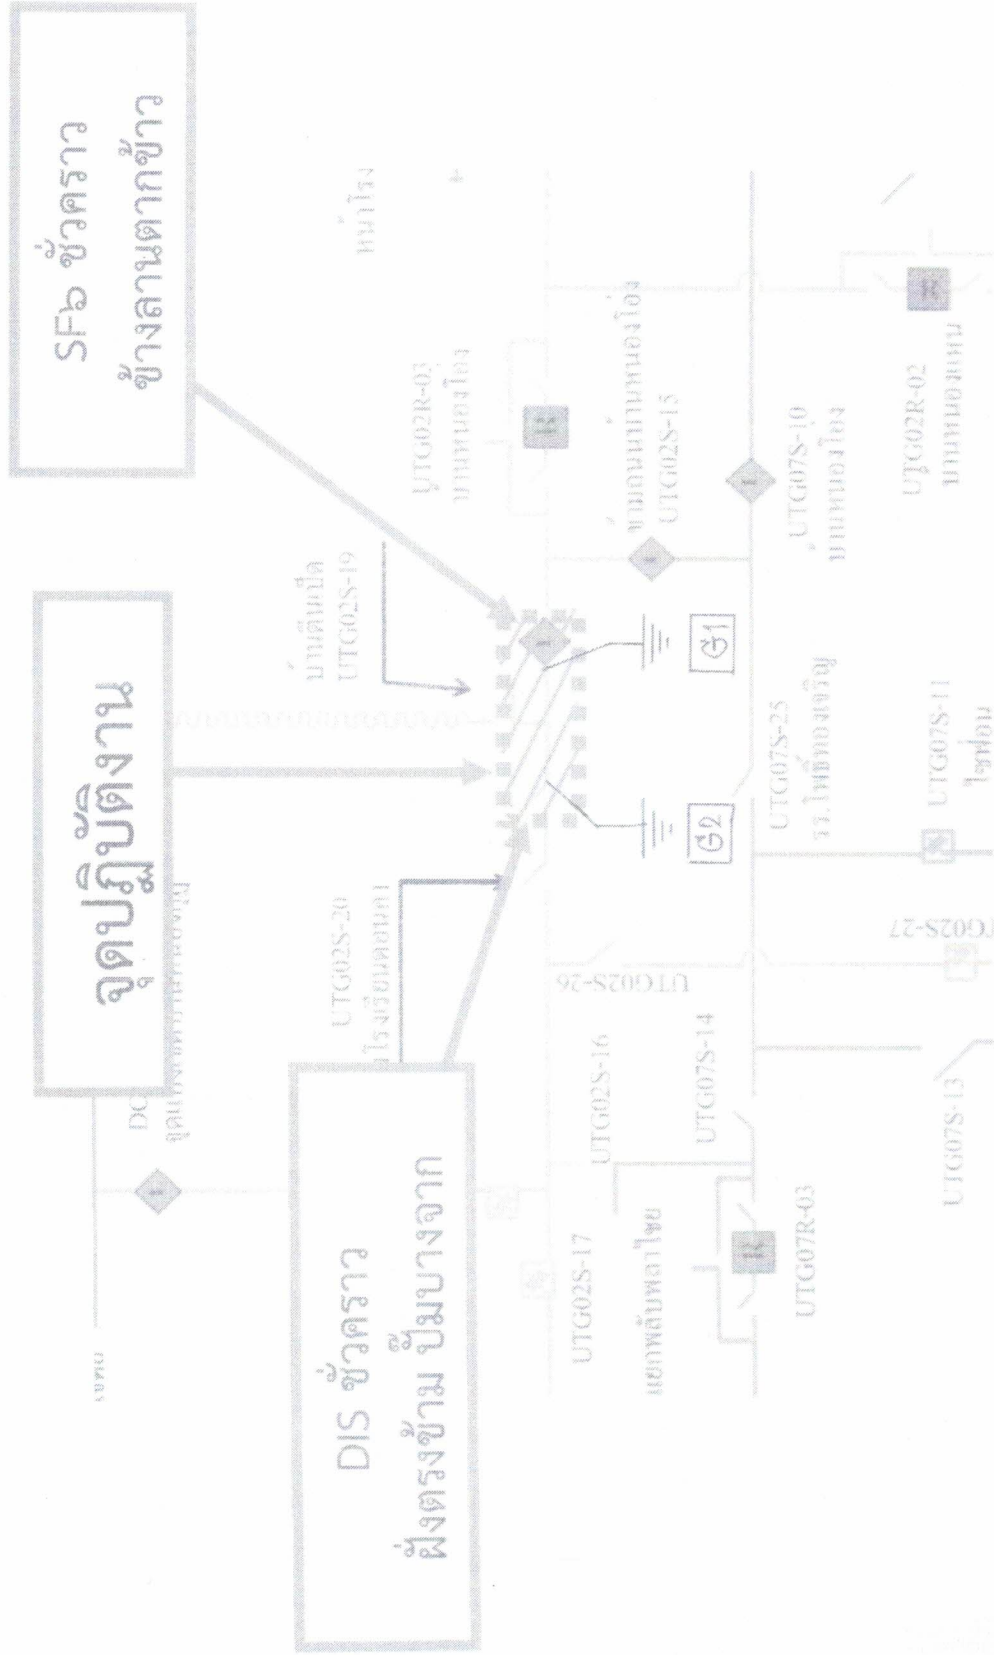

(ชื่อ Site Engineer)
 ชน. พ.ว. ๐๖๑๑๓๐๖

สถานะจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

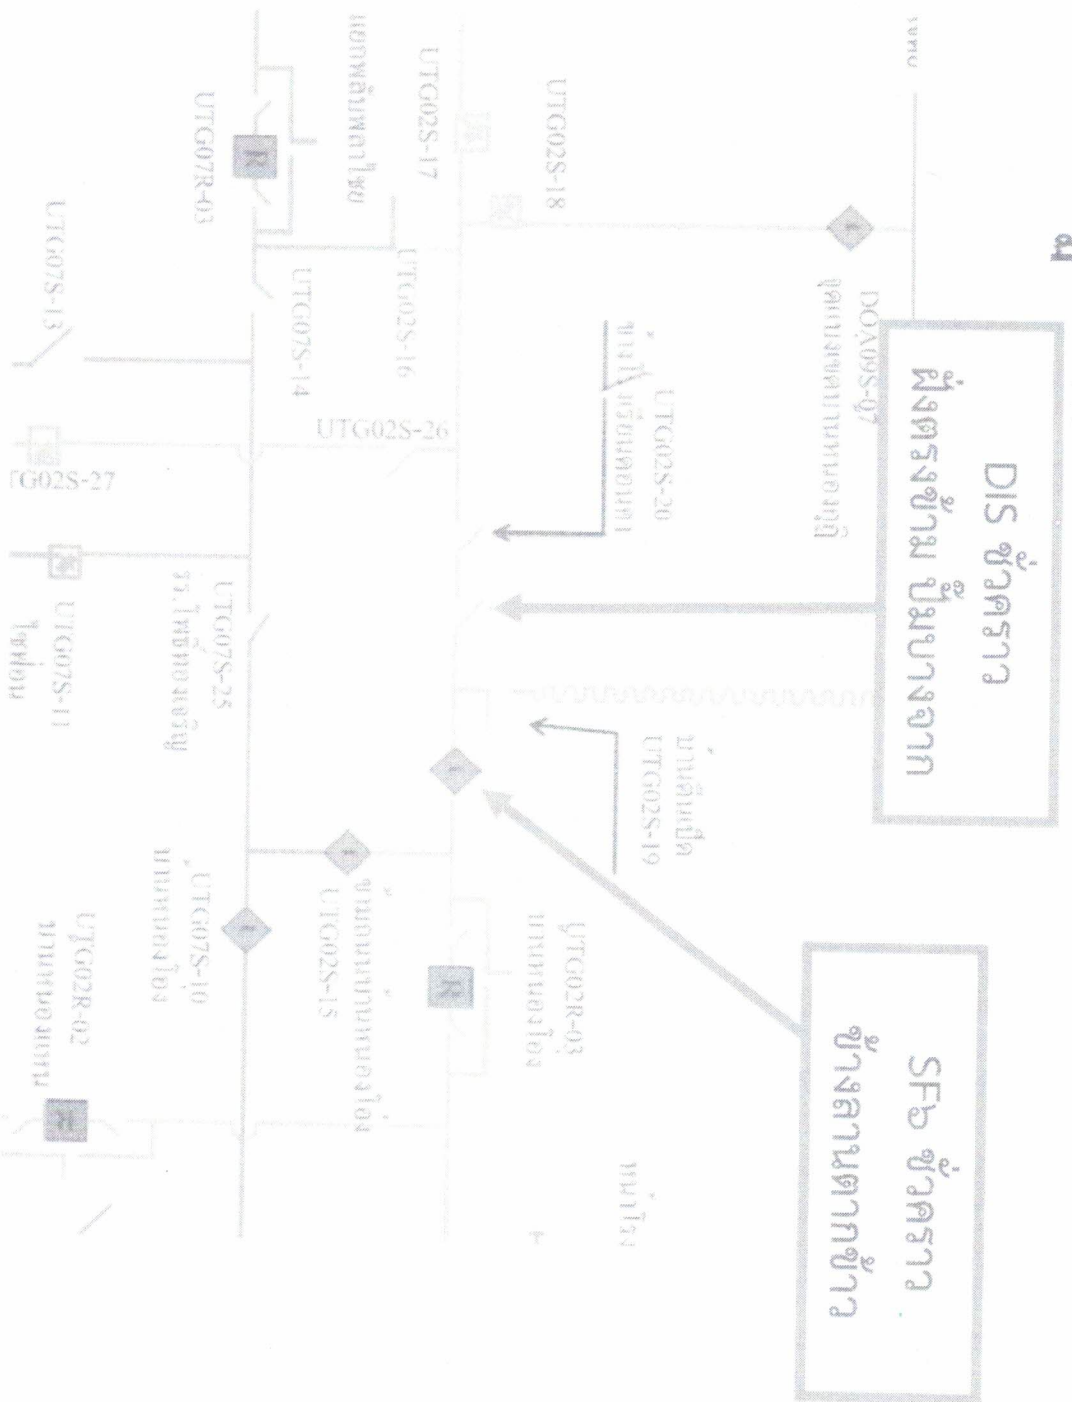

SW. DU AND. 0100



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แบบตรวจสอบหาจุดอันตรายในการปฏิบัติงาน
(Job Hazard Plan)

วัน/เดือน/ปี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

งานที่ปฏิบัติ คับไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อดำเนินการพาดสายข้ามถนน ขนาด ๑๘๕ SQ.MM.

หน้าสถานี ๒ อุทอง ๒ (ชค.)

สถานที่ หน้าสถานี ๒ อุทอง ๒ (ชค.)

ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย

มี	ไม่มี		เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	หมายเหตุ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Voltage Detector.....๒.....ตัว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ชุดต่อสายลงดิน.....๒.....ชุด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กรวยยาง.....๔๐.....อัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ป้ายกันทางเตือนอันตราย.....๒.....ชุด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ป้ายแขวนห้ามสับสวิตซ์.....๔.....อัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	อื่นๆ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

อันตรายที่ตรวจสอบ	วิธีควบคุม / ป้องกัน	หมายเหตุ
๑.จุดที่ปฏิบัติงานอยู่ติดกับถนนหลวง	- ก่อนเริ่มปฏิบัติงานให้มีการ ตั้งป้าย วางกรวยยางบริเวณรอบๆจุดปฏิบัติงาน	
๒.สายเคเบิลโทรศัพท์	- ใช้ความระมัดระวัง ในการขึ้นปฏิบัติงาน	
๓.อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)	- ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ PPE ให้ครบถ้วน	
๔.ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบ ๑๑๕ เควี และระบบ ๒๒ เควี	- ก่อนปฏิบัติงาน ให้ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ด้วย Voltage Detector - ให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน	

เรียน ผจก.กฟอ.อุทอง
เพื่อโปรดทราบและ
ดำเนินการต่อไป

นายจنگกล โทธิกุล
(ผู้ควบคุมงาน)

แบบฟอร์มนี้ให้เก็บเข้าแฟ้มงาน*
