



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิญญูขอตัดไฟ

## Switching Deadline

02/10/67

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปบ.) 03080  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
 ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗  
 ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับสายส่ง ๑๑๕KV และ NCA๐๙ (บางส่วน) พาดสาย ๑๑๕KV โลင်း  
สถานี NCA (ฝั่งสถานี นครชัยศรี กฟผ.) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCA๓YB	๒ ต.ค. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	พาดสาย ๑๑๕KV โลင်း สถานี NCA ฝั่งสถานี กฟผ.	NCA๓YB	สถานี นครชัยศรี กฟผ. NCS-๗๐๑๑๒ (๑๑๕KV Line NO.๒ To PEA)	นายอนุยุทธ ชูโชติ ๐๘๘-๘๗๒๖๖๕๕
๒	NCA๐๙		๐๘.๓๐	๑๗.๐๐		NCA๐๙s-๐๑	-จุดตัด DDE (วิธีชอทโลน) ตลาดนัดไค้ง สถานี	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่วัดหน้าสถานี นครชัยศรี ๑ - ตรงข้ามร้าน CJ EXPRESS

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิธินัย ผูกนิม ตำแหน่ง ช.ปบ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสข่าจรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสข่าจรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสข่าจรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
 ๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๔๙๕๖ Long : ๑๐๐.๑๘๘๑๗  
 ๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๔๗๙๖ Long : ๑๐๐.๑๘๕๕๘๕

ลงชื่อ (นายพิชา ตันยิตเส็ง)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
 เรียงน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก NCS 70112 ถึง NCA03YB-01  
 ในวันที่ 6 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1266/67  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ NCA09 จาก NCA09S-01 ถึง จุดตัด DDE ตลาดนัดไค้งสถานี  
 ในวันที่ 6 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....  
 พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริวัฒน์ แก้วฉิมนิล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิธินัย ผูกนิม

(นาย ศิริวัฒน์ แก้วฉิมนิล)  
 ๐๘๓.5 ๖๓๓๓ ช.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล.จช. กฟล.ลพ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 3 แผ่น



ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯ นครชัยศรี 1 (NCA03YB ,NCA09)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ต.ค. 67	ระหว่าง	08.30	ถึง	6 ต.ค. 67	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	พาดสายส่ง 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1266/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	23 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐภาณุจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายจิรวัดน์,นายวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายชนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง								
2	NCA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NCA	-		
3	NCA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NCA	-		
4	NCA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			NCA	-		
5	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NCA	-	L = 3.01 MW.	
6	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NCA	-	L = 6.87 MW.	
7	NCA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT			นช.	SCADA	R	คลองทางหลวง
8	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT	-		
9	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAB	-	L = 6.46 MW.	
10	ย้ายโหลด NCA-70112 ไปรับไฟจาก NCA-7012								
11	ตรวจสอบใบมีด 115kV รหัส NCABYS-01,02 อยู่สถานะ "สับ"								
12	NCABYB-01	ปลด	สับ			NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี	
13	NCA03YB-01	สับ	ปลด			NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี	
14	NCA03YS-02	สับ	ปลด			NCA	-	ใบมีด 115 เควี	
15	NCA03YS-03	สับ	ปลด			NCA	-	ใบมีด 115 เควี	
16	ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน ไปรับไฟจาก NCA06								
17	NCA09S-10	ปลด	สับ			นช.	SCADA	SF6	หน้าวัดป่าท่ากระชับ
18	NCA09R-01	สับ	ปลด			นช.	SCADA	R	คลองทางหลวง
19	ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน ไปรับไฟจาก SAB05								
20	NCA09S-06	ปลด	สับ			สพร.		SF6	แยกเข้า อบต.คลองใหม่
21	NCA09VB-01	สับ	ปลด			NCA	-		
22	NCA09S-01	สับ	ปลด			NCA	-	Pot Head	
23	เมื่อพร้อมดับไฟ								
24	NCS 70112	สับ	ปลด			EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี	
25	NCS 70117	สับ	ปลด			EGAT	-	ใบมีด 115 เควี	
26	แจ้ง Hotline 22kV ทำการปลด DDE บริเวณตลาดนัดโค้งสถานีฯออกทั้ง 3 เฟส								
27	เมื่อ Hotline 22kV ทำการปลด DDE บริเวณตลาดนัดโค้งสถานีฯออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ								


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
28	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.สพร. รับทราบ							
29	แจ้ง กพอ.สพร. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
30	แจ้งให้ กพอ.สพร. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย							
31	แจ้ง กพอ.สพร. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
32	NCA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			NCA	-	
33	NCA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			NCA	-	
34	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			NCA	-	
35	NCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			NCA	-	
36	SA2-KT1A	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			EGAT	-	
37	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			SAB	-	
****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า****								
38	เมื่อ กพอ.สพร. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ							
39	แจ้ง กพอ.สพร. ทำการปลด Short ground จุด G1							
40	NCA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NCA	-	
41	NCA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			NCA	-	
42	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NCA	-	
43	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NCA	-	
44	SA2-KT1A	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			EGAT	-	
45	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAB	-	
46	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
47	แจ้ง Hotline 22kv ทำการเชื่อม DDE บริเวณตลาดนัดโค้งสถานีฯเข้าทั้ง 3 เฟส							
48	เมื่อ Hotline 22kv ทำการเชื่อม DDE บริเวณตลาดนัดโค้งสถานีฯเข้าเฟส แล้วเสร็จ							
49	NCS 70117	ปลด	สับ			EGAT	-	ใบมิด 115 เควี
50	NCS 70112	ปลด	สับ			EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
51	ย้ายโหลด NCA-70112 กลับจาก NCA-7012							
52	ตรวจสอบใบมิด 115kv รหัส NCABYS-01,02 อยู่สถานะ "สับ"							
53	NCA03YS-02	ปลด	สับ			NCA	-	ใบมิด 115 เควี
54	NCA03YS-03	ปลด	สับ			NCA	-	ใบมิด 115 เควี
55	NCA03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose			NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
56	NCABYB-01	สับ	ปลด			NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
57	ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน กลับจาก SAB05							
58	NCA09S-01	ปลด	สับ			NCA	-	Pot Head
59	NCA09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose			NCA	-	
60	NCA09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน			สพร.	SF6	แยกเข้า อบต.คลองใหม่
61	ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน กลับจาก NCA06							
62	NCA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing			นช.	R	คลองทางหลวง
63	NCA09S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน			นช.	SF6	หน้าวัดป่าท่ากระชับ
64	NCA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			NCA	-	
65	NCA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			NCA	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
66	NCA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			NCA		-	
67	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			NCA		-	
68	NCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			NCA		-	
69	NCA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal			นช.	SCADA	R	คลองทางหลวง
70	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			EGAT		-	
71	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			SAB		-	
***สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด***									

งานตีไปวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2567 พาดสายส่ง 115 KV หน้าสถานี NCA

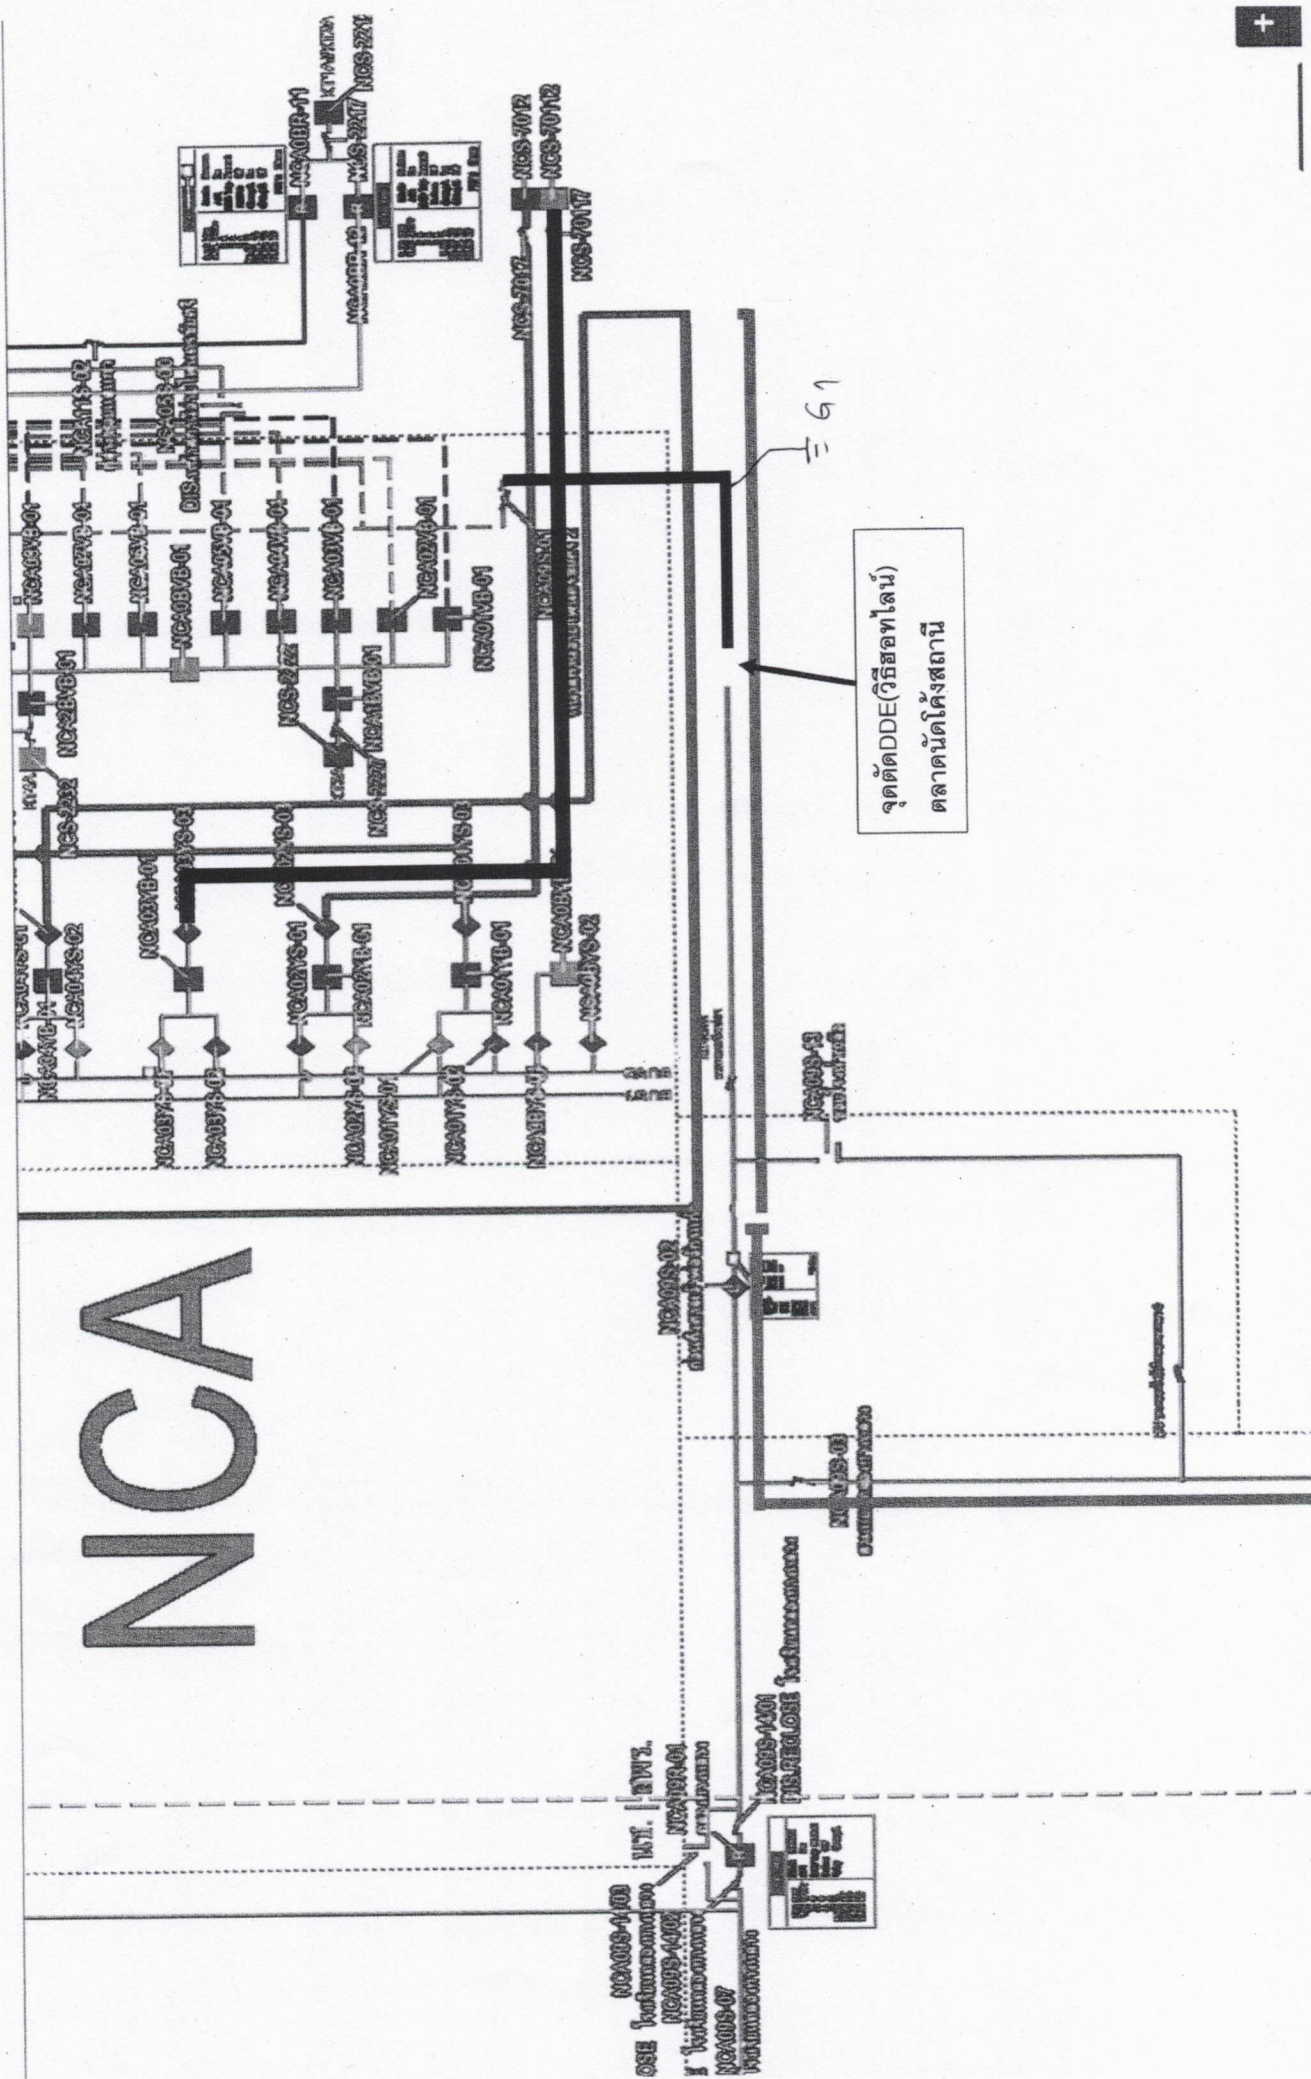

งานตีไปไฟวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2567 พาดสายส่ง 115 KV หน้าสถานี NCA(ก่อนทำ)

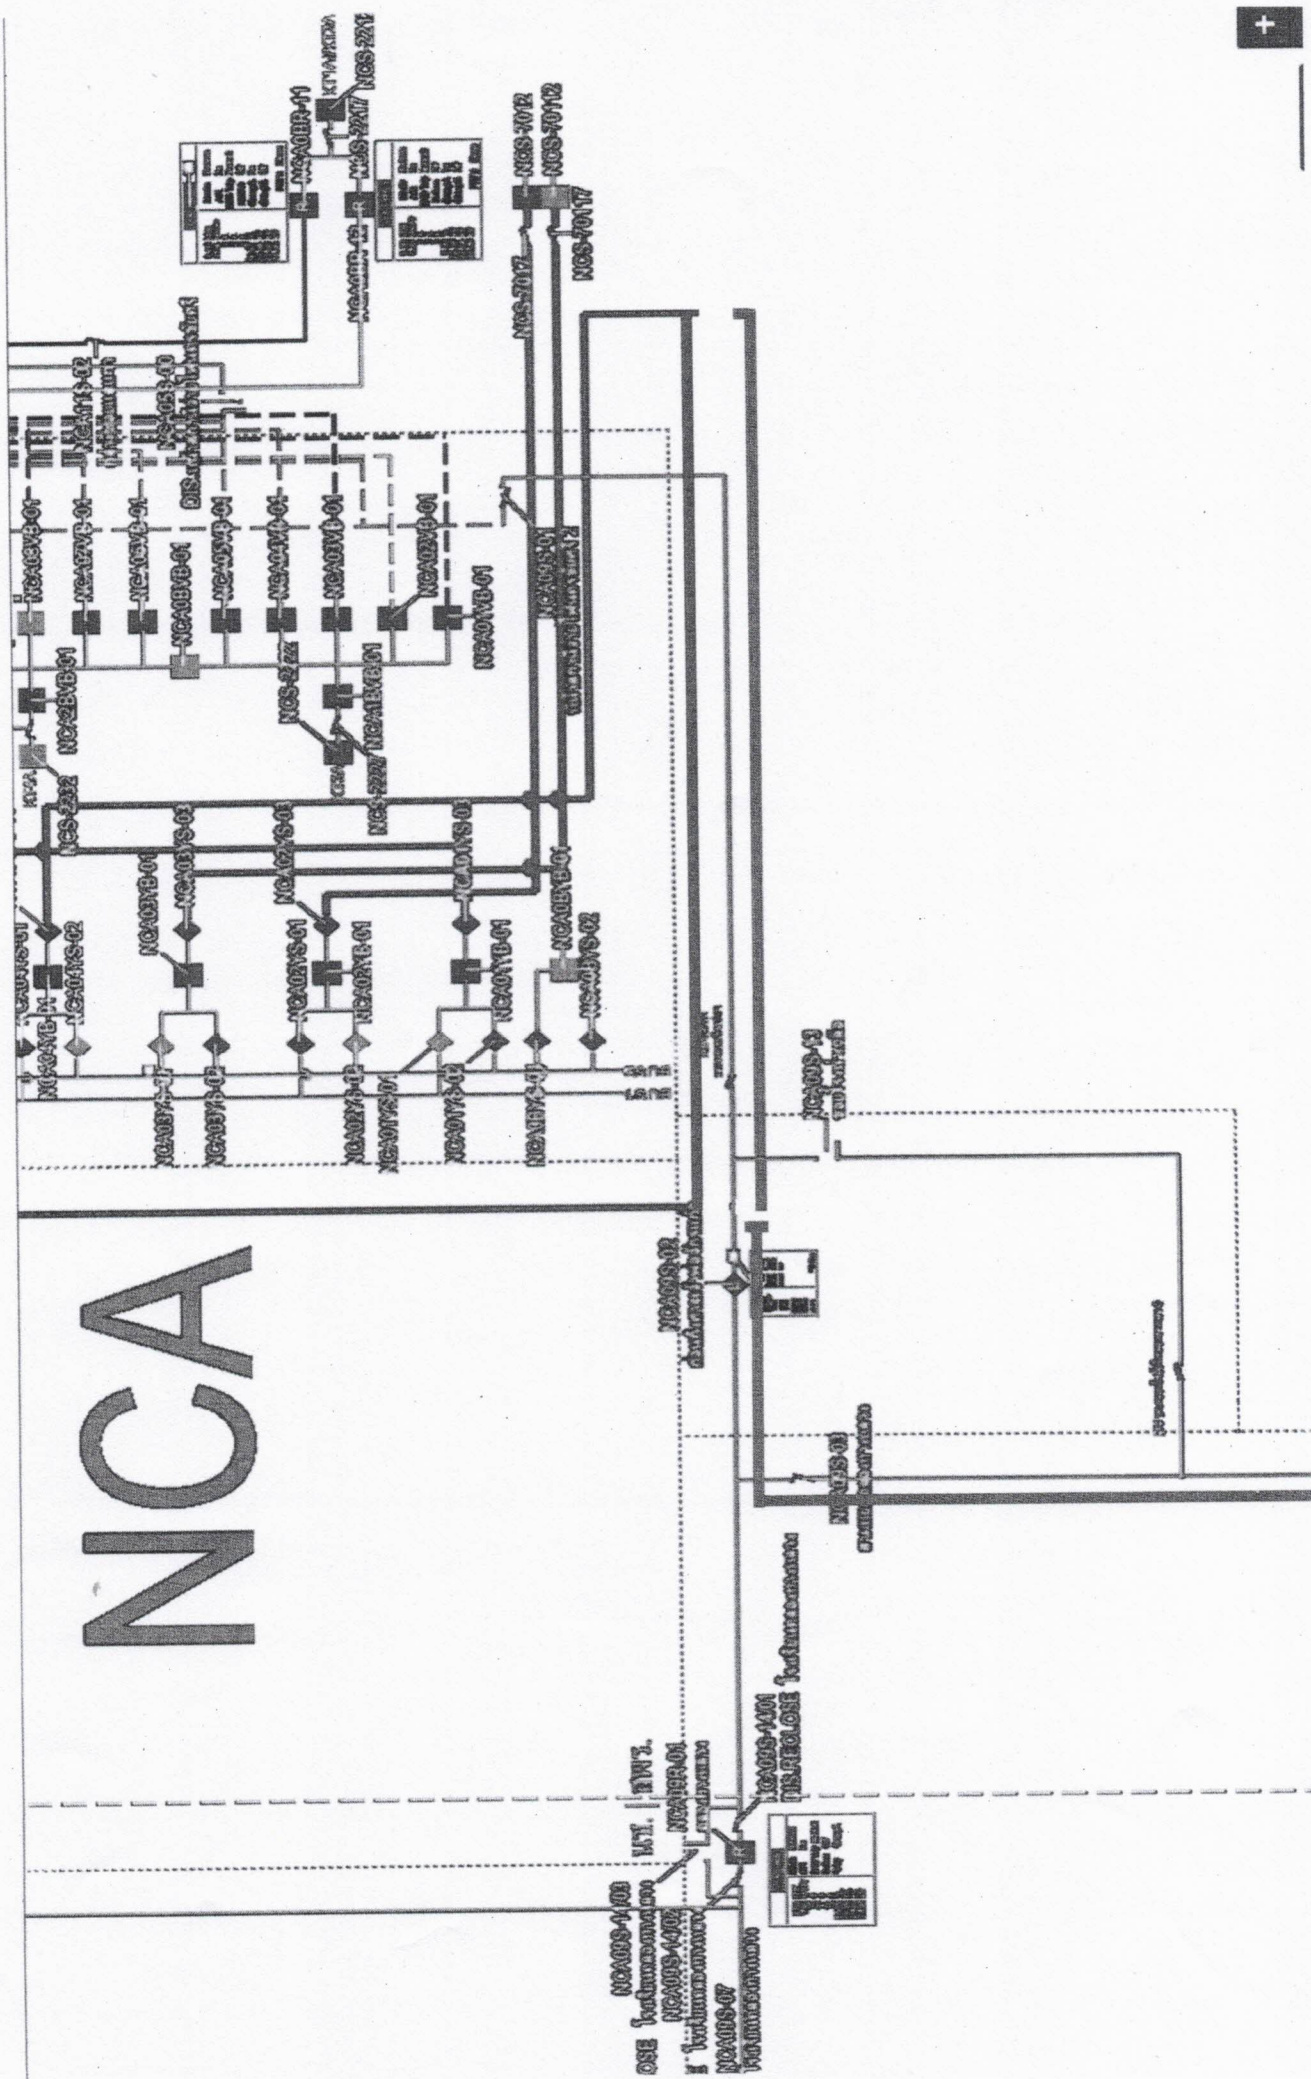

งานตีไปไฟวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2567 พาดสายส่ง 115 KV หน้าสถานี NCA(หลังท่า)

