



RR ภาวไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พทท. ๑๐๓ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน


ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๓-๕ ก.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาขนาด ๑๒.๒๐ ม.	ดิสชั่วคราว ห้องแถววัด สระลงเรือ	ดิสชั่วคราวตรงข้าม 9R-01	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ช.ก.ป. โทร ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๕๓๗๐๔, long: ๙๙.๗๔๖๗๒๒
๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๔๐๘๓๗๕, long: ๙๙.๗๒๘๘๗๔

ลงชื่อ 
(นายสุรวุฒิ บุญนาค)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG05 จาก Dis ชด. ช่องแถววัดสระลงเรือ ถึง Dis ชด. ตรงข้าม R สระลงเรือ
ในวันที่ 3-5 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1270/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศภัทร โนธิพิชญ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก. กฟส. ช.ก. , กฟส. ล.จ.
อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล)
อ.ก.๕ กก.ช. น.ค.ฟ.
ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

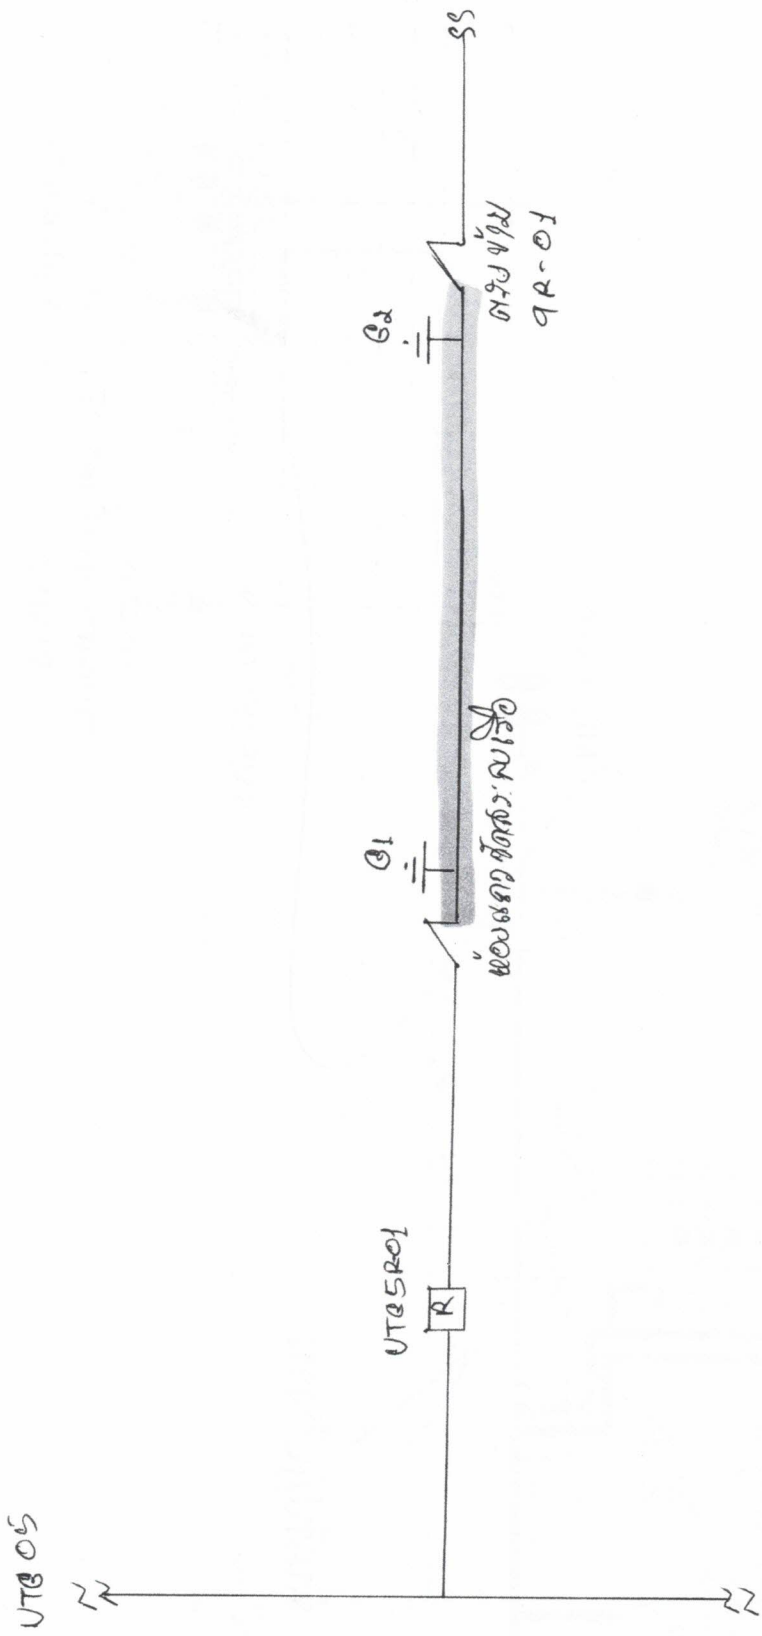
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านตลิ่งเหนือ (UTG05)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3-5 ก.ย. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ปักเสาขนาด 12.20 ม.		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1270/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	1 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง ****ย้ายไปเข้า-เย็นกลับ****						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
4	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing		ทกจ.		R. สระลงเรือ
5	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.	SCADA	R. บ้านตลิ่งเหนือ
6	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG09						
7	UTGBVB-01	ปลด	ล๊ับ		UTG		ขนานบัส
8	UTG05S-13	ปลด	ล๊ับ		ลข.		DIS หน้าร้านจรงรุ่งเรื่องวัสดุก่อสร้าง
9	Dis ชั่วคราวไลน์ UTG05	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS ตรงข้าม Recloser UTG09R-01
10	UTGBVB-01	ล๊ับ	ปลด		UTG		ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
12	Dis ชั่วคราวไลน์ UTG05	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ.		DIS ห้องแถววัดสระลงเรือ
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พทน รับทราบ						
14	แจ้ง กฟส.พทน ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
15	แจ้ง กฟส.พทน ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
16	เมื่อ กฟส.พทน ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
17	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
18	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
19	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
20	UTG05R-01	Nonreclosing	Normal		ทกจ.		R. สระลงเรือ
21	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทกจ.	SCADA	R. บ้านตลิ่งเหนือ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
23	แจ้ง กฟส.พทน. ปลด Short Ground จุด G1						
24	แจ้ง กฟส.พทน. ปลด Short Ground จุด G2						
25	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
26	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
28	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing		ทกจ.		R. สระลงเร็ว
29	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.	SCADA	R. บ้านตลุงเหนือ
30	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
31	Dis ชั่วคราวไลน์ UTG05	ปลด	สับ		ทกจ.		DIS ห้องแถววัดสระลงเร็ว
32	ย้ายโหลด UTG05 กลับจาก UTG09						
33	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		ขนานบัส
34	Dis ชั่วคราวไลน์ UTG05	ปลด	สับ		ลข.		DIS ตรงข้าม Recloser UTG09R-01
35	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS หน้าร้านจรงรุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง
36	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		ขนานบัส
37	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
38	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
39	UTG05R-01	Nonreclosing	Normal		ทกจ.		R. สระลงเร็ว
40	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทกจ.	SCADA	R. บ้านตลุงเหนือ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แบบสวิตช์อัตโนมัติ



0.00
