



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

13 ก.ย. 67

เลขที่ ก.ต.กฟส. (ปบ) ๒๑๐๖ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณธิด
ชื่อผู้ส่ง นางบุปผา แสนม่อง

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ชจก.(ล) รักษาการแทน ผจก.กฟส.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้าสาขา...กำแพงแสน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า ทามะภาค
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMU04	18 ก.ย. 67	08.30 น.	16.30 น.	พาดสายแรงสูง 185 ตร.มม. จำนวน 2.1 วงจร-กม.	Dis ชั่วคราว ก่อนถึงวัดไร่ แดงทอง	Dis ชั่วคราว โรงงานกันชน	นายวรรต ปลื้มมีชัย พชง.7.ผกส

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ต.ทุ่งลูกนก ต.หนองกระทุ่ม.

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเสกรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๑-๕๔๒๕๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ตัดไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๙๘๗๗๘๙ Long ๙๙.๘๕๗๗๘๘
๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๙๘๗๗๘๙ Long ๙๙.๘๕๗๗๘๘

(นางบุปผา แสนม่อง)
ตำแหน่ง ชจก.(ล) รักษาการแทน
ผจก.กฟส.กำแพงแสน
- ๒ ก.ย. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ TMU04 จาก Dis.สถานีวัดไร่แดงทอง Dis.จ. โรงงานกันชน
ในวันที่ 18 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1275/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อภิสิทธิ์ เก่งทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอภิสิทธิ์ จิตติขานนท์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. กฟส.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายอภิสิทธิ์ เก่งทอง)
ตำแหน่ง วิศวกร



ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	ต.หนองกระทุ่ม (TMU04)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพส. กพส.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1275/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง		วันที่ 8 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภักท, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	TMU05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		กพส.	SCADA	R หนองกระทุ่ม
3	TMU05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		กพส.	SCADA	R หนองจิก
18	ย้ายโหลด TMU04 (หนองกระทุ่ม) บางส่วนไปจ่ายจาก TMU04 (หนองจิก)						
20	TMU04S-15	ปลด	สับ		กพส.		DIS บ้านทุ่งกระถิน
19	DIS ชั่วคราว (TMU04)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS โรงงานกันชน
16	เมื่อพร้อมดับไฟ						
17	DIS ชั่วคราว (TMU04)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ก่อนถึงวัดไร่แดงทอง
4	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
5	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
6	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
7	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
8	TMU05R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		กพส.	SCADA	R หนองกระทุ่ม
9	TMU05R-02	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		กพส.	SCADA	R หนองจิก
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
10	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
13	หลังจากทำการปลด Short ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
14	TMU05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		กพส.	SCADA	R หนองกระทุ่ม
15	TMU05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		กพส.	SCADA	R หนองจิก
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	DIS ชั่วคราว (TMU04)	ปลด	สับ		กพส.		DIS ก่อนถึงวัดไร่แดงทอง
18	ย้ายโหลด TMU04 (หนองกระทุ่ม) บางส่วนไปกลับจาก TMU04 (หนองจิก)						
19	DIS ชั่วคราว (TMU04)	ปลด	สับ		กพส.		DIS โรงงานกันชน
20	TMU04S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS บ้านทุ่งกระถิน
21	TMU05R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		กพส.	SCADA	R หนองกระทุ่ม
22	TMU05R-02	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		กพส.	SCADA	R หนองจิก
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

สถานการณจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

18 กันยายน 2567

- จุดที่ปฏิบัติงาน
- พื้นที่ดับไฟ
- จุด Shot Ground

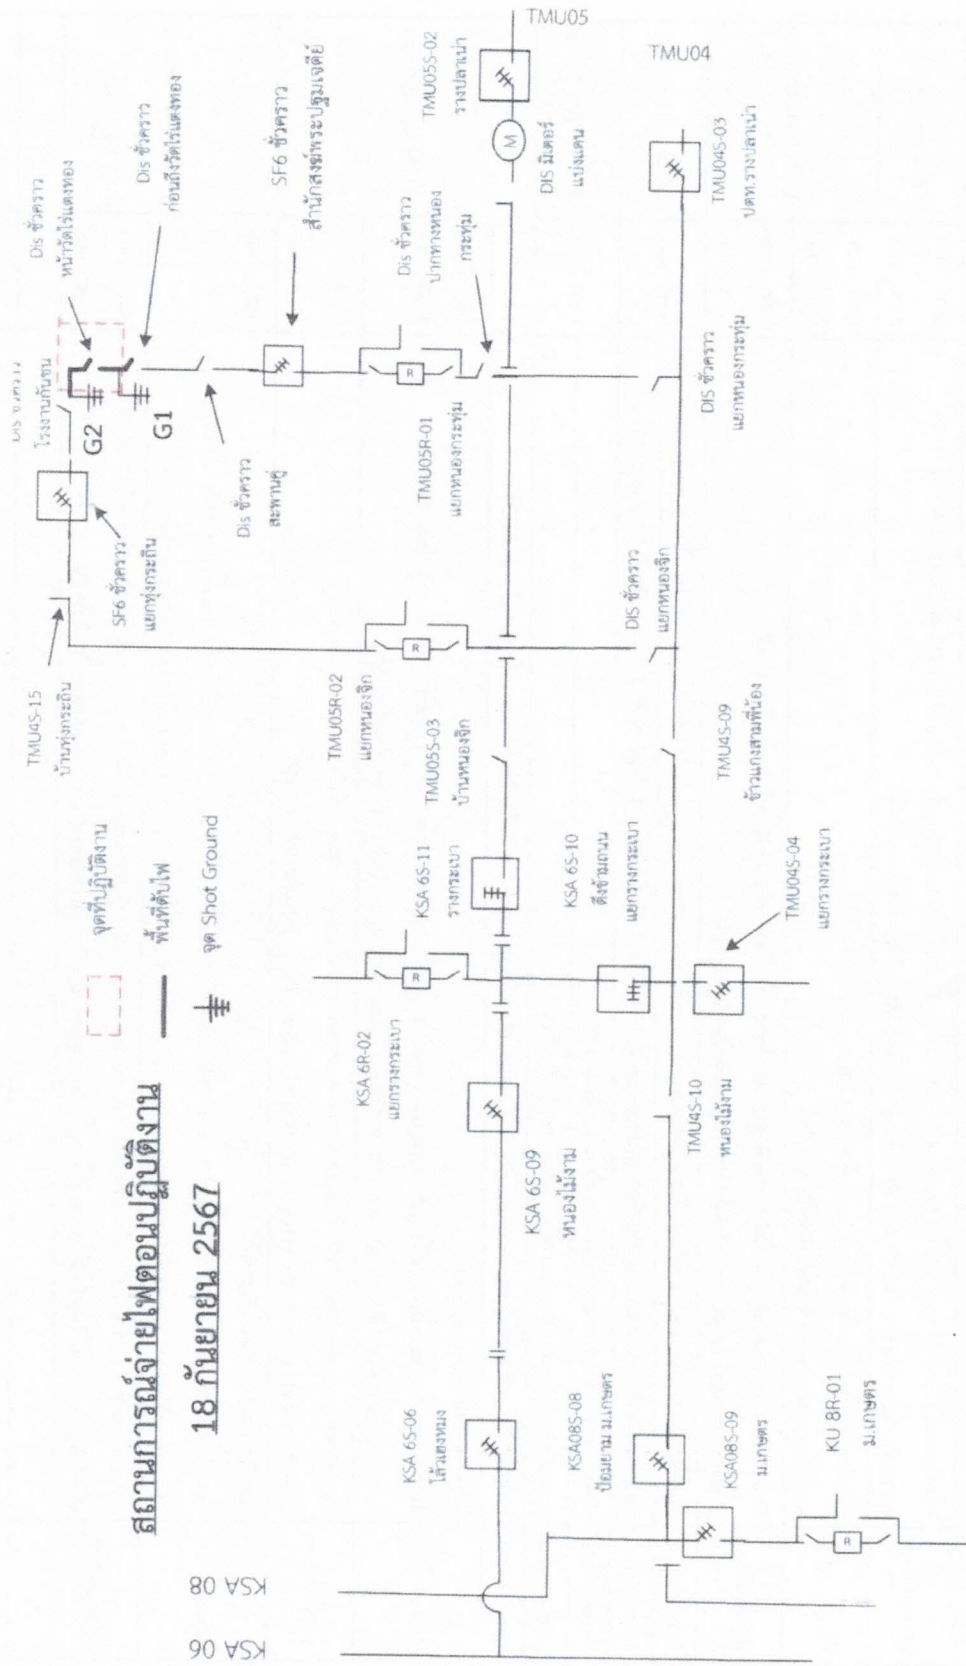

ไปกำแพงแสน

ไปพนมทวน
