



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สค.(ปน) ๕๐๐๖ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

7 ก.ย. 67

วันที่ - ๒ ก.ย. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง ออ.ปน.(ก๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย, ๑๑๕ KV รองรับการจ่ายไฟให้กับ บริษัทพีริเซิร์ฟ บริเวณปากทางกะเบือถึง ถึง บริษัท พีริเซิร์ฟ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMC๐๗	๘ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๑๑๕ KV รองรับการจ่ายไฟให้กับ บริษัทพีริเซิร์ฟ บริเวณ ปากทางกะเบือถึง บริษัท พีริเซิร์ฟ	SMC๐๗S-๐๔	SMC๐๗S-๐๕ ปากทาง ประตูน้ำคอก กะเบือ	นายวันชัย ทรัพย์ มาก โทร. ๐๙๘๑๔๖๔๕๕๖
๒	SMC๐๗	๘ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMC๐๗S-๐๔	EKA๐๘S-๐๔ ปากทาง ประตูน้ำคอก กะเบือ	
๓	SMC๐๗	๘ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMC๐๗S-๐๔	ปลายสาย	
๔	SMC๐๗	๘ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดปลัดสายโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้าปาก ทางเข้าพีริเซิร์ฟ	EKA๐๘S-๑๑ กลางซอยพีริ เซิร์ฟ	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณตั้งแต่ปากทางกะเบือถึงซอยพีริเซิร์ฟ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พง.๒ โทร ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศพ.) กพท.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ศพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMC07 จาก SMC075-04 ถึง SMC075-05
ในวันที่ 4 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1281/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SMC07 จาก SMC075-04 ถึง EKA 095-09
ในวันที่ 4 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ SMC07 จาก SMC075-04 ถึง 2745514
ในวันที่ 4 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ SMC07 จาก DPE 2745514 ถึง EKA 095-09
ในวันที่ 4 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิรัช ภัทรามิ ประธานงานการขอดับไฟกับ นายจิรวัฒน์ ขุนพร้อม
3 ก.ย. 67

(นาย จิรวัฒน์ ภัทรามิ)
อสค.5 แทน ชม.ศพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(ศพ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ๓๐

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ศพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นาย เลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | ปากทางเบื้องลิลา ถึง บริษัท พรีเซิร์ฟ | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 8 ก.ย. 67 | ระหว่าง | 08.00 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟจ.สค. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1281/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวิรัช เสมามิ่ง | | วันที่ 3 กันยายน 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | วันที่ 3 กันยายน 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 3 กันยายน 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายพรภัทร,สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		
4	EKB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		CB LOAD 1.8 MW
5	SMCBR-07	Normal	Nonreclosing		SMC		CB LOAD 6.5 MW
6	ย้ายโหลด SMC07 ไปรับไฟจาก EKB06						
7	EKB06S-12	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สค.		SF6 บ.ตั้งสุขไพศาล
8	SMC07S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.	Scada	SF6 ปากทางประตูน้ำคอกกะบือ
9	เมื่อพร้อมดับ						
10	SMC07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ปากซอยกระเบื้องลิลา
11	SMC07S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ปาก ซอย บ.พรีเซิร์ฟ
12	แจ้ง HOTLINE ตัด DDE ปากซอยบ.พรีเซิร์ฟ ออกจากกันทั้ง 3 เฟส (ไม่มีโหลด)						
13	เมื่อ HOTLINE ตัด DDE ปากซอยบ.พรีเซิร์ฟ ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
14	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
20	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
21	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
22	EKB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		
23	EKB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		CB
24	SMCBR-07	Nonreclosing	Normal		SMC		CB
สิ้นสุด Switching แรก							
25	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4						
30	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
31	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		
32	EKB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		CB
33	SMCBR-07	Normal	Nonreclosing		SMC		CB
34	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
35	แจ้ง HOTLINE เชื่อม DDE ปากซอยบ.พรีเซิร์ฟ เข้าทั้ง 3 เฟส						
36	เมื่อ HOTLINE เชื่อม DDE ปากซอยบ.พรีเซิร์ฟเข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
37	SMC07S-04	ปลด	สับ		สค.		DIS ปากซอยกระเบื้องสีลา
38	SMC07S-06	ปลด	สับ		สค.		DIS ปาก ซอย บ.พรีเซิร์ฟ
39	ย้ายโหลด SMC07 ไปรับไฟจาก EKB06						
40	SMC07S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ปากทางประตูน้ำคอกกะบือ
41	EKB06S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 บ.ตั้งสุขไพศาล
42	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
43	EKB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		
44	EKB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		CB
45	SMCBR-07	Nonreclosing	Normal		SMC		CB
สิ้นสุด Switching							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

SMC7S-04
กระเบื้องลีลา

ปากทางประตู
ระบายน้ำ
คอกกระบือ
SMC7S-05

ติดตั้งใหม่

แนวถนน

ช.พีริเชิร์ฟ


SMC07S-06
ปากทางพีริเชิร์ฟ

EKA08S-11
กลางช.พีริเชิร์ฟ

EKA08S-10
ท้ายช.พีริเชิร์ฟ

แนวถนน

EKB6S-12
บ.ตั้งสุขไพศาล

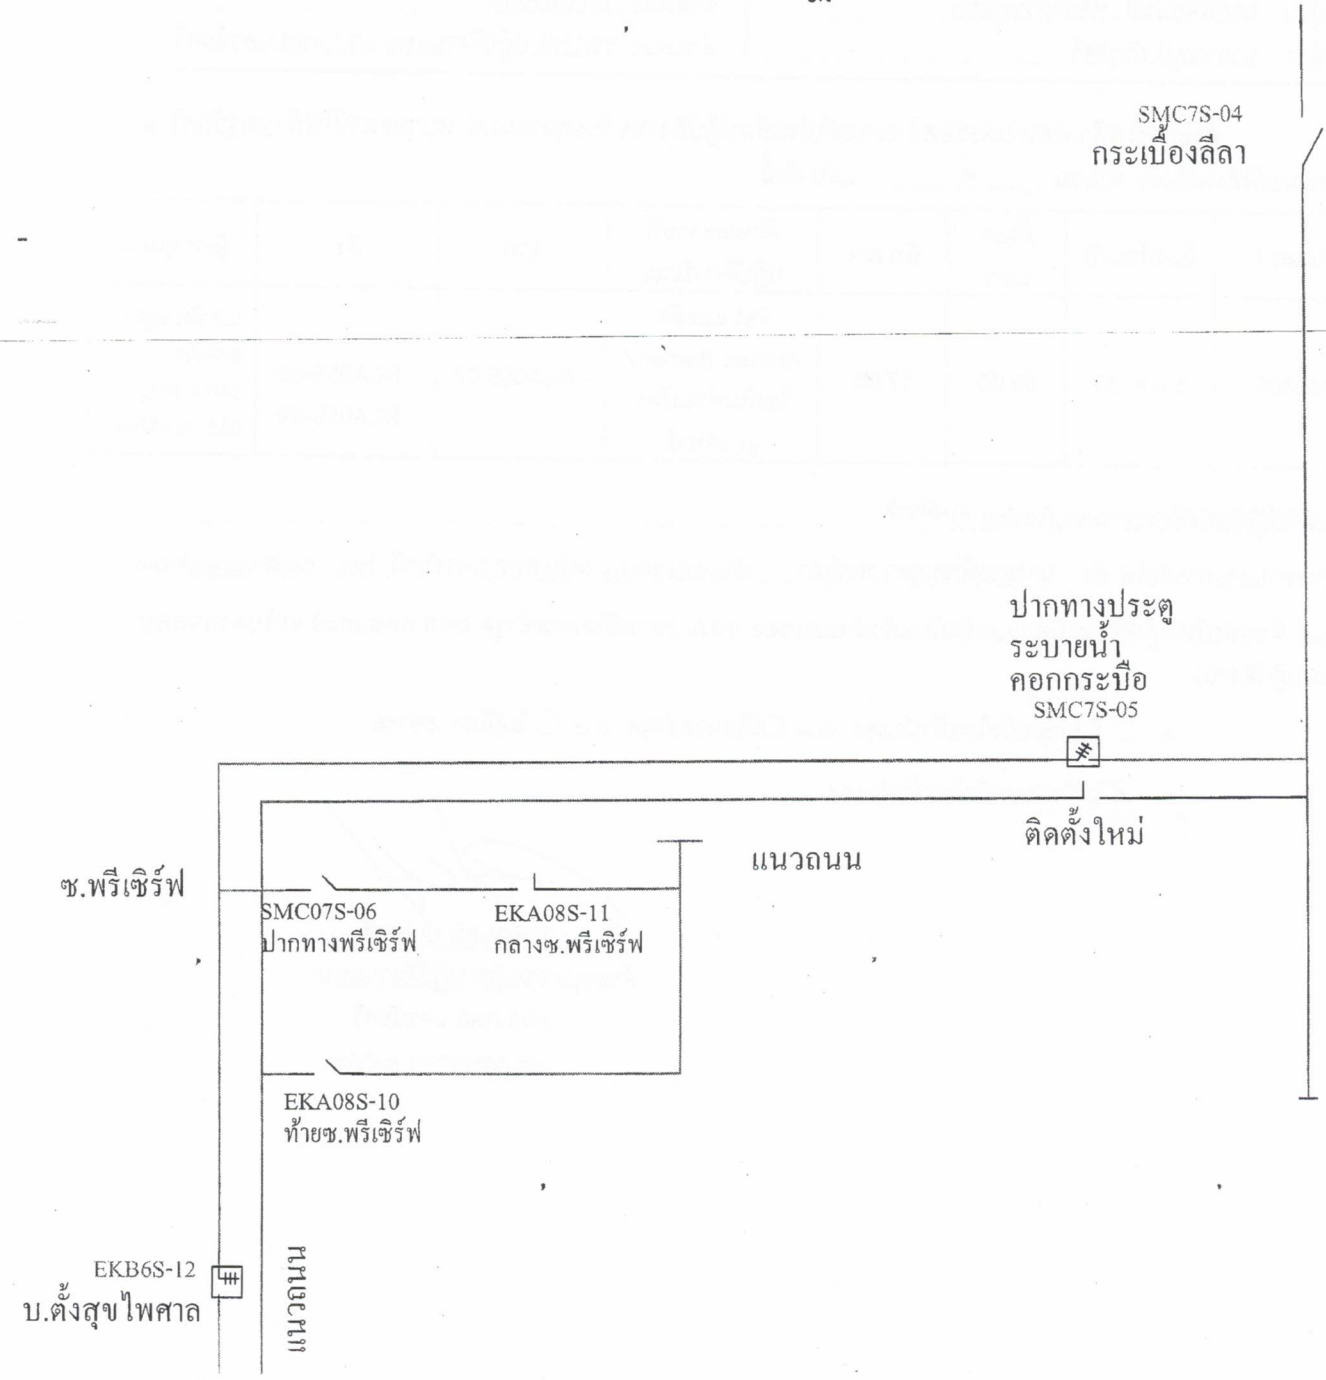

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

