

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ..... /๒๕๖๓  
 ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์ทอง  
 ชื่อผู้ส่ง นายชัชชัย เข็ชสุวรรณ

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
 ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปักเสา, รื้อถอนและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี๒ ตามแผนผัง  
 สั่งเขยแแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	8 สพ.	11/08/65	08.00	17.00	พาดสายแรงสูง บริเวณDis สะพานเสี้ยวเมืองวัดราชา	DDE จุดA	DDE จุดB	โทร.๐๘๕-๒๙๐๔๐๔๑ นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พงจ.จ.(สข.) โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายชัชชัย เข็ชสุวรรณ

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ I. พิดเคอร์ SPA08 จาก DDE จุด A ถึง DDE จุด B

ในวันที่ 11.๐๘.๖5 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1283/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย (นาย) ชัยชนะ อิศวรรค์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย ชัยชนะ อิศวรรค์

(นาย) ชัยชนะ อิศวรรค์  
 ๐๘๐-๖๓๖๖๖๖

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น  
 แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)

เรียน ผจก. นก.๐๖, นก.๐๗

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย



พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย) เลอพงศ์ แก่นจันทร์

รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

OPPO A9 2020 - ©Komymk2

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ Dis สะพานเลี้ยวเมืองวัดราชาฯ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1283/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์	วันที่ 3 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>							
1	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
2	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
3	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
4	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
5	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
6	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
7	<b>ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BAM02</b>						
8	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
9	BAM01S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
10	DIS ชค. โล้น SPA08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS สะพานเลี้ยวเมืองวัดราชาฯ
11	BAM01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
12	<b>เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.</b>						
13	<b>แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการไลน์โหลดตรงบริเวณจุดที่ทำงานได้</b>						
14	<b>เมื่อ กฟจ.สพ. ทำการไลน์โหลดตรงบริเวณจุดที่ทำงานแล้วเสร็จ</b>						
15	<b>แจ้ง HL ทำการตัด DDE จุด A,B ได้</b>						
16	<b>เมื่อ HL ทำการตัด DDE จุด A,B แล้วเสร็จ</b>						
17	<b>แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1</b>						
18	<b>แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2</b>						
19	<b>แจ้งชุด กฟจ.สพ. ทำการเทสไฟก่อนปฏิบัติงาน</b>						
20	<b>หลังจากชุด กฟจ.สพ. ดำเนินการเทสไฟแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย</b>						
21	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
22	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
23	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
24	BAM-TP1	"OFF" Auto Reclose	"OLTC" Auto		BAM		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
26	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
27	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กฟจ.สพ.รับทราบและปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
28	เมื่อ กฟจ.สพ.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
29	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
30	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
31	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
32	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
33	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
34	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
35	แจ้งหน่วยงานทำการปลดข้อตกราวด์ จุด G1						
36	แจ้งหน่วยงานทำการปลดข้อตกราวด์ จุด G2						
37	แจ้ง HL ทำการเชื่อม DDE จุด A,B ได้						
38	เมื่อ HL ทำการเชื่อม DDE จุด A,B แล้วเสร็จ						
39	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนกลับจาก BAM02						
40	BAM01S-12	ปลด, ล็อคคาน	ล๊اب		บปม.	SF6	SM การ์เด็นท์
41	DIS ชค. โลจน์ SPA08	ปลด	ล๊اب		สพ.	DIS	สะพานเสียงเมืองวัดราชภูร่า
42	BAM01S-12	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		บปม.	SF6	SM การ์เด็นท์
43	BAM02S-12	ล๊اب	ปลด		บปม.	SCADA SF6	วัดมะนาว
44	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
45	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
46	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
47	BAM-TP1	"OFF" Auto Reclose	"OLTC" Auto		BAM		-
48	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
49	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ...๒๕๖๕... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงาน

ดับไฟฟ้าบริเวณ DDEจุดA - DDEจุดB...เพื่อ...พาดสายระบบจำหน่ายแรงสูง๒๒เควี สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดพิคเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้


พิคเตอร์ ..๙.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณDDEจุดA - DDEจุดB

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร ตำแหน่ง ชุดก่อสร้างเขต เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

...๐๘๕-๒๙๐๔๐๔๑..เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายพิบูล ปานข้า ..ตำแหน่ง ผบ.ปบ.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

..๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

**แผนผังเชิงกลไก(หลังจ่ายไฟ)**

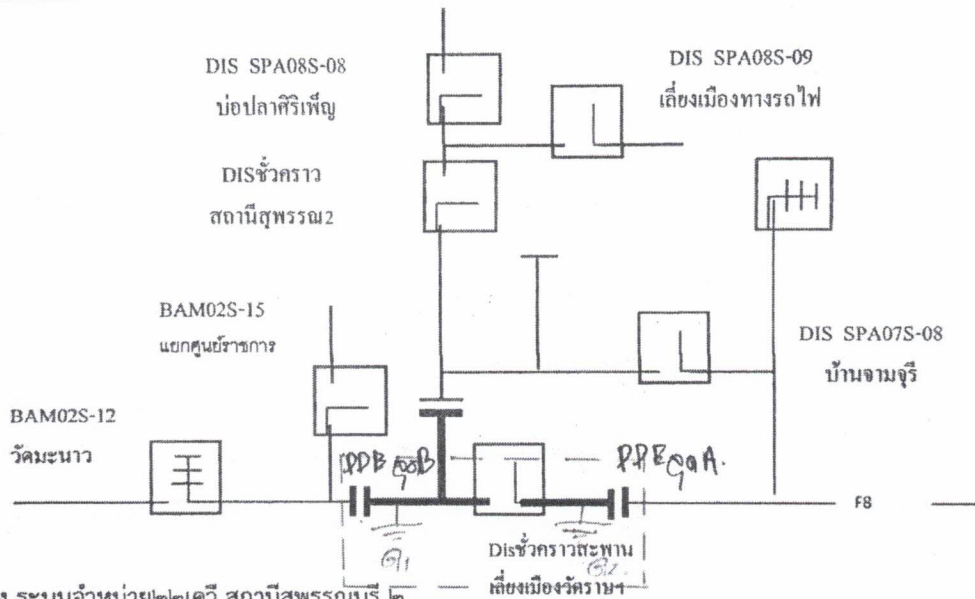

ดับไฟเพื่อปักเสาแรงสูง ระบบจำหน่าย๒๒เควี สถานีสุพรรณบุรี ๒

๑. ย้ายโหนดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
๒. ปลดโหนดจุด ให้ Hot Line สพ.ปฏิบัติงานด้วยการตัดจุดAและจุดB
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อตรกราวจุด๑และจุด๒ แจ้งชุดก่อสร้างเขตปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

( นายธนากร สุวรรณประทีป )

พง.๖(สข.) ผบ.ปบ.กฟจ.สพ.

( นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ )

รจก.(ท.)กฟจ.สพ.
