



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปน.) ๑๗๖๕ / ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายอดิศร แก้วสินธุ์

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย ขอบต.ไพร่ระบบ ๒๒ เควี เพื่อย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง ภายในซอยกระทู้มล้ม ๙ (ซอยโพลีกลาส) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY07 (บน)	๑๐ ต.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐น.	ขอตัดไฟเพื่อย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงภายในภายในซอยกระทู้มล้ม ๙ (ซอยโพลีกลาส)	SLY07S-05	SLY07S-06 DIS ชั่วคราว ก่อนขอยหลัง วัดนครฯ (วงจรถบน)	นายวรพจน์ แก่นสวาท ๐๙๔-๔๓๙-๒๒๖๑
๒.	PMB07 (กลาง)	๑๐ ต.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐น.		HL ตัด DDE ปากซอย ขอพักต้นเสา	SLY06S-08	
๓.	PMB07 (ล่าง)	๑๐ ต.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐น.		HL ตัด DDE ในช.โพลีกลาส (วงจรถล่าง) (ขอพักต้นเสา)	SLY07S-06	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ศูนย์HONDA..หอพักอวริยา.ผู้ใช้ไฟขอยหลัง.ม.นริชา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นางสาววิภา รมโพธิ์ทอง...ตำแหน่ง...วศก.๕.ผ.ปน...โทร...๐๙ ๓๓๕๙ ๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด


๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิศร แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.อมน.




## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ซอยโพลีกลาส สาย 4				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ต.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	ย้ายแนวระบอบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1288/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	5 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
3	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
4	SLY02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- L = 4.36 MW
5	SLY07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- L = 2.12 MW
6	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
7	<b>ย้ายโหลด SLY07 ไปจ่ายจาก SLY02</b>						
8	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY		- ขนานบัส
9	OYK03S-11	ปลด	สับ		อมน.		DIS ศาลาโตมร
10	DIS ชั่วคราว(SLY7)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS โพลีกลาสสาย 4 วงจรบน
11	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY		- ขนานบัส
12	<b>เมื่อหน้างานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน</b>						
13	SLY07S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ปากซอยโพลีกลาสสาย 4
15	<b>แจ้งกฟภ.อมน.ให้ตรวจสอบ SF6 SLY06S-08 และ SLY07S-06 (โพลีกลาส) ให้อยู่ในตำแหน่ง OPEN และให้ทำการล็อคคาน</b>						
16	<b>แจ้งให้ทำการไลน์โหลดตั้งแต่จุดตัด DDE ปากซอยต้นตาลวงจรกลางและล่าง ถึง SLY07S-06 และ SLY06S-08 ปากซอยโพลีกลาส</b>						
17	<b>แจ้งชุดฮอตไลน์กระเช้าทำการตัด DDE บริเวณก่อนขอยหอพักต้นตาล ทั้งวงจรกลางและวงจรถ่าง (ตามผังแนบ) ได้</b>						
18	<b>เมื่อชุดฮอตไลน์กระเช้าทำการตัด DDE บริเวณก่อนขอยหอพักต้นตาลทั้งวงจรกลางและวงจรถ่าง (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ</b>						
19	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับแก่ชุดทำงาน</b>						
20	<b>แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1</b>						
21	<b>แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2</b>						
22	<b>แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3</b>						
23	<b>แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4</b>						
24	<b>แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5</b>						
25	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
26	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
27	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
28	SLY07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
30	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟได้						
31	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
32	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
33	SLY02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
34	SLY07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
35	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
36	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
37	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
38	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
39	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4						
40	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G5						
41	แจ้งชุดฮอตไลน์กระเช้าทำการจัม DDE บริเวณก่อนชอยหอพักต้นตาล ทั้งวงจรกลางและวงจรถ่าง (ตามผังแนบ) ได้						
42	เมื่อชุดฮอตไลน์กระเช้าทำการจัม DDE บริเวณก่อนชอยหอพักต้นตาลทั้งวงจรกลางและวงจรถ่าง (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
43	SLY07S-05	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		อมน.		SF6 ปากชอยโพลีกลาสาย 4
44	ย้ายโพลด SLY07 ไปจ่ายจาก SLY02						
45	SLYBVB-01	ปลด	ล๊ับ		SLY		- ขนานบัส
46	DIS ชั่วคราว(SLY7)	ปลด	ล๊ับ		อมน.		DIS โพลีกลาสาย 4 วงจรบน
47	OYK03S-11	ล๊ับ	ปลด(ใช้โพลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ศาลาโอมร
48	SLYBVB-01	ล๊ับ	ปลด		SLY		- ขนานบัส
49	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
50	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
51	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
52	SLY07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
53	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

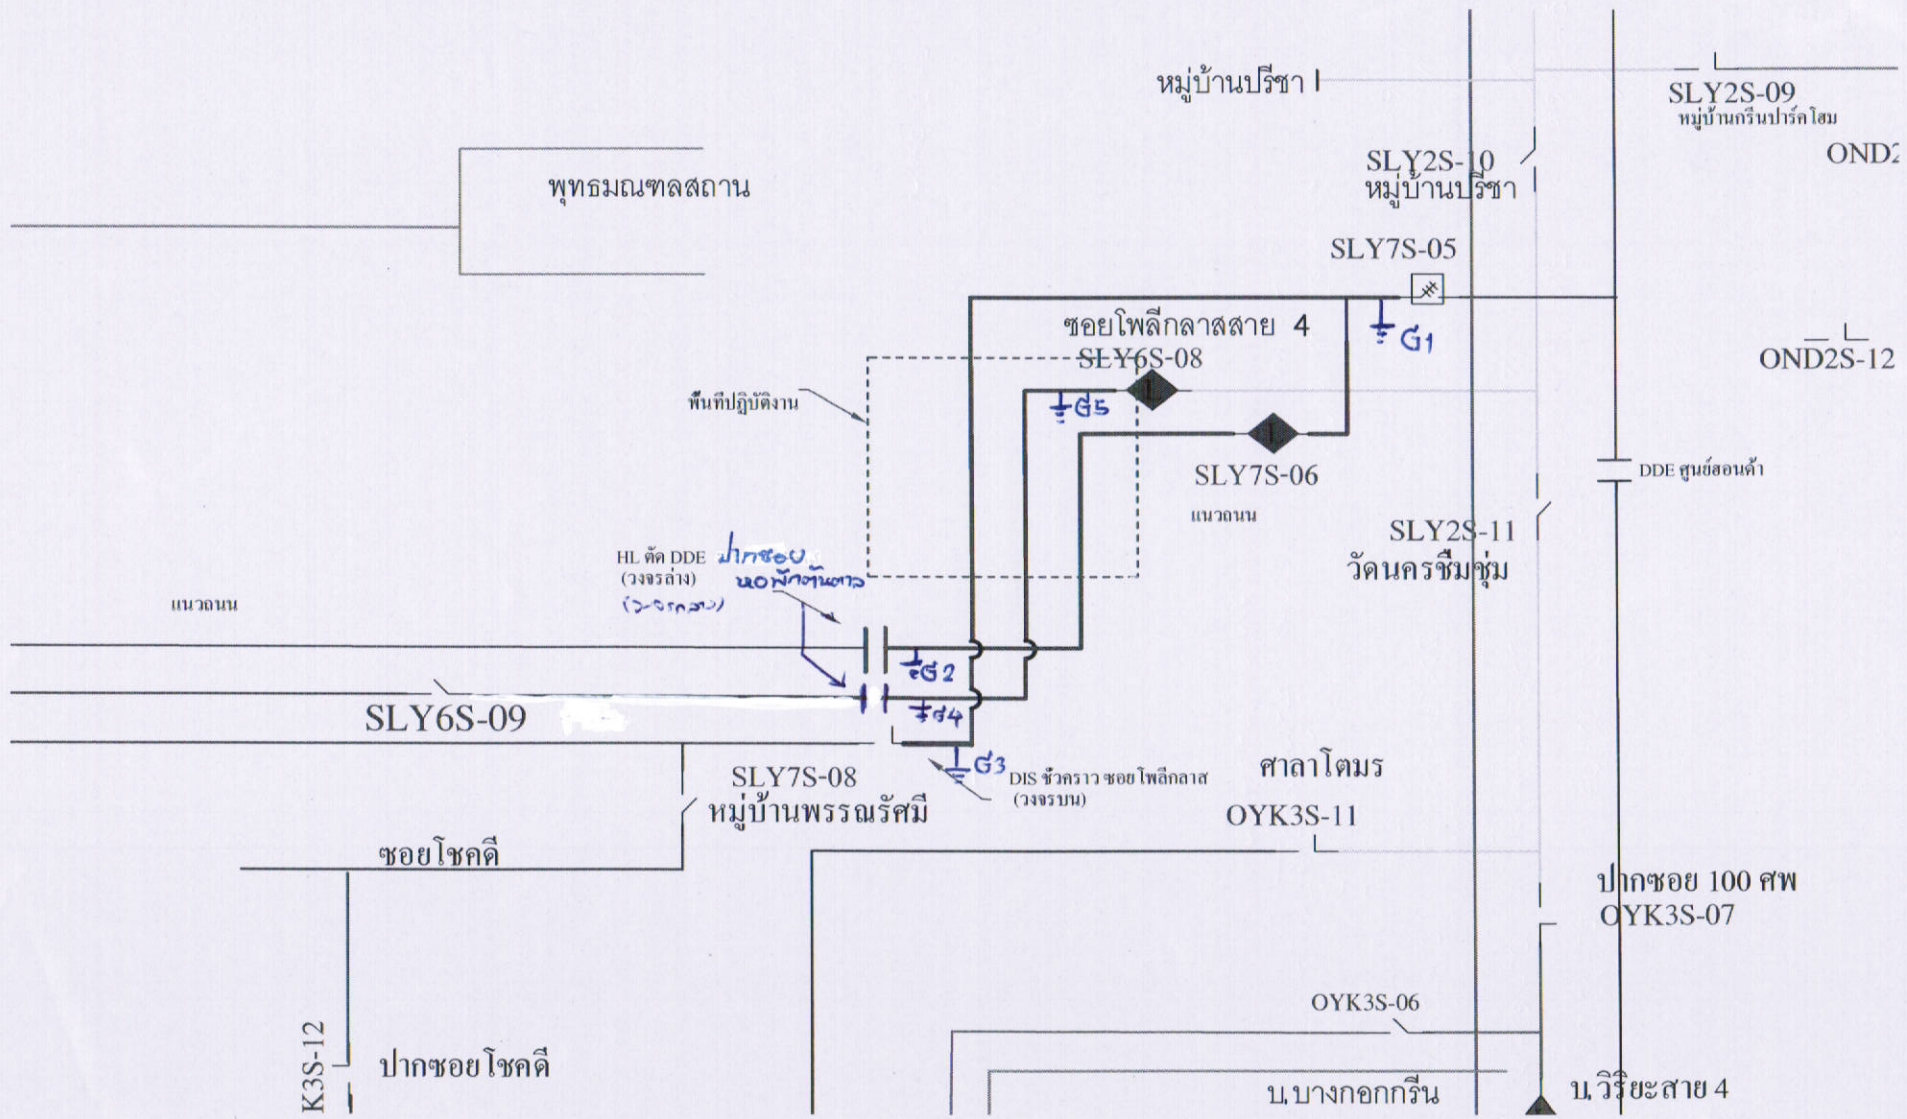

พุทธมณฑลสถาน

หมูบ้านปริชา I

SLY2S-09  
หมูบ้านกรีนปาร์คโฮม  
OND2

SLY2S-10  
หมูบ้านปริชา

SLY7S-05

ชอยไฟลิกลาสสาย 4  
SLY6S-08

OND2S-12

พื้นที่ปฏิบัติงาน

SLY7S-06  
แนวถนน

SLY2S-11  
วัดนครราชสีมา

HL ตัด DDE (วงจรล่าง)  
(วงจรบน)  
ปากชอย ๑๐ พิกัดดาว

แนวถนน

SLY6S-09

G2  
G4

SLY7S-08  
หมูบ้านพรณรัศมี

DIS ขั้วควรวา ชอยไฟลิกลาส (วงจรบน)

เสาโทรโมร  
OYK3S-11

DDE ศูนย์ฮอนต้า

ชอยโชคดี

ปากชอย 100 สฟ  
OYK3S-07

K3S-12

ปากชอยโชคดี

OYK3S-06

บ. บางกอกกรีน

บ. วิริยะสาย 4
