



# วิทย์ขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(บป) ๙๕๕ /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายนรินทร์ เข้มทอง  
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อก.บป.(ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอตัดบ่อนุมิตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อการปฏิบัติงาน แก้ไขสายแรงสูงพิด  
เคอร์ ๕ สถานีบ่อพลอย ๑ บริเวณบ้านหนองยายติ่ม ม.๑ ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ๑ ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/ เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	พิดเคอร์ ๕ สถานีบ่อ พลอย ๑	๖ ส.ค. ๖๕	๑๐.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	แก้ไขจุดตาม สายแรงสูง โดยชุดฮอท ไลน์กระเช้า	SF๖ Bop๑๕S- ๐๓ โค้งหัว เขา	DIS Bop๑๕S-๐๖ สี แยกบ้านช่องด่าน	นายพายุ กลีบทอง โทร.๐๘๖-๖๑๑๕๕๐๘

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทัตเทพ แปลงสงคราม ตำแหน่ง พชง.๖ โทร.๐๘๕-๒๕๓๑๕๖๔  
ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายพายุกลีบทอง ตำแหน่ง ชผ.บป. โทร.๐๘๖-๖๑๑๕๕๐๘

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบ  
ก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด (๑.๒) ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายนรินทร์ เข้มทอง)

ตำแหน่ง

ผจก.กฟอ.บ่อพลอย

๙ ส.ค. ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ 30105 จาก 30105-06 ถึง 30105-06  
ในวันที่ ๒๒.๑.๒๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 1290/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาดประสานงานขอดับไฟกับ ผคฟ.กฟภ.๓/ช.๒๕๖๕

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
๒๒.๑.๒๕๖๕

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓-๒๕๖๕

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)


ขั้นตอนทำสวิตชิ่ง ๒ แผ่น  
แผนผังแนบ ๒ แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ  
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น เป็นต้นไปจนกว่างาน  
จะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านหนองยายติ่ม				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ส.ค. 65	ระหว่าง	10.00 น.	ถึง	12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.บพล.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย BOP05	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1290/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด	วันที่		5 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่		5 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่		5 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 15.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
	<b>งานที่ทำ</b> แก้ไขจุดตามสายแรงสูง โดยชุดออกทไลน์กระเช้า						
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	BOP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
3	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
4	<b>- ย้ายโหลด BOP05 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก BOP04</b>						
5	BOP04S-19	ปลด	สับ		บพล.		DIS ตรงข้ามวัดลำเหย (ข้ามถนน)
6	BOP05S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS แยกช่องด้าน
7	ตรวจสอบ BOP05S-05 (SF6 สนามกอล์ฟกรังปรีส์) อยู่สถานะ <b>ปลด, ล็อคคาน</b>						
8	<b>- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 10.00 น.</b>						
9	BOP05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพล.	SCADA	SF6 บ้านหัวเขา (บน)
10	<b>แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ</b>						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
13	ขณะปฏิบัติงานตั้ง "OFF" Auto Reclose วงจร BOP10VB-01 ไว้ตลอดเวลาของการปฏิบัติงาน						
14	BOP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
15	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
16	<b>แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้</b>						
<b>*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***</b>							
17	<b>เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ</b>						
18	BOP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
19	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
20	<b>- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</b>						
21	BOP05S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพล.	SCADA	SF6 บ้านหัวเขา (บน)
22	<b>- ย้ายโหลด BOP05 บางส่วน กลับจาก BOP04</b>						
23	BOP05S-06	ปลด	สับ		บพล.		DIS แยกช่องด้าน
24	BOP04S-19	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS ตรงข้ามวัดลำเหย (ข้ามถนน)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	BOP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
26	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
27	BOP10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

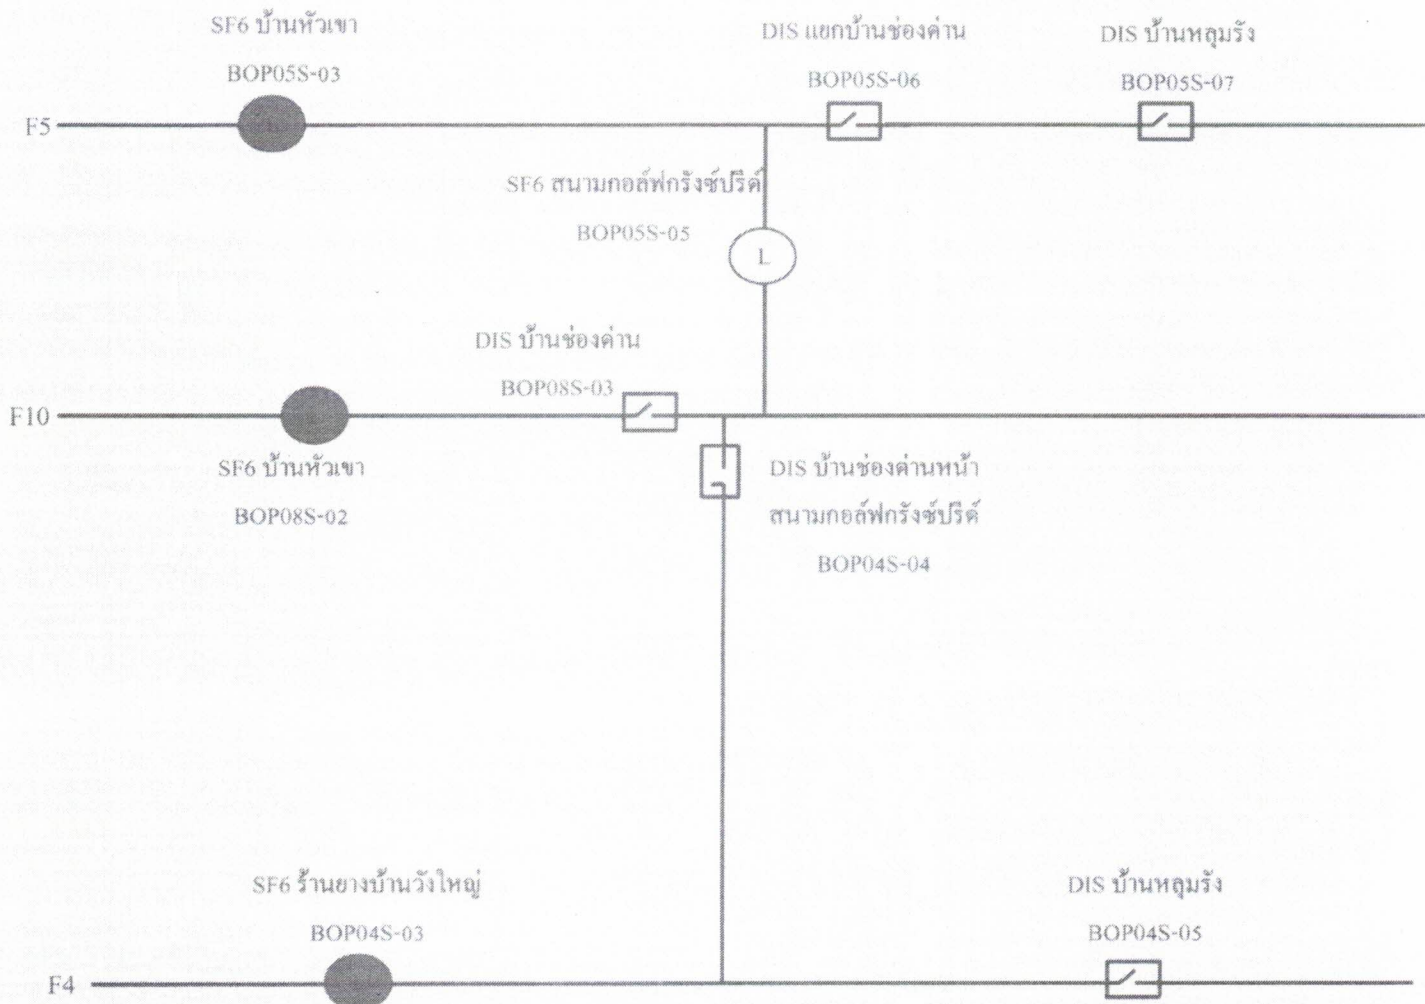

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

จุดปฏิบัติงานโดยชุดสอทไลน์กระเช้า

