



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

8 ต.ค. 64

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สพร.(ป.บ.) 03756
ชื่อผู้รับ นายสมบุญธรรม สิงโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายวิพุทธ ชาติวัฒนานนท์

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ย้ายแนวเสาแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ

จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAC๐๘	๑๓ ต.ค.๖๔	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ย้ายเสาแรงสูงติดตั้งขยายถนน แนวบรมราชชนนี และปากทาง สาย ๗	SAC๘S-๐๑	SAC๑S-๐๒ SAB 3S-15 SAE 8S-03	นายจักรกริช คุ้ม วงศ์ ๐๘๓-๕๒๕๗๗๕
๒	SAC๑๐					SAC๑๐S-๐๑	SAC๑S-๐๒, DIS ๕๑.๑๓๖๓๑ DIS ๕๑.๑๓๖๓๑ - CPAC	
3	SAB 03					DIS ๕๑.๑๓๖๓๑	SAB 3S-15	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ริมถนนบรมราชชนนีฝั่งไปนครปฐมช่วงปากซอยแสงโสมถึงปากทางสาย ๗

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณตรี ตำแหน่ง ข.บ.บ. โทร. ๐๘๘-๘๘๔๐๒๕๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายวิพุทธ ชาติวัฒนานนท์)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SAE 08 จาก SAE 8S-01 ถึง SAE 1S-0๒, SAB 3S-15, SAE 8S-03
ในวันที่ 13-10-64 ตั้งแต่เวลา 0800 น. ถึง 1700 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1290/64
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ พิดเตอร์ SAE 10 จาก SAE 10S-01 ถึง DIS ๕๑.๑๓๖๓๑ - CPAC
ในวันที่ 13-10-64 ตั้งแต่เวลา 0800 น. ถึง 1700 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ SAB 03 จาก DIS ๕๑.๑๓๖๓๑ - SAB 3S-15
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์สุว ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผ.อ.ก.บ.บ. สามพราน
5 ต.ค. 64

กมลพร วัฒนกิจ
(อ.ก.บ.บ. นพ.๑๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.ฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟอ. สามพราน

อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์..... ๒ แผ่น
แผนผังแนบ..... 1 แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผ.จก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง


วันที่ทำงาน	ริมถนนบรมราชชนนีฝั่งเข้านครปฐมช่วงปากซอยแสงโสมถึงปากทางสาย 7						
วันที่ทำงาน	13/10/2564	เวลา	08.00 น.	ถึง	13/10/2564	เวลา	17.00 น.
ชื่อทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาแรงสูง SAC 08,10		ตามใบขอปฏิบัติงาน		1290/2564
การสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	5 ตุลาคม 2564	
ขอสวิตชิงโดย					วันที่	5 ตุลาคม 2564	
ใ้สวิตชิงโดย					วันที่	5 ตุลาคม 2564	
สวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SAC,SAB,NCA							
1	ย้ายโหลด SAC08,10 บางส่วนไปรับไฟจาก NCA08						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
3	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
4	SAC08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
5	SAC10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
6	NCA08S-10	ปลด	ล๊ับ		สพร.		SF6 รอยัลแปซิฟิก (วงจรล่าง)
7	DIS.ชั่วคราว SAC10	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้านครยนต์
8	NCA08VB-01	ปลด	ล๊ับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
9	SAC08S-03	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 รอยัลแปซิฟิก (วงจรบน)
10	NCA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
11	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
12	ย้ายโหลด SAC10 บางส่วนไปรับไฟจาก SAB04						
13	SAB04VB-01	"On" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
14	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
15	SAB04S-08	ปลด	ล๊ับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามโรงงานบุญช่วย
16	SAC10VB-01	ล๊ับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
17	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
18	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
19	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
20	SAB03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
21	SAC08VB-01	ล๊ับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
22	SAC08S-01	ล๊ับ	ปลด		สพร.		DIS Pot Head SAC08
23	SAC10S-01	ล๊ับ	ปลด		สพร.		DIS Pot Head SMF04
24	DIS.ชั่วคราว SAC10	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้าบริษัท C.PAC
25	DIS.ชั่วคราว SAB03	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ข้างบริษัทวิเศษเทคโนโลยี
26	ตรวจสอบโหลดเบรกสวิตซ์ รหัส SAC06S-02 (SF6 โรงปูนท่าท่อ) แสดงสถานะ Off พร้อม Lock คาน						
27	ตรวจสอบโหลดเบรกสวิตซ์ รหัส SAC01S-02 (SF6 รัานไถย่าง) แสดงสถานะ Off พร้อม Lock คาน						
28	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1					สพร.	
29	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2					สพร.	
30	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3					สพร.	
31	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4					สพร.	
32	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G5					สพร.	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
33	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G6				สพร		
34	SAB03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
35	SAB04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
36	SAB03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
37	SAB04VB-01	"On" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
38	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				สพร		
39	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				สพร		
40	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3				สพร		
41	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G4				สพร		
42	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G5				สพร		
43	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G6				สพร		
44	SAC08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS Pot Head SAC08
45	SAC10S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS Pot Head SMF04
46	SAC08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศุนย์ฯ		
47	DIS.ชั่วคราว SAC10	ปลด	สับ		สพร		DIS หน้าบริษัท C.PAC
48	DIS.ชั่วคราว SAB03	ปลด	สับ		สพร		DIS ช่างบริษัทวิศวกรรมไทย
49	SAB03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
50	ย้ายโหลด SAC10 บางส่วนคืนจาก SAB04						
51	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุนย์ฯ		
52	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุนย์ฯ		
53	SAC10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศุนย์ฯ		
54	SAB04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้ามโรงงานบุญช่วย
55	SAB04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
56	SA2-KT1A	ปลด	สับ		ศุนย์ฯ		
57	ย้ายโหลด SAC08,10 บางส่วนคืนจาก NCA08						
58	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุนย์ฯ		
59	NCA08VB-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุนย์ฯ		
60	SAC08S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร		SF6 รอยัลแปซิฟิก (วงจรบน)
61	NCA08VB-01	สับ	ปลด		ศุนย์ฯ		
62	DIS.ชั่วคราว SAC10	ปลด	สับ		สพร		DIS หน้านครยนต์
63	NCA08S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร		SF6 รอยัลแปซิฟิก (วงจรล่าง)
64	SAC08VB-01	"Off" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
65	SCA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
66	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุนย์ฯ		
67	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching							

งานตีไฟวันพุธ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ แยกสาย ๗ ผูกถนนปิ่นเกล้า - นช

แยกคู่

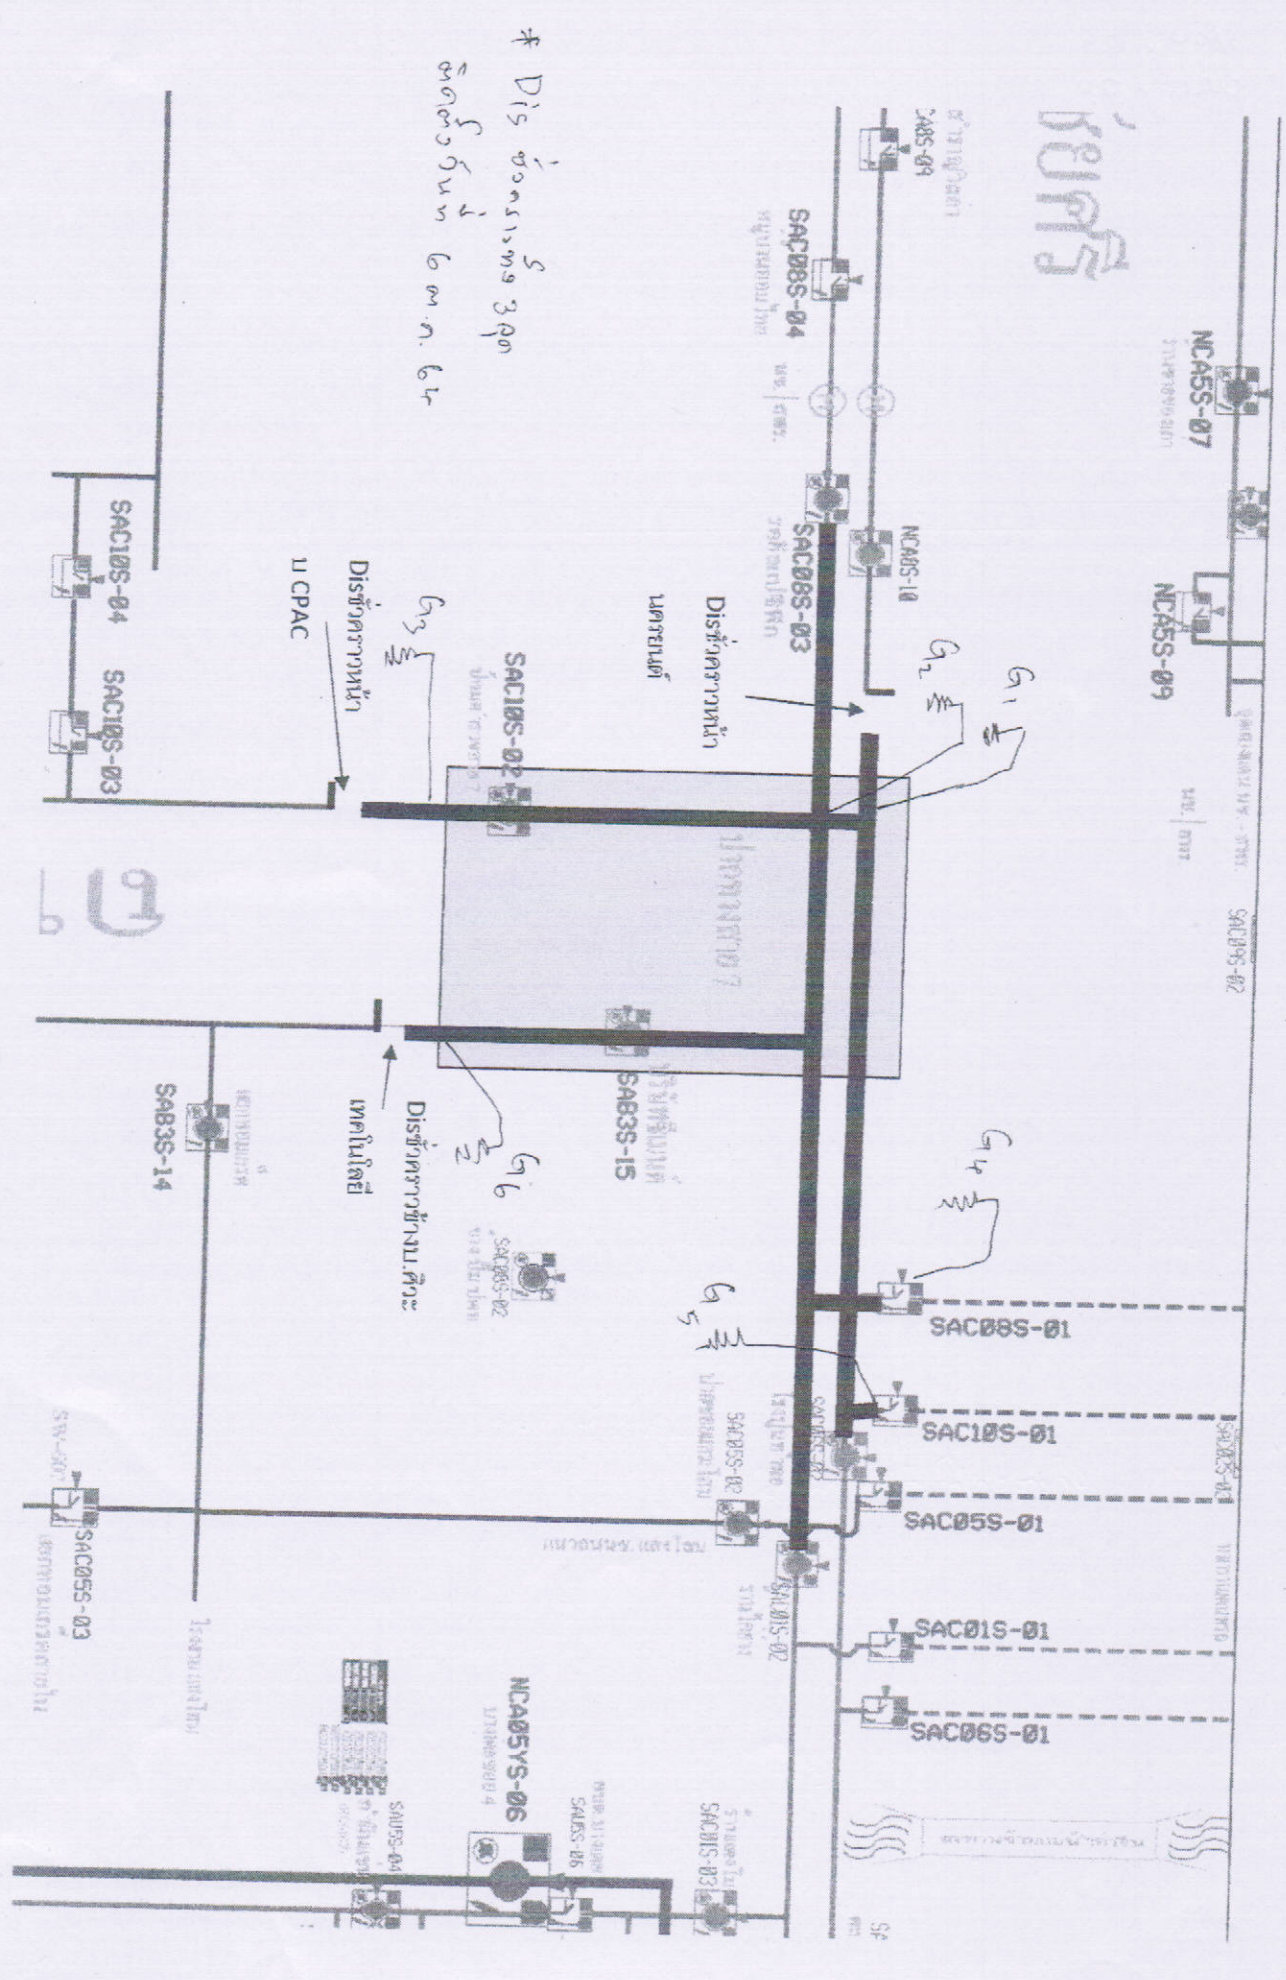

* Dis ต่อลงแรง 3 จุด
ตัดด้วย 6 m.m. & n

Dis ตัดทางหน้า
II CPAC

Dis ตัดทางขึ้นพิเศษ
เพคโมลิย

๓
