



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ลญ.(กป.)- ๕๐๕ /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมหมาย ชื่นด้วง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจรรพฤกษ์

Switching Deadline  
วันที่ 23 ส.ค. 65

ส่งทางสารบรรณเลขที่รอนกส  
ผู้รับ กษบ.(ก.๖)  
เลขทะเบียน 515  
วันที่ 8 ส.ค. 65 เวลา 14:56  
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ต.ลาดหญ้า

ด้วย.....กฟส.ต.ลาดหญ้า.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามแผนผังสั่งเซปแนบ จำนวน.....๓  
แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	<del>KCA๑๐R</del> KCC05	๒๖ ส.ค.๖๕ ๒ ก.ย.๖๕ ๙ ก.ย.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย / เลย โค้งหนองบัว	KCA๑๐R-๐๒ หนองบัว	DIS ชั่วคราว ตรงข้าม ร. ๒๙	นายพงษ์ศักดิ์ บิดพะศิริ ๐๘๙-๘๐๒-๑๘๘๒

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจรัสพล โยจิตพล ตำแหน่ง พงษ.๖. เบอร์โทร ๐๘๙-๘๘๔-๙๙๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย ศรีจรรพฤกษ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ต.ลาดหญ้า

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ KCC05 จาก KCA10R-02 ถึง DIS ชั่วคราวตรงข้าม ร. 29  
ในวันที่ 26 ส.ค. 29 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1300/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย หนทอง ฝางเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๖๒๖(จิว)พค โยจิตพล

นายสมชาย ศรีจรรพฤกษ์  
(๐๘๐. 61๓๖ ๗.๐๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ๓. ลญ.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจก. - (สถานี)

.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ เลายโค้งหนองบัว					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26/8/2022 2,9/9/2022	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ลญ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1300/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	13 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. เพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายพิชชา,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายโมฆ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	KCC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
3	KCA10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ลญ.	SCADA R	บ้านหนองบัว
4	ย้ายโหลด KCC05 บางส่วนไปรับไฟจาก KCC03						
5	KCA10S-12	ปลด	สับ		ลญ.	SF6	ดึงข้ามถนนหน้า ศาลสุรสีห์
6	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลญ.	DIS	ตรงข้ามร.29
7	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
8	KCA10R-02	สับ	ปลด		ลญ.	SCADA R	บ้านหนองบัว
9	แจ้งช่างกฟส.ลญ.ปลดใบมีดด้านออกไลน์ของ KCA10R-02 ออกทั้ง 3 เฟส						
10	หลังจากกฟส.ลญ.ปลดใบมีดด้านออกไลน์ของ KCA10R-02 ออกทั้ง 3 เฟสเสร็จเรียบร้อย						
11	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
12	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
13	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
14	หลังจาก กฟส.ลญ. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
15	KCC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
17	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
18	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
19	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
20	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
21	KCC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
22	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	แจ้งช่างกฟส.ลญ.สับใบมีดด้านออกไลน์ของ KCA10R-02 เข้าทั้ง 3 เฟส						
24	หลังจากกฟส.ลญ.สับใบมีดด้านออกไลน์ของ KCA10R-02 เข้าทั้ง 3 เฟสเสร็จเรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	KCA10R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ลญ.	SCADA	R	บ้านหนองบัว
26	ย้ายโหลด KCC05 บางส่วนกลับจาก KCC03							
27	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		ลญ.		DIS	ตรงข้ามร.29
28	KCA10S-12	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ลญ.		SF6	ดึงข้ามถนนหน้าศาลสุรสีห์
29	KCC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC			
30	KCA10R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ลญ.	SCADA	R	บ้านหนองบัว
31	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

# สถานะการจ่ายไฟฟ้าปฏิบัติงาน



# สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

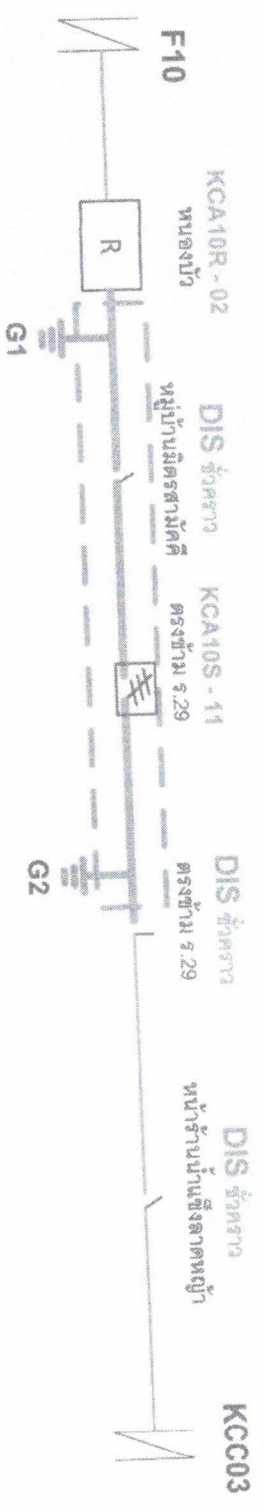

# สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติการ

