



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

1 ก.ย. 66

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๑๙๓๒/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พริธาสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรตล

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานติดตั้ง SF6 SMJ 09S-03 ตรงข้าม ม.สุจิตตรา คลองมะเดื่อ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๙ SMJ	๒ ก.ย. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เพื่อให้ชุดงานฮอทไลน์ และชุดงาน ผบ.กทบ. ติดตั้ง SF๖ SMJ ๐๙S-๐๓ บริเวณตรงข้ามหมู่บ้าน สุจิตตรา (คลองมะเดื่อ ๑๗/๑๒)	จุดเชื่อมสาย ตรงข้าม ม.สุจิตตรา ต.คลองมะเดื่อ	Dis ชั่วคราว เลข รง.ใหม่พรหม นครปฐม ต.คลองมะเดื่อ	นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ทพ.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร.๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน ๑ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร ๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายอารุณ จรตล)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMJ๐๙ จากจุดเชื่อมสายตรงข้าม ม.สุจิตตรา ถึง Dis ชั่วคราว เลข รง.ใหม่พรหม นครปฐม
ในวันที่ ๒ ก.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1307/2566
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มโนช ทองย้อย ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสามชาย มาบัณฑิตย์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ.กทบ.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th





ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. = (สถานี) -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตรงข้าม ม.สุจิตตรา					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ติดตั้ง SF6 SMJ09S-03	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1307/2566		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย			วันที่	30 สิงหาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 สิงหาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 สิงหาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐภาณุจัน,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายจิรวัดณ์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMJ-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		- -
3	SMJ06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		- -
4	SMJ09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		- -
5	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- -
6	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- -
7	KTA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- -
8	KTA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- -
9	*ย้ายโหลด SMJ09 บางส่วนไปรับไฟจาก KTA02*						
10	KTA09S-02	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 บ.กรีนสปอร์ต
11	KTABVB-01	ปลด	สับ		KTA	-	ขนานบัส
12	KTA02S-08	ปลด	สับ		กทบ.	SF6	แยกศาลพ่อปู่
13	Dis ชั่วคราว SMJ09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.	DIS	เลย โรงงานไหมพรหม
14	KTA09S-02	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 บ.กรีนสปอร์ต
15	KTABVB-01	สับ	ปลด		KTA	-	ขนานบัส
16	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น.						
17	แจ้ง กฟอ.กทบ. ทำการไลน์โหลด ช่วง Dis ชั่วคราว เลยโรงงานไหมพรหม - จุดปลดเชื่อมสาย						
18	หลังจาก กฟอ.กทบ. ทำการไลน์โหลด ช่วง Dis ชั่วคราว เลยโรงงานไหมพรหม - จุดปลดเชื่อมสาย แล้วเสร็จ						
19	แจ้งขอทไลน์กระเช้า ทำการปลดจุดเชื่อมสาย ตามแผนผังแนบ ออกทั้งสามเฟส						
20	หลังจาก ขอทไลน์กระเช้า ทำการปลดจุดเชื่อมสาย ตามแผนผังแนบ ออกทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
24	แจ้งชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
25	SMJ-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		- -
26	SMJ06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		- -
27	SMJ09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		- -


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-	-
29	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-	-
30	KTA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-	-
31	KTA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
32	หลังจากชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ							
33	SMJ-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		-	-
34	SMJ09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		-	-
35	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-	-
36	KTA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-	-
37	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
38	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
39	แจ้งขอท่อนกระแสเข้า ทำการเชื่อมจุดเชื่อมสาย ตามแผนผังแนบ เข้าทั้งสามเฟส							
40	หลังจาก ขอท่อนกระแสเข้า ทำการเชื่อมจุดเชื่อมสาย ตามแผนผังแนบ เข้าทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ							
41	ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่ รหัส SMJ09S-03(ตรงข้าม ม.สุจิตตรา) อยู่สถานะปลด โขว์ OPEN							
42	Dis ชั่วคราว SMJ09	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	เลย โรงงานใหม่พรหม
43	*ย้ายโหลด SMJ09 บางส่วนกลับคืนจาก KTA02*							
44	SMJ09S-03	ปลด	สับ		กทบ.		SF6	ตรงข้าม ม.สุจิตตรา
45	KTA02S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6	แยกศาลพ่อปู่
46	SMJ-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		-	-
47	SMJ09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		-	-
48	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-	-
49	KTA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

แผนผังปัจจุบัน ก่อนตัดไฟ บริเวณฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านสุจิตตรา กลางซอยคลองมะเดื่อ ๑๗/๑๒
 เพื่อให้ชุดงานฮอตไลน์กระแสเข้า กทบ. และชุดงาน ผบ.บ.กทบ. ติดตั้ง SF6 รหัส SMJ 09S-03 รองรับงานจ่ายไฟสถานีสมุทรสาคร ถาวร
 วันเสาร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

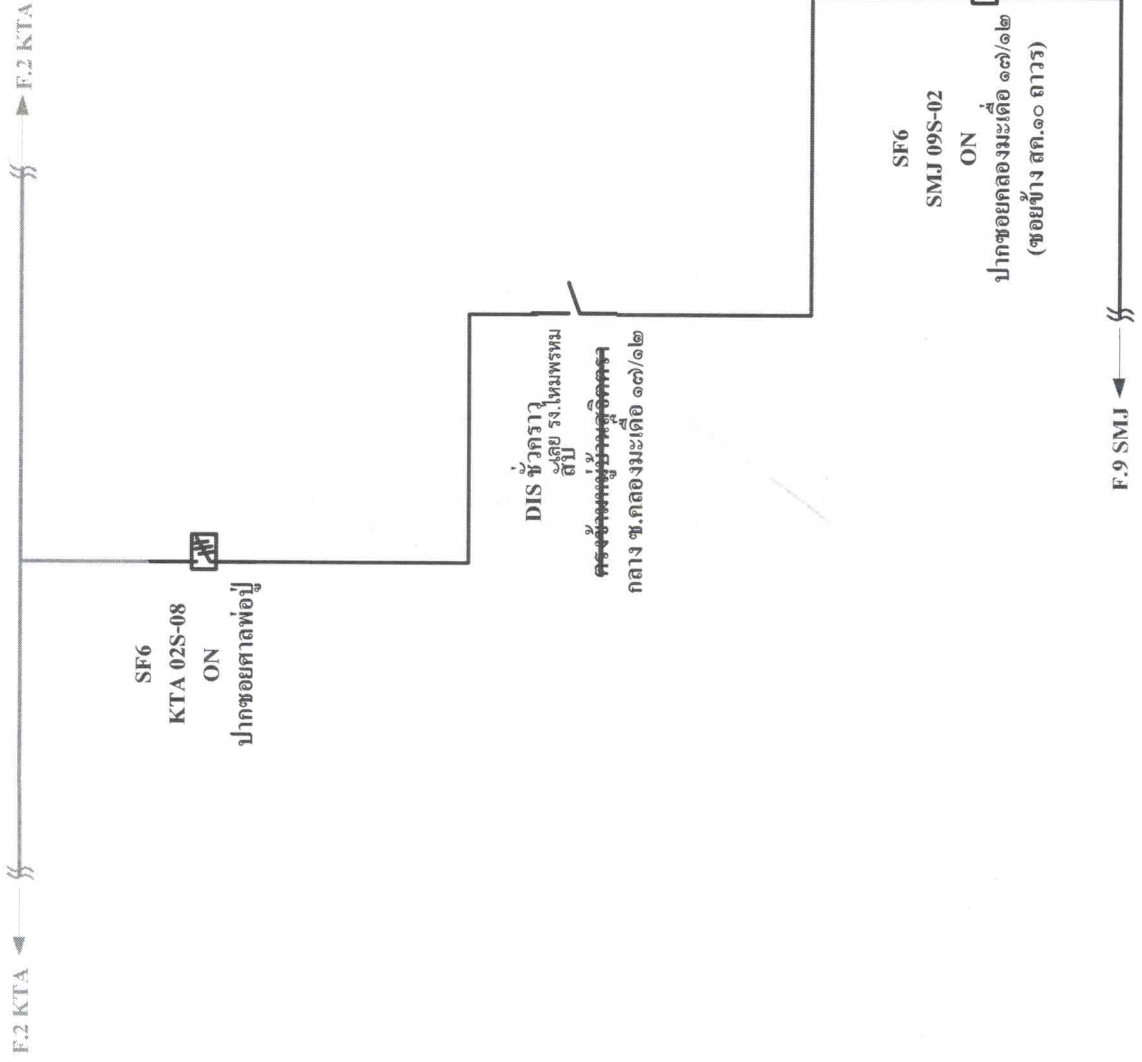

หมายเหตุ มีผู้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากการตัดไฟปฏิบัติงาน ๑ ราย

แผนผังปัจจุบัน หลังดับไฟ บริเวณฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านสุจิตตรา กลางซอยคลองมะเดื่อ ๑๗/๑๒
 เพื่อให้ชุดงานหอที่ไลน์กระเช้า กทบ. และชุดงาน ผปบ.กทบ. ติดตั้ง SF6 รหัส SMJ 09S-03 รองรับงานจ่ายไฟสถานีสมุทรสาคร ถาวร
 วันเสาร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

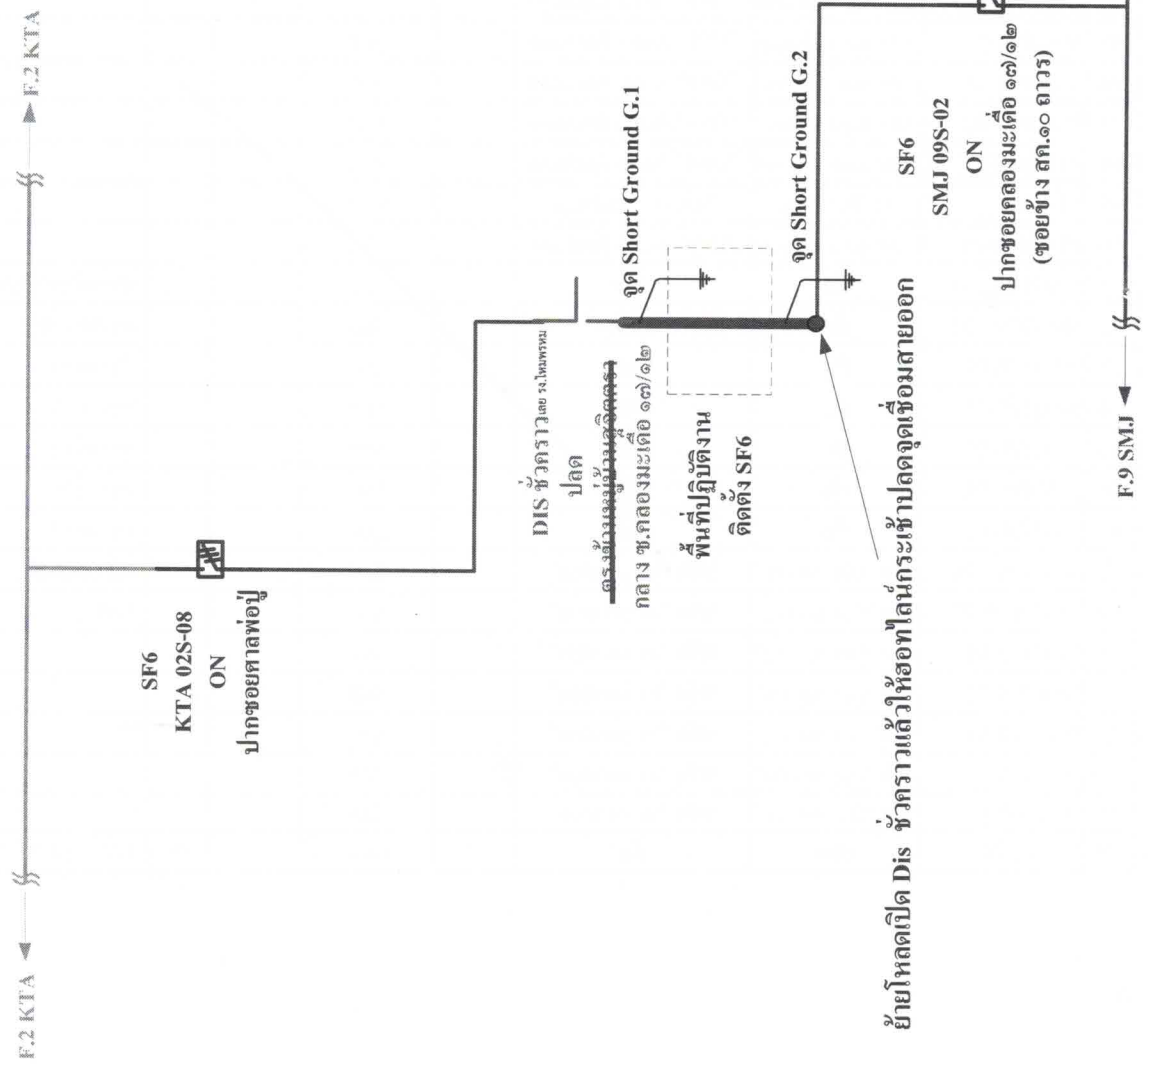

หมายเหตุ มีผู้ให้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน ๑ ราย
 จุด Short Ground G.1 - G.2
 เส้นทึบที่ไลน์ F.9 SMJ ดับไฟปฏิบัติงาน

ย้ายโหนดเปิด Dis ชั่วคราวแล้วให้หอที่ไลน์กระเช้าปลดจุดเชื่อมต่อภายนอก
