



วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

5 ก.ย. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.บพล.(ปบ) ๑๐๓๗ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณิซล
ชื่อผู้ส่ง นายกิตติวัฒน์ บ่อนิก
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ชรก. (บริหารการแทน
ผจก.กฟล.บ่อพลอย

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย ดับไฟเพื่อย้ายแนวระบบจำหน่าย ๒๒ เควี หลังรีโคลสเซอร์รีแอกเตอร์
ปรีออนองปลาไหล สถานีไฟฟ้าบ่อพลอย ๒(ชั่วคราว)

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ๒(ชั่วคราว) ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑ สถานี บ่อพลอย ๒(ชั่วคราว)	๖ ก.ย. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.	ย้ายแนวระบบ ๒๒ เควี หลังรี โคลสเซอร์รี แอกเตอร์ปรี ออนองปลาไหล สฟพ.บพล.๒	Recloser รี แอกเตอร์ ปรี BOU๐๒R- ๐๑	สุดระบบจำหน่าย	นาย ประพันธ์ เพชร วิไล นิชัย ชผ.บ. โทร ๐๙๕- ๘๒๒ ๐๕๕๖

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเนต พูลพันธ์ ตำแหน่ง พชง.๗ (สช) โทร ๐๙๕-๒๕๖๘๔๑๕
ผู้ประสานงานหน่วยงาน ชื่อ นายประพันธ์ เพชรวิโรจน์ชัย ตำแหน่ง ชผ.บ. โทร ๐๙๕-๘๒๒๐๗๒๒๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบ
ก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายกิตติวัฒน์ บ่อนิก)
ชรก.(บ)รักษาการแทน
ผจก.กฟอ.บ่อพลอย
๒-๙ ส.ค. ๒๕๖๖

ตำแหน่ง.....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ / ฟีดเดอร์ 2 จาก BCU 2P-01 ถึง ลอด:บจก.พท.
ในวันที่ 6 กย ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑.๐๐ น. ถึง ๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1310/2566


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศนรินทร์ อิงวิทิต สถานงานขอดับไฟกับ พล.ประพัทธ์ เนอรรวิโรจน์ ๕


(พล.ประพัทธ์ อิงวิทิต)
๑๕ก. 6 1๗๖ พ.ว.ว

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กพบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

นพ.อ.บพ.

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนทำสวิตซ์ขึง 1 แผ่น

แผ่นผังแนบ 2 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจฟ. (สถานีฯ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไปจนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน หลังรีโคลสเซอร์ BOU2R-01 สีแยกหนองปรือ
2. กำหนดวันที่ทำงาน 6 ก.ย. 66 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพอ.บพล. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1310/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายนครินทร์ อังสนาวดีน วันที่ 30 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 30 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 30 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายสวาท, นายจรรวดี, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนัส (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BOU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		- Load 2.1 MW
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น. (ตรวจสอบ รีโคลสเซอร์ และ SW. Load ของ BOU2R-01 สถานะ ปลอดภัย)						
4	SW.Bypass	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		หปร.		DIS Bypass R สีแยกหนองปรือ
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
6	แจ้ง ผู้ควบคุมงานให้ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
7	แจ้ง ผู้ควบคุมงานให้ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
8	แจ้งให้ ผู้ควบคุมงาน ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
9	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
10	BOU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		- -
11	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
12	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
13	แจ้ง ผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short ground จุด G1						
14	แจ้ง ผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short ground จุด G2						
15	BOU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		-
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	SW.Bypass	ปลด	สับ		หปร.		DIS Bypass R สีแยกหนองปรือ
18	BOU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		- -
19	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

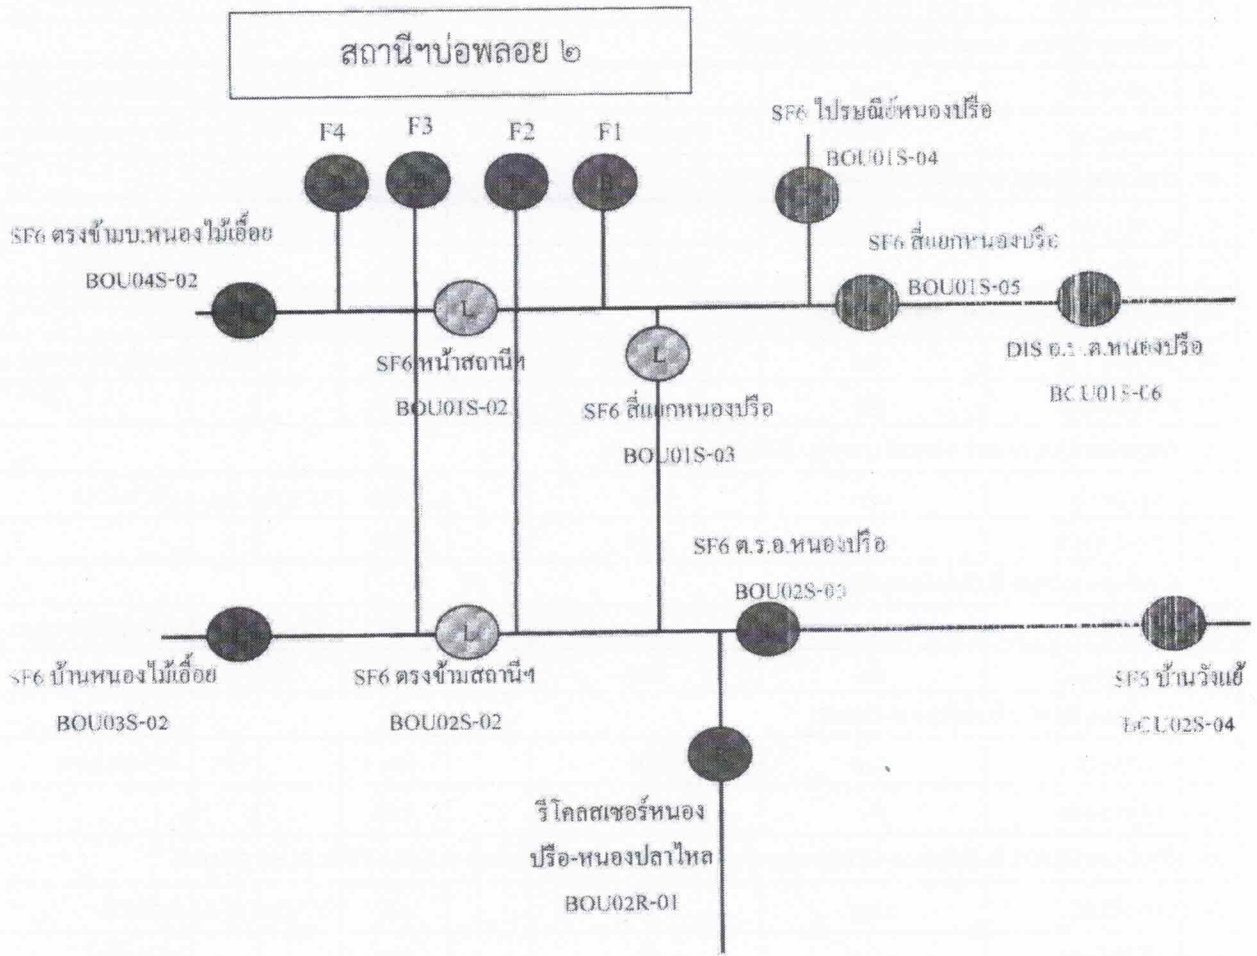

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

