



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

16 ก.ย. 67

เลขที่ ก.๓.ดช.(กป) ๗๐๓ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านนิคมกระเสียว ตามแผนผัง
สังเขปแนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ปลั๊กประจู่

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.๙ สถานี ด่านช้าง	๑๙ กันยายน ๒๕๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านปลั๊กประจู่	ดิสชด.ปลั๊กประจู่ DAA๐๙S-๓๐	ดิสชั่วคราวก่อน ข้ามสะพานตงเสลา	นายศักดิ์ดา นรสิงห์ พงษ.๔ กฟส.อ.ด่านช้าง เบอร์โทร ๐๘๓๓- ๐๑๒๑๑๒๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๗๕๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตติโนวโชค ตำแหน่ง ทพ.กป โทร ๐๙๘-๕๖๓๔๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ เริ่มต้น ๑๔.๗๑๘๑๑,๙๙.๕๐๔๘๔ สิ้นสุด ๑๔.๗๔๒๙๗,๙๙.๔๕๔๗๒

(นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ DAA๐9 จาก DAA๙S-๐0 ถึง Dis ๕๓. ก่อนข้ามสะพานตงเสลา
ในวันที่ 19 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1310/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ น.ส. สุภัทรา วงศ์บุญจาก ประสานงานการขอตัดไฟกับ หมอชนาเตร กิตติหาโรด

รับ

(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญจาก)
รต. 5 แทน ทพ.ดช.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๑๓

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis ชค.ปลักประตู้ - ดิสชั่วคราวก่อนข้ามสะพานดงเสลา		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ก.ย. ๖7	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1310/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัสชา วงศ์บุญมาก		วันที่ 9 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA09R-03	Normal	Nonreclosing		ดช.		R ปลักประตู้
3	เปลี่ยนทางย้ายโหลด DAA09						
4	DAA09S-16	ปลด	สับ		ดช.		DIS บ้านดงเสลา
5	Dis ชค ในไลน์ DAA09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS ชค.ก่อนข้ามสะพานดงเสลา
6	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00 น.						
7	DAA09S-30	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS ชค. ปลักประตู้
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กฟส.ดช.รับทราบ						
9	แจ้งชุดทำงาน กฟส.ดช. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งชุดทำงาน กฟส.ดช. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
11	เมื่อ กฟส.ดช. ทำการลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
12	DAA09R-03	Nonreclosing	Normal		ดช.		R ปลักประตู้
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ						
14	แจ้งชุดทำงาน กฟส.ดช. ทำปลด Short Ground จุด G1						
15	แจ้งชุดทำงาน กฟส.ดช. ทำปลด Short Ground จุด G2						
16	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
17	DAA09R-03	Normal	Nonreclosing		ดช.		R ปลักประตู้
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	DAA09S-30	ปลด	สับ		ดช.		DIS ชค. ปลักประตู้
20	ย้ายโหลด DAA09 กลับสภาพปกติ						
21	Dis ชค ในไลน์ DAA09	ปลด	สับ		ดช.		DIS ชค.ก่อนข้ามสะพานดงเสลา
22	DAA09S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS บ้านดงเสลา
23	DAA09R-03	Nonreclosing	Normal		ดช.		R ปลักประตู้
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							


แผนผังงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านปลักประดู่
ก่อนตัดไฟ

วันที่ 19 กันยายน 2567 เวลา 09.00-17.00 น.

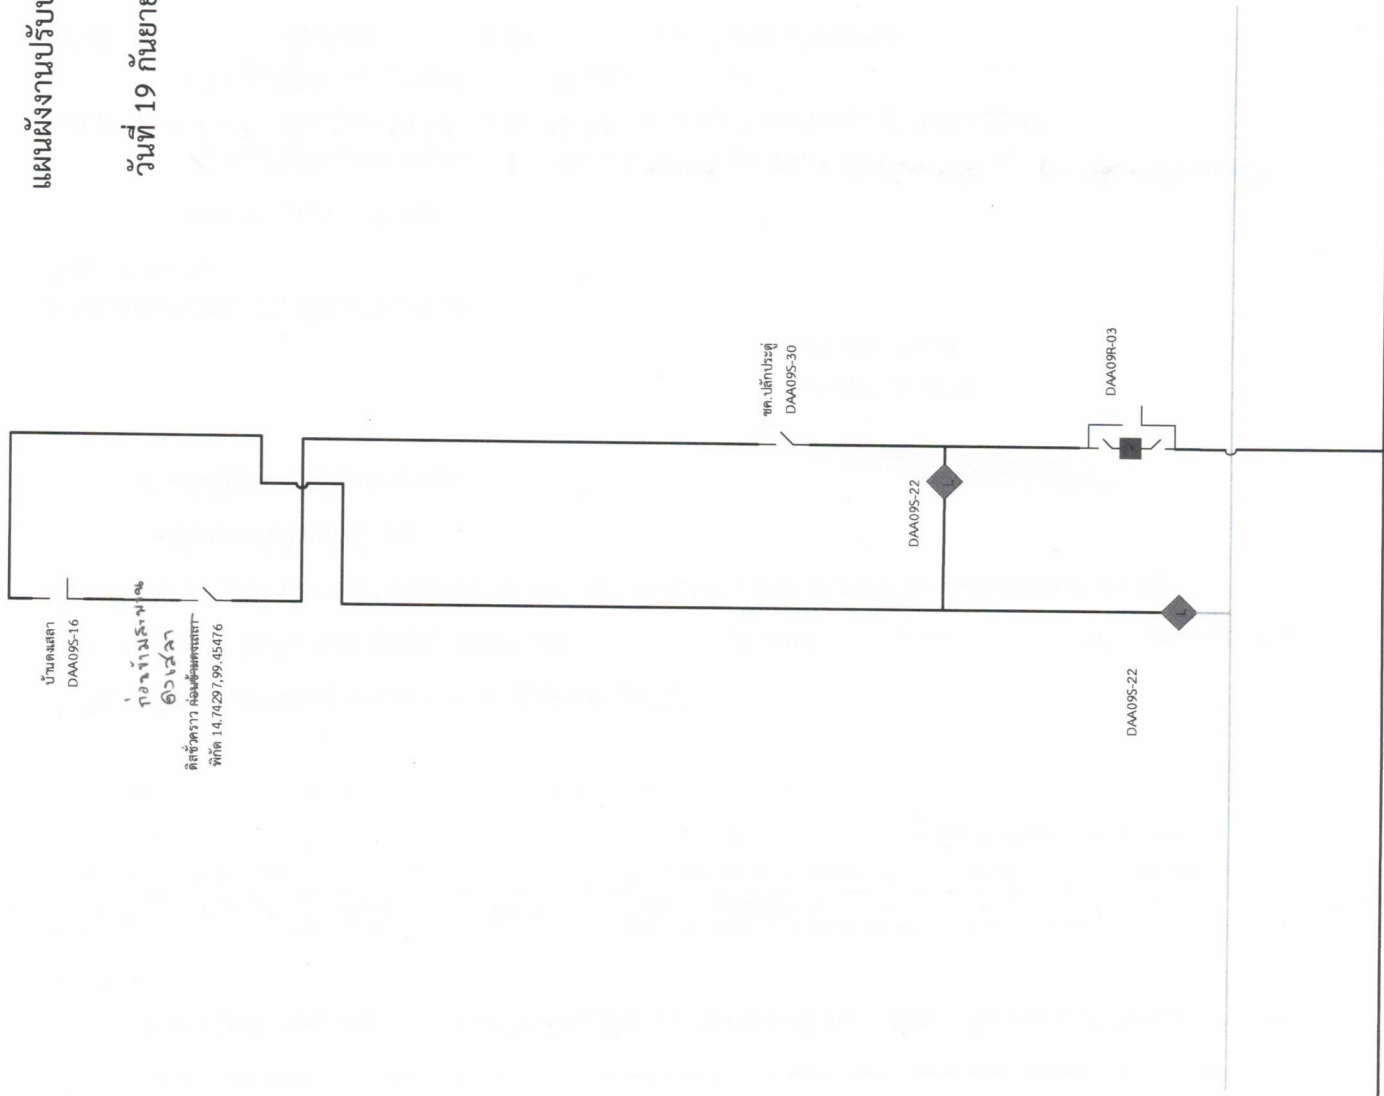

แผนผังงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านปลักประดู่
ทลิ่งดับไฟ

วันที่ 19 กันยายน 2567 เวลา 09.00-17.00 น.

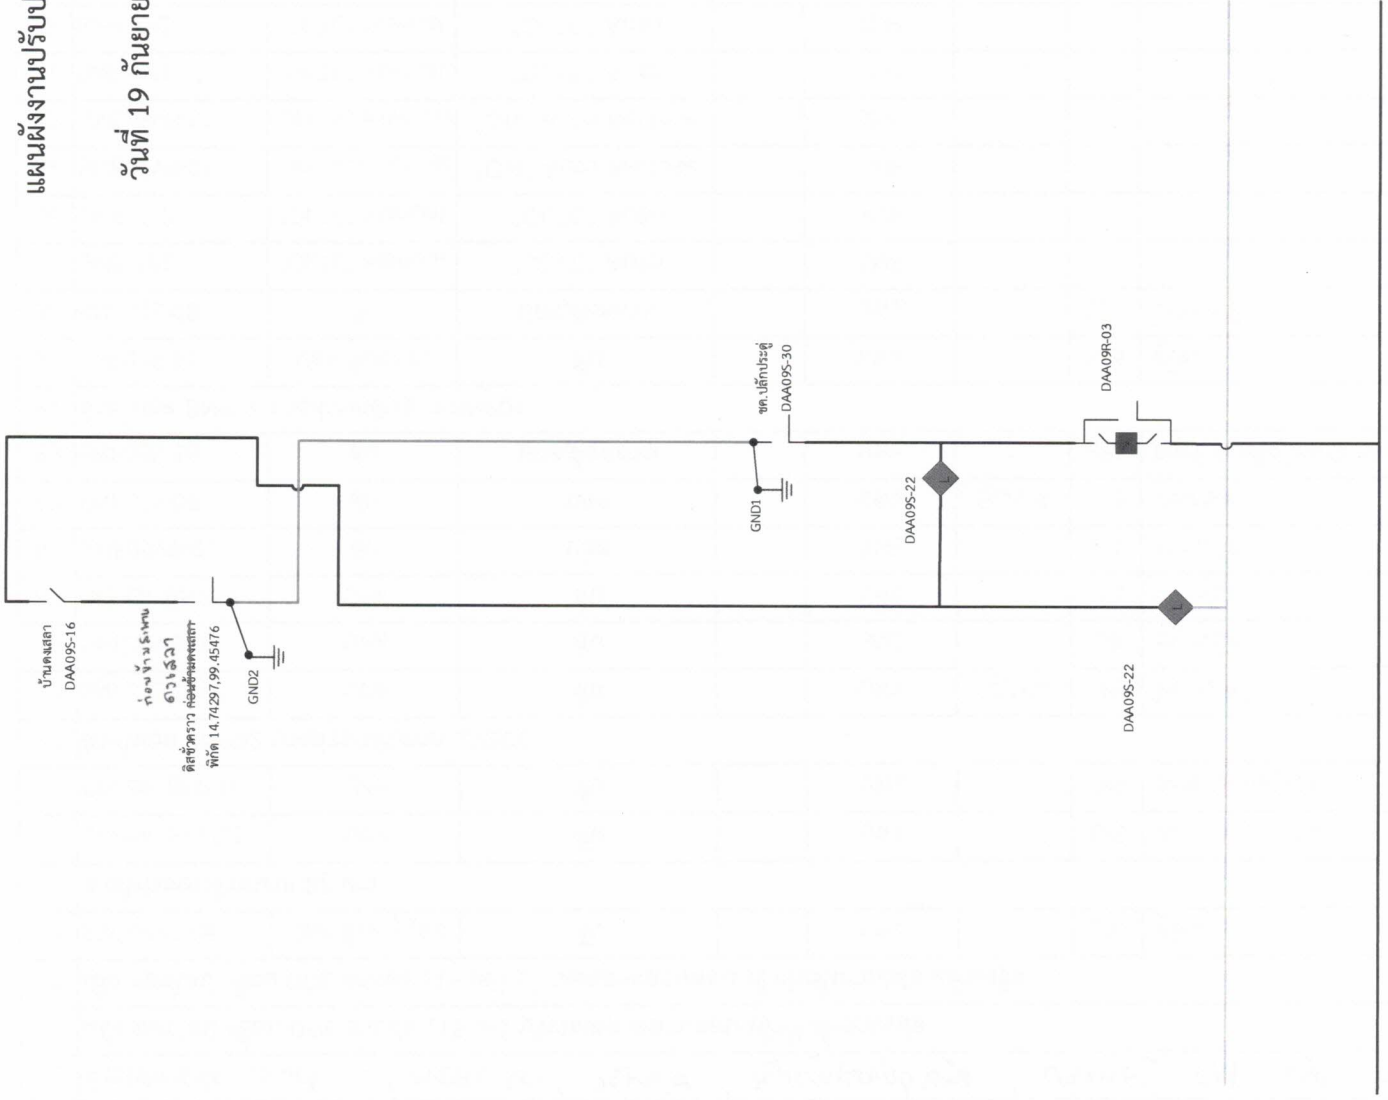

บ้านปลักประดู่
DAA09S-16

กล่องจ่ายแรงดัน
600 โวลต์
ติดตั้งที่ 14/74297/99.45/716

GND2

จุด.ปลักประดู่
DAA09S-30

GND1

DAA09S-22

DAA09S-22

DAA09R-03
