



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๓.....

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง.....

ชื่อผู้ส่ง นายชัชชัย...เจ็ดชูสุวรรณ.....

Switching Deadline

วันที่ 12 ต.ค. 64

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔.....

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓).....

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟ.จ.สพ.....

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาแรงสูงต้นโลเซอร์โพล สถานีสุพรรณบุรี๒ สถานีไฟฟ้า...สุพรรณบุรี
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒...แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	9 สพ.	15/10/64	08.00	17.00	ปักเสาแรงสูงต้นโลเซอร์โพล สถานีสุพรรณบุรี2	DDEกลางส แบนจA	DDEจุดB โดยจ.ก.ก.ท. เพื่อเปลี่ยน	โทร.๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐ นายพิบูล ปานท่า
						ก่อนปฏิบัติงาน มีไฟฟ้าสำรอง		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสนนกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พง.๒ (สข.) โทร. ๐๙๑-๘๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

.....นายชัชชัย เจ็ดชูสุวรรณ.....)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟ.จ.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ SPA9 จาก DDE จุด A ถึง DDE จุด B

ในวันที่ 15 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1314/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

9 ต.ค. 64

.....นายชัชชัย เจ็ดชูสุวรรณ.....
ร.จ.ก.(ท.) กฟ.จ.สพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ.จ.สพ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 1..... แผ่น

แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณร้านกาแฟเมืองเหนือ (สถานีสุพรรณบุรี 2)			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ต.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1315/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่ 9 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 9 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 4.38 MW
3	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing		สพ.		R บางปลาหมอ
4	ย้ายโหลด SPA09 บางส่วน (เปลี่ยนทางการจ่ายไฟ)						
5	SPA07S-08	ปลด	สับ		สพ.		DIS หมู่บ้านจามจรี
6	DIS ชั่วคราว.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หน้าสถานีสุพรรณบุรี 2
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงในระบบออกทั้ง 3 เฟส						
8	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการตัด DDE กลางสแปนจุด A บริเวณก่อนถึงร้านกาแฟเมืองเหนือ ออกทั้ง 3 เฟส						
9	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการตัด DDE จุด B บริเวณเลยร้านกาแฟเมืองเหนือ ออกทั้ง 3 เฟส						
10	หลังจากชุด Hotline กระเช้า ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 2 จุด						
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
14	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
15	SPA09R-01	Nonreclosing	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จทั้งหมด พร้อมจ่ายไฟกลับคืน						
17	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
18	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing		สพ.		R บางปลาหมอ
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
21	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE กลางสแปนจุด A บริเวณก่อนถึงร้านกาแฟเมืองเหนือ เข้าทั้ง 3 เฟส						
22	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE จุด B บริเวณเลยร้านกาแฟเมืองเหนือ เข้าทั้ง 3 เฟส						
23	หลังจากชุด Hotline กระเช้า ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 2 จุด						
24	ย้ายโหลด SPA09 บางส่วน (กลับคืนสภาพปกติ)						
25	DIS ชั่วคราว.	ปลด	สับ		สพ.		DIS หน้าสถานีสุพรรณบุรี 2
26	SPA07S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หมู่บ้านจามจรี
27	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
28	SPA09R-01	Nonreclosing	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ
สิ้นสุด Switching							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.


วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ด้วยในวันที่...๑๕...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๔... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...ตัดเดคกลางสแปน จุดA - เดคจุดB...เพื่อ...ปักเสาต้นไลเซอร์โพล สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดพีดีเคอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดีเคอร์ ..๙.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ..ตัดเดคกลางสแปน - เดคจุดB

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...คุณไพโรจน์ ..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๔-๐๘๑๕๔๒๗..เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายพิบูล ปานขำ ..ตำแหน่ง ขม.ปบ.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๘-๒๗๕๓๖๔๐..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

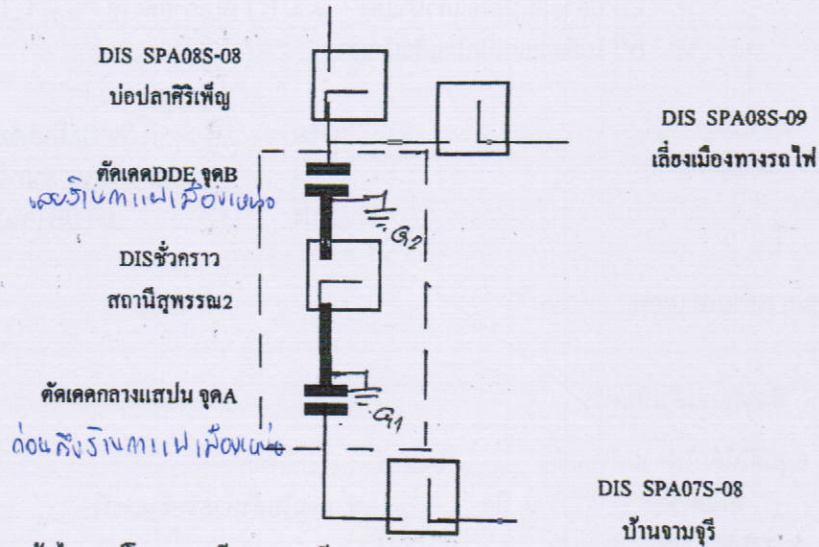

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อปักเสาแรงสูงต้นไลเซอร์โพล สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ย้ายโหนดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
๒. ปลดโหนดจุด ให้ Hot Line สพ.ปฏิบัติงานด้วยการตัดเดค ๒จุด
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อบกพร่องจุด๑และจุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างเขตปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ)

รจก.(ท.)กฟจ.สพ.

(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)
พชง.๗(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐

๐๒๕
