



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

1 ก.ย. 66

เลขที่ ก.๓ บล.(ป.บ.) ๑๙๔๒ /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาแรงสูง เพื่อแก้ไขสายหย่อนยาน บริเวณ คลอง  
ประปา นครหลวง วัดเกษมา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BEA7	4 ก.ย.66	08.30 น.	16.30 น.	ปักเสา พาดสายแรงสูง ๒๒ kV	BEA7S-16	BEA7S-17	นายชนภณ มีจันทร์ พงษ.5 ผศ
2.	BEA8					BEA8S05	BEA8S-06	
3.	BEA6					BEA6R-01	BEA6S-17 BEA6S-15 จุดปลดสายแรง สูง โดยฮอทไลน์	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) จาก แยกวัดเกษมา ถึง ศาลาแดง

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประติษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ทม.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์ )

หมายเหตุ ขอตัดแรงดัน

เพื่อแก้ไขสายแรงสูงหย่อนยาน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บางเลน

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1/2 พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
BEA 7S-16 BEA 7S-17  
BEA 8S-05 BEA 8S-06

ในวันที่ 4 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1315/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ BEA 6 จาก..... ถึง.....  
BEA 6S-17  
BEA 6R-01  
BEA 6S-15

ในวันที่ 4 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1315/2566

พนักงานศูนย์ฯ นาย ส. ส. ประสานงานขอตัดไฟกับ.....

(นางสาวพิชิต พงษ์ศิริ)  
อก.ธกท.ช.กท.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บางเลน, กท.๑๓๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 3 .....แผ่น

แผนผังแนบ..... 1 .....แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

บริเวณ คลองประปานครหลวง-วัดเกษมาฯ


4 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
กฟอ.บล.	งานที่ทำ	ปักเสาและพาดแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1315/66
	นายสุธี ศรีพีชร		วันที่	31 สิงหาคม 2566
			วันที่	31 สิงหาคม 2566
			วันที่	31 สิงหาคม 2566
	1. นายพรภทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต,			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมนโอช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดคอนก่อนทำสวิตชิง						
2	แจ้งกฟอ.บล ดำเนินการแจ้ง บ.โซลาร์ต้า ไทรประปา(BEA08) ,บ.โซลาร์ต้าไทรย่อย(BEA06) ดำเนินการหยุดขานและปลดโหลดภายใน						
3	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	Load 9.88 MW
4	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	Load 3.99 MW
5	BEA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	Load 5.94 MW
6	BEA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	Load 3.18 MW
7	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing,ALT,GND		บล.	SCADA R	แยกวัดเกษม
8	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	Load 5.86 MW
9	DTM10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA R	ปากทางวัดบางปลา
10	ย้ายโหลด BEA07 บางส่วนไปรับไฟจาก BEA06						
11	BEA06S-20	ปลด	สับ		บล.	DIS	บ.วัดต้า
12	BEA07S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.	DIS	แยกศาลาแดง
13	ย้ายโหลด BEA06 บางส่วนไปรับไฟจาก DTM10						
14	BEA06S-18	ปลด	สับ		บล.	SCADA SF6	ศาลาแดง
15	BEA06R-01	สับ	ปลด		บล.	SCADA R	แยกวัดเกษม
16	Sw.Source BEA06R-01	สับ	ปลด		บล.	DIS	แยกวัดเกษม
17	Sw.Load BEA06R-01	สับ	ปลด		บล.	DIS	แยกวัดเกษม
18	เมื่อเวลา 08.00 น. บ.โซลาร์ต้า ไทรประปา(BEA08) ,บ.โซลาร์ต้าไทรย่อย(BEA06) ดำเนินการหยุดขานและปลดโหลดภายใน พร้อมดับไฟ						
19	BEA07S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.	DIS	โรงเรียนบางเลน
20	BEA08S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.	DIS	แยกวัดเกษมาฯ
21	BEA06S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.	DIS	ใต้สายส่ง EGAT
22	BEA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.	SF6	บ.โซลาร์ต้า (ไทรประปา)
23	BEA06S-15	สับ	ปลด		บล.	DIS	บ้านทองคั้ง
24	แจ้งกฟอ.บล. ปลดโหลดในระบบจำหน่าย(BEA06) ตั้งแต่จุดปลดสายปากทางวัดเกษมาฯ ถึง Recloser แยกวัดเกษมาฯ BEA06R-01 ออกทั้งหมด						
25	เมื่อกฟอ.บล. ปลดโหลดในระบบจำหน่าย(BEA06) ตั้งแต่จุดปลดสายปากทางวัดเกษมาฯ ถึง Recloser แยกวัดเกษมาฯ BEA06R-01 ออกทั้งหมดแล้วเสร็จ						
26	แจ้ง Hotline 22kV ดำเนินการปลดสายบริเวณปากทางวัดเกษมาฯออกจากกันทั้ง 3 เฟส (โดยวิธีแบบมีไฟ)						
27	เมื่อ Hotline 22kV ดำเนินการปลดสายบริเวณปากทางวัดเกษมาฯออกจากกันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.บล. ทราบ						
29	แจ้งกฟอ.บล. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
30	แจ้งกฟอ.บล. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
31	แจ้งกฟอ.บล. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3						
32	แจ้งกฟอ.บล. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G4						
33	แจ้งกฟอ.บล. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G5						
34	แจ้งกฟอ.บล. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G6						
35	แจ้งกฟอ.บล. ปฏิบัติงานได้						
36	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
37	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
38	BEA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
39	BEA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
40	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
41	DTM10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		บล.	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา
<b>***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***</b>							
42	เมื่อกฟอ.บล. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
43	แจ้งกฟอ.บล. ปลด Short Ground จุด G1						
44	แจ้งกฟอ.บล. ปลด Short Ground จุด G2						
45	แจ้งกฟอ.บล. ปลด Short Ground จุด G3						
46	แจ้งกฟอ.บล. ปลด Short Ground จุด G4						
47	แจ้งกฟอ.บล. ปลด Short Ground จุด G5						
48	แจ้งกฟอ.บล. ปลด Short Ground จุด G6 และเมื่อกฟอ.บล. ยืนยันข้อมูลการลง WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
49	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
50	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
51	BEA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
52	BEA09VB-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
53	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
54	DTM10R-01	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา
55	แจ้ง Hotline 22kV ดำเนินการเชื่อมสายบริเวณปากทางวัดเกษมาทั้ง 3 เฟส (โดยวิธีแบบมีไฟ)						
56	เมื่อ Hotline 22kV ดำเนินการเชื่อมสายบริเวณปากทางวัดเกษมาทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
57	แจ้งกฟอ.บล. นำโหลดในระบบจำหน่าย(BEA06) ตั้งแต่จุดปลดสายปากทางวัดเกษมาฯ ถึง Recloser แยกวัดเกษมาฯ BEA06R-01 เข้าระบบได้ทั้งหมด						
58	เมื่อกฟอ.บล. นำโหลดในระบบจำหน่าย(BEA06) ตั้งแต่จุดปลดสายปากทางวัดเกษมาฯ ถึง Recloser แยกวัดเกษมาฯ BEA06R-01 เข้าระบบทั้งหมดแล้วเสร็จ						
59	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ และ บ.โหลดดำ ไทระปะปา(BEA08) ,บ.โหลดดำ ไทระย้อย(BEA06) ยืนยันพร้อมรับไฟ						
60	BEA07S-16	ปลด	ล๊ับ		บล.		DIS โรงเรียนบางเลน
61	BEA08S-05	ปลด	ล๊ับ		บล.		DIS แยกวัดเกษมาฯ
62	BEA06S-17	ปลด	ล๊ับ		บล.		DIS ได้สายส่ง EGAT
63	BEA06S-15	ปลด	ล๊ับ		บล.		DIS บ้านท้องคิ่ง



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
64	BEA08S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บล.		SF6	บ.โซลาร์ต้า (ไทรประปา)
<del>65</del>	<del>BEA07S-17</del>	<del>ปลด</del>	<del>สับ</del>		<del>บล.</del>		<del>DIS</del>	<del>แยกศาลาแดง</del>
66	ย้ายโหลด BEA06 บางส่วนกลับจาก DTM10							
67	ตรวจสอบ BEA06R-01 Recloser อยู่สถานะ <u>"OPEN"</u>							
68	Sw.Source BEA06R-01	ปลด	สับ		บล.		DIS	แยกวัดเกษม
69	Sw.Load BEA06R-01	ปลด	สับ		บล.		DIS	แยกวัดเกษม
70	BEA06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT,GND		บล.	SCADA	R	แยกวัดเกษม
71	BEA06S-18	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6	ศาลาแดง
72	ย้ายโหลด BEA07 บางส่วนกลับจาก BEA06							
73	BEA07S-17	ปลด	สับ		บล.		DIS	แยกศาลาแดง
74	BEA06S-20	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS	บ.วัดต้า
75	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-	
76	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	
77	BEA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	
78	BEA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	
79	BEA06R-01	Nonreclosing,ALT,GND	Normal		บล.	SCADA	R	แยกวัดเกษม
80	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-	
81	DTM10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R	ปากทางวัดบางปลา
82	แจ้งกฟ.บล ดำเนินการแจ้ง บ.โซลาร์ต้า ไทรประปา(BEA08) ,บ.โซลาร์ต้าไทรย่อย(BEA06) ดำเนินการขนานไฟได้							
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***								

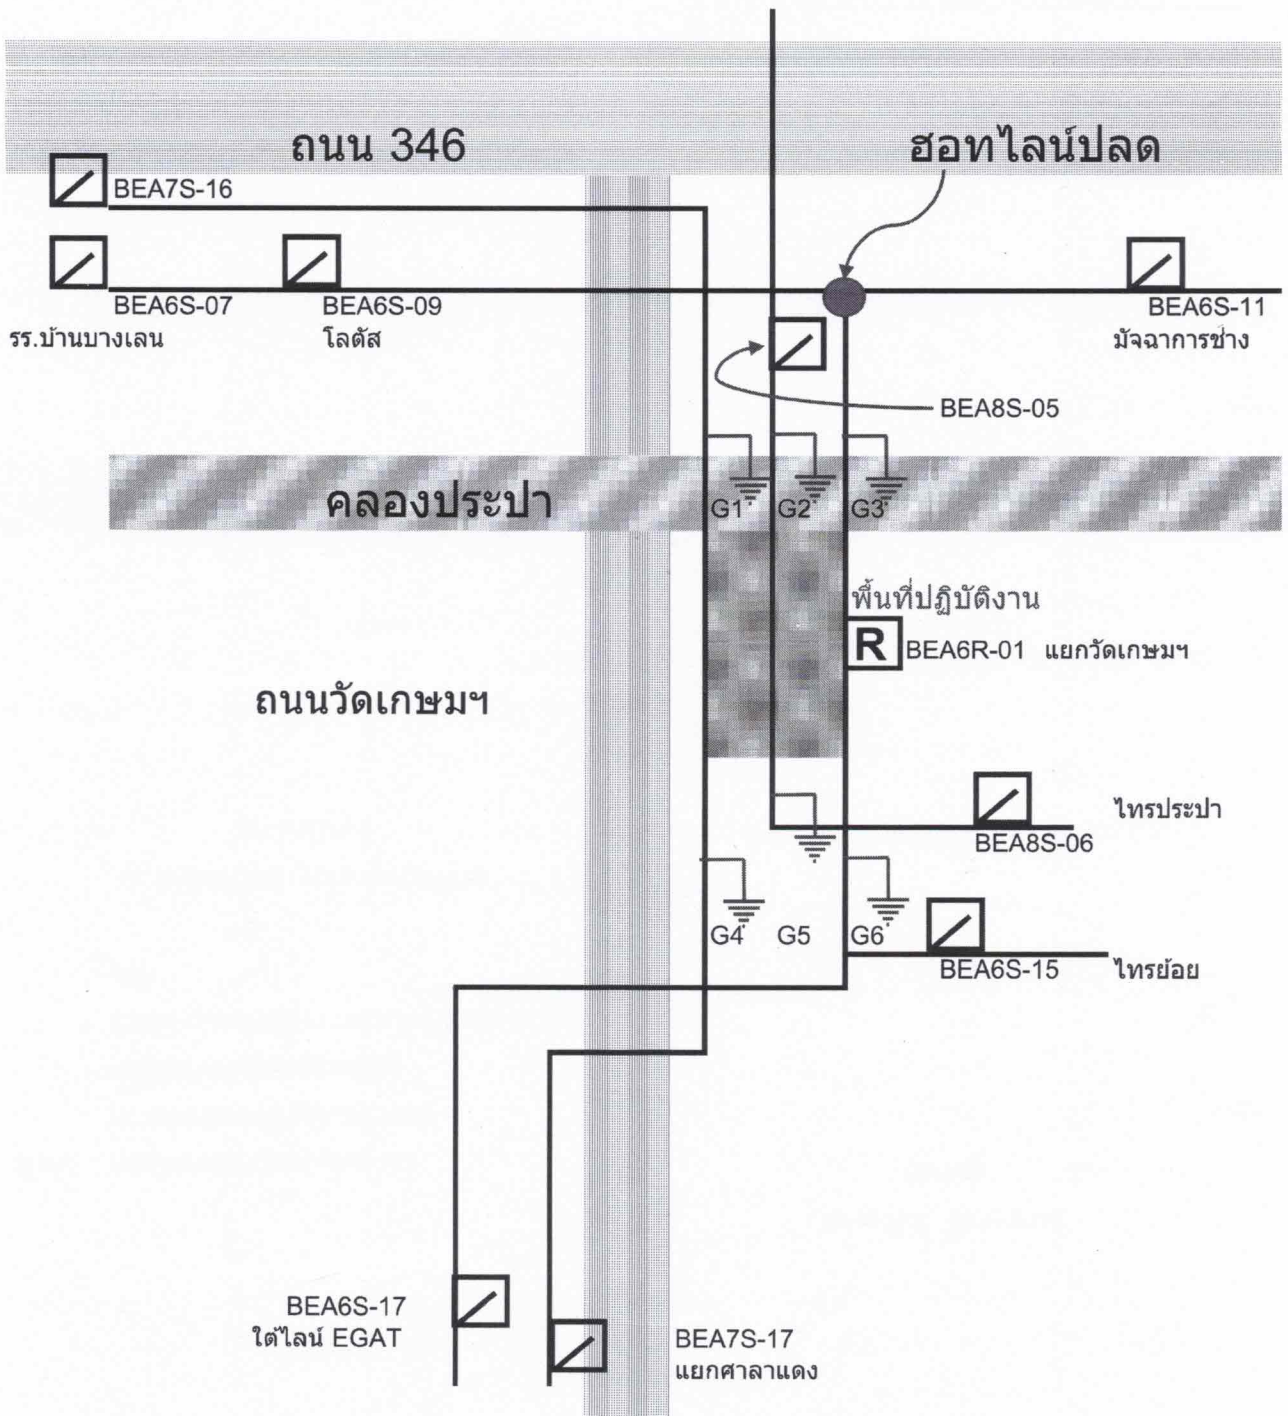

ผังดับไฟ 22 kV.แรงดัน วันที่ 4 กันยายน 2566 ทางเข้าวัดเกษมฯ
