



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปน.) 1588 /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วิญญูขอดับไฟ

Switching Deadline

13 ก.ย. 67

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอดับไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี..บริเวณแยกวัดหนองแวมถึงปากซอยร่มเย็น ซอยก้วยเตี้ยวนายดม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB๐๙ (๐๐๖๐๙)	๑๔ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอดับไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี..บริเวณแยกวัดหนองแวมถึงปากซอยร่มเย็น ซอยก้วยเตี้ยวนายดม	HL ตัด DDE บริเวณปากซอย ร่มเย็น	DIS ชค.แยกวัดหนองแวม	นายเพชร พูลเพิ่ม ๐๘๑-๔๘๙-๖๒๐๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ไฟดับเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. แยกวัดหนองแขมถึง ปากซอยร่มเย็น ซอยก้วยเตี้ยว
นายดม ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พชง.๖ ผปน. โทร ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๖๗๑๐๔๘๖ Long ๑๐๐.๓๓๘๒๘๕๖

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๖๗๓๗๑๑๓ Long ๑๐๐.๓๓๓๘๗๐๙



(นายอดิศร แก้วสินธุ์)


ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ^{ณ บ.ค.๑ (CONPCA) เขตหนองแขม} ฟีดเดอร์ ^{จาก} ^{ถึง} ^{Dir.๑๓๓. และ ก.๑๓๓-๑๒๒}
ในวันที่ ๐๘:๐๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. ถึง ๑๘:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1315/67

พนักงานศูนย์ นาย สุธี ด้วงพร ประสานงานดับไฟกับ ๕. ใ้เกียรติศักดิ์ ชาวณู


(นายสุธี ด้วงพร)
๕๐๑5 ๓๓๖ ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓ กปบ.๓
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


- | | | | |
|------------------------|---|------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | แยกวัดหนองแวม - ปากซอยร่มเย็น. (ONB09) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 14 ก.ย. 67 | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.อมน. | งานที่ทำ | ดับไฟให้กรมโยธาฯตอกเสาเข็ม ตามใบขอปฏิบัติงาน 1315/67 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสุธี ศรีเพ็ชร | | วันที่ 9 กันยายน 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 9 กันยายน 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 9 กันยายน 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | วันที่ 9 กันยายน 2567 |
-
- | | |
|--|---------------------------|
| 1. นายอิทธิพร, นายสาวิตรี, นายชุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, วรณพงศ์, นายมโนช | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
| 3. นายจิรวุฒิ, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
3	ONB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
4	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU		-
5	KTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		-
6	KTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		-
7	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
8	KTA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
9	ย้ายโหลด ONB09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KTU03						
10	KTU03S-08	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 โรงงานอิฐบล็อค
11	KTA05S-06	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ร้านอาหารเจ้าจันทร์
12	KTA05S-12	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงเรียนบ้านแคราย (ล่าง)
13	Dis ชค. ONB09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS หมู่บ้านหรรษา3-4
14	KTA05S-06	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 ร้านอาหารเจ้าจันทร์
15	KTA05S-12	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงเรียนบ้านแคราย (ล่าง)
16	เมื่อ Hotline 22kV พร้อมปลด DDE บริเวณปากซอยร่มเย็น (ตั้งแต่จุดปลด DDE ถึง Dis ชค. หมู่บ้านหรรษา3-4 ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
17	แจ้ง Hotline 22kV ปลด DDE บริเวณปากซอยร่มเย็น ออกจากกันทั้ง 3เฟส						
18	เมื่อ Hotline 22kV ปลด DDE บริเวณปากซอยร่มเย็น ออกจากกันทั้ง 3เฟส แล้วเสร็จ						
19	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
20	Dis ชค. ONB09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS แยกวัดหนองแวม
21	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟอ่อน หากไม่พบไฟอ่อนให้ทำการ Short ground จุด G1						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟอ่อน หากไม่พบไฟอ่อนให้ทำการ Short ground จุด G2						
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
25	เมื่อผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
27	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		
28	ONB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
29	KTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTU		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	KTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU			
31	KTU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU			
32	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA			
33	KTA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA			
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
34	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ							
35	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-	-
36	ONB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-	-
37	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU		-	-
38	KTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		-	-
39	KTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		-	-
40	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-	-
41	KTA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-	-
42	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
43	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
44	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
45	แจ้ง Hotline 22kV เชื่อม DDE บริเวณปากซอยร่มเย็น เข้าทั้ง 3 เฟส							
46	เมื่อ Hotline 22kV เชื่อม DDE บริเวณปากซอยร่มเย็น เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
47	Dis ชค. ONB09	ปลด	สับ		อมน.		DIS	แยกวัดหนองแขม
48	ย้ายโหลด ONB09 บางส่วนกลับจาก KTU03							
49	KTA05S-06	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6	ร้านอาหารเจ้าจันทร์
50	KTA05S-12	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามโรงเรียนบ้านแคทราย (ล่าง)
51	Dis ชค. ONB09	ปลด	สับ		อมน.		DIS	หมู่บ้านหรรษา3-4
52	KTA05S-06	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	ร้านอาหารเจ้าจันทร์
53	KTA05S-12	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามโรงเรียนบ้านแคทราย (ล่าง)
54	KTU03S-08	สับ	ปลด		กทบ.		SF6	โรงงานอิฐบล็อด
55	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB			
56	ONB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB			
57	KTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTU			
58	KTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU			
59	KTU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU			
60	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA			
61	KTA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA			
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

หลังวัดหนองแวม

ONB9S-09

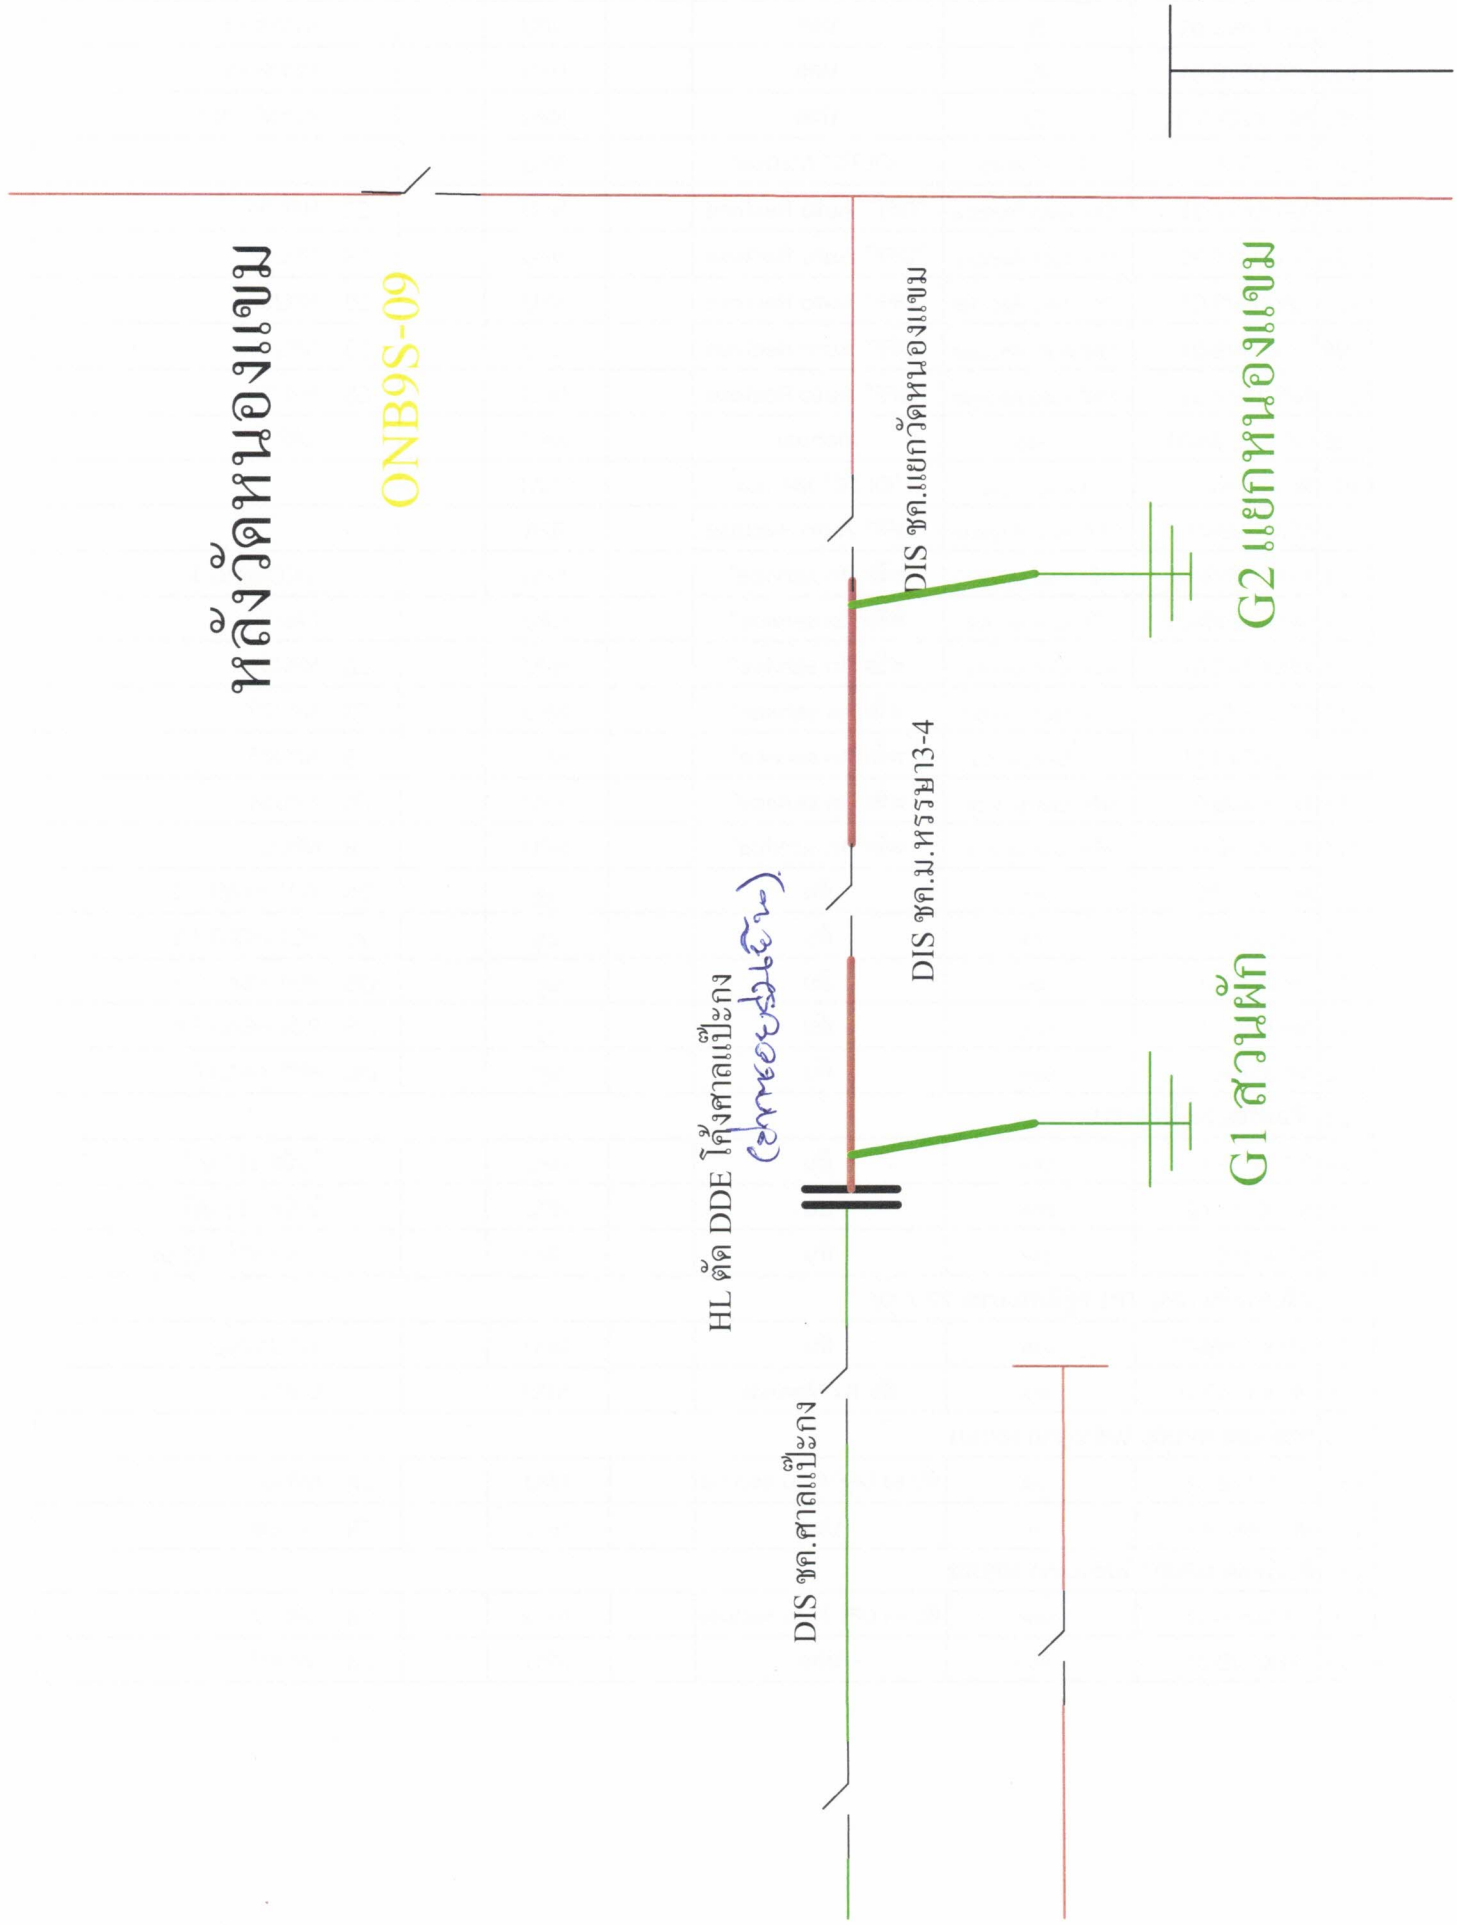

HL ตัด DDE โค้งศาลเป็ะกง
(ยกของขึ้น)

DIS ชค.ศาลเป็ะกง

DIS ชค.ม.หรรษา 13-4

DIS ชค.แยกวัดหนองแวม

G1 ส่วนฝัก

G2 แยกหนองแวม
