



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

18 ก.ย. 67

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ) 891/2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพิชิต
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 6 ก.ย. 2567
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟวงจร DBA ๐๒,๐๓,๐๔ เพื่อให้ชุดงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณสามแยกนาง
บวชริมถนน ๓๔๐ -บ้านบางแอก(ฝั่งขาเข้าจังหวัดสุพรรณบุรี) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA 02	21 ก.ย.67	08.30 น.	17.00 น.	ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา /พาดสายแรงสูง	DBA2S-06 ฐาน เปิดหมอนน้ำ	ดิสชั่วคราวอยู่ข้างเลื่อน	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร.086- 0589737
	DBA 03	21 ก.ย.67	08.30 น.	17.00 น.		DBA3S-01 หน้าสฟ.ดบ.	DBA3S-02 บางแอก	
	DBA 04	21 ก.ย.67	08.30 น.	17.00 น.		DBA4S-01 หน้าสฟ.ดบ.	ดิสชั่วคราวเดินที่รถ นางบวช	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 1 ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ /ย้ายโหลด 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.809199... Long: ...100.117689...
3.2 สิ้นสุด Lat : ...14.797832... Long: ...100.108128...

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

DBA2S-06 ฐานหมอนน้ำ

DBA3S-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA2, 3, 4 จาก DBA3S-01 ถึง DBA3S-02 บางแอก

ในวันที่ ๕ ก.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชเลขที่ 1319/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัชรพงษ์ สัมพันธ์ไพฑูริย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางภาวิณี ศรีดิษฐ์

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

รจก. 7 ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. *นพส.๑๖, นพส.๑๖,
นพส.นย๑๖*

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DBA02, DBA03 และ DBA04 บริเวณบ้านบางแวก					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ก.ย. 10	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.ดบ.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ พาดสายแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1319/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	15 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช 3. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	Load 2.1 MW
4	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	Load 2.2 MW
5	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	Load 3.2 MW
6	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	Load 5.1 MW
7	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
8	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	Load 4.9 MW
9	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	
10	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	Load 2 MW
11	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA	-	
12	DAA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		นญช.	SCADA	R วัดกองเงิน
13	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R หน้าราชมงคล
14	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R หนองผักนาก
15	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปรับจาก DBA01						
16	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
17	DBA05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 วัดนางบวช
18	- ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปรับจาก LWA03						
19	DBA04S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.		SF6 บ้านดอนยาว
20	DBA04S-14	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 โรงเรียนบ้านสมเด็จ
21	- ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนไปรับจาก SPC05						
22	DBA02S-08	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
23	DBA02R-01	สับ	ปลด		สช.	SCADA	R หน้าราชมงคล
24	- ย้ายโหลด DBA02, DBA03 และ DBA04 บางส่วนไปรับจาก DBA05						
25	DBA02S-06	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนง.สามชุก
26	DBA02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ร้านเปิดหมอนน้ำ
27	DBA03S-04	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 หมอจรัญ
28	DBA03VB-01	สับ	ปลด		DBA	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	DBA04S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.		SF6	สามแยกนางบวช
30	DBA04VB-01	สับ	ปลด		DBA		-	
31	DBA03S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.3
32	DBA04S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.4
33	- เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.							
34	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS	อู่ช่างเลื่อน
35	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS	เต็นท์รถนางบวช
36	DBA03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS	บางแอก
37	ตรวจสอบ DBA02S-02 ร้านตัดผมนางบวช อยู่ในสถานะ Open+Lock คาน							
38	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ							
39	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1							
40	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2							
41	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3							
42	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4							
43	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5							
44	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G6							
45	เมื่อแจ้ง Shortground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ							
46	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้							
47	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
48	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	
49	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	
50	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
51	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	
52	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-	
53	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	
54	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		-	
55	DAA06R-03	Nonreclosing	Normal		นญช.	SCADA	R	วัดกองเงิน
56	DBA04R-06	Nonreclosing	Normal		สช.		R	หนองผักนาก
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
57	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ							
58	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
59	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	
60	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	
61	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
62	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	
63	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-	
64	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	
65	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		-	
66	DAA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		นญช.	SCADA	R	วัดกองเงิน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
67	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R	หนองผักนาก
68	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1							
69	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2							
70	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3							
71	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4							
72	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G5							
73	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G6							
74	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
75	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	อู่ช่างเลื่อน
76	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	เต็นท์รถนางบัวช
77	DBA03S-02	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	บางแวก
78	- ย้ายโหลด DBA02, DBA03 และ DBA04 บางส่วนกลับจาก DBA05							
79	DBA03S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	POT HEAD F.3
80	DBA04S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	POT HEAD F.4
81	DBA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		-	
82	DBA04S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6	สามแยกนางบัวช
83	DBA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		-	
84	DBA03S-04	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	หมอจรัญ
85	DBA02S-16	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	ร้านเปิดหมอนน้ำ
86	DBA02S-06	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	ตรงข้าม สนง.สามชุก
87	- ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนกลับจาก SPC05							
88	DBA02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สช.	SCADA	R	หน้าราชมงคล
89	DBA02S-08	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
90	- ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนกลับจาก LWA03							
91	DBA04S-14	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6	โรงเรียนบ้านสมเด็จ
92	DBA04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6	บ้านดอนยาว
93	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA01							
94	DBA05S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.		SF6	วัดนางบัวช
95	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	โรงเรียนธรรมโชติ
96	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
97	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	
98	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	
99	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	
100	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	
101	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
102	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	
103	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-	
104	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	
105	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
106	DAA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		นญช.	SCADA	R	วัดทองเงิน
107	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R	หน้าราชมงคล
108	DBA04R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R	หนองผักนาก
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								


แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line แสดงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อให้ชุดงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายวงจร DBA02

วงจร DBA02 บริเวณ DBA02S-06 ฐานเปิดหม้อน้ำ ถึง Dis ชั่วคราวอยู่ข้างลิ้น

วงจร DBA04 บริเวณ DIS DBA04S-01 หน้า สฟพ.คบ. ถึง DISชั่วคราวเต็นท์ถนงบวช

ขอทูลเกล้าฯ ถวาย/เชื่อมสายลิตติส
ชั่วคราว เต็นท์ถนงบวช

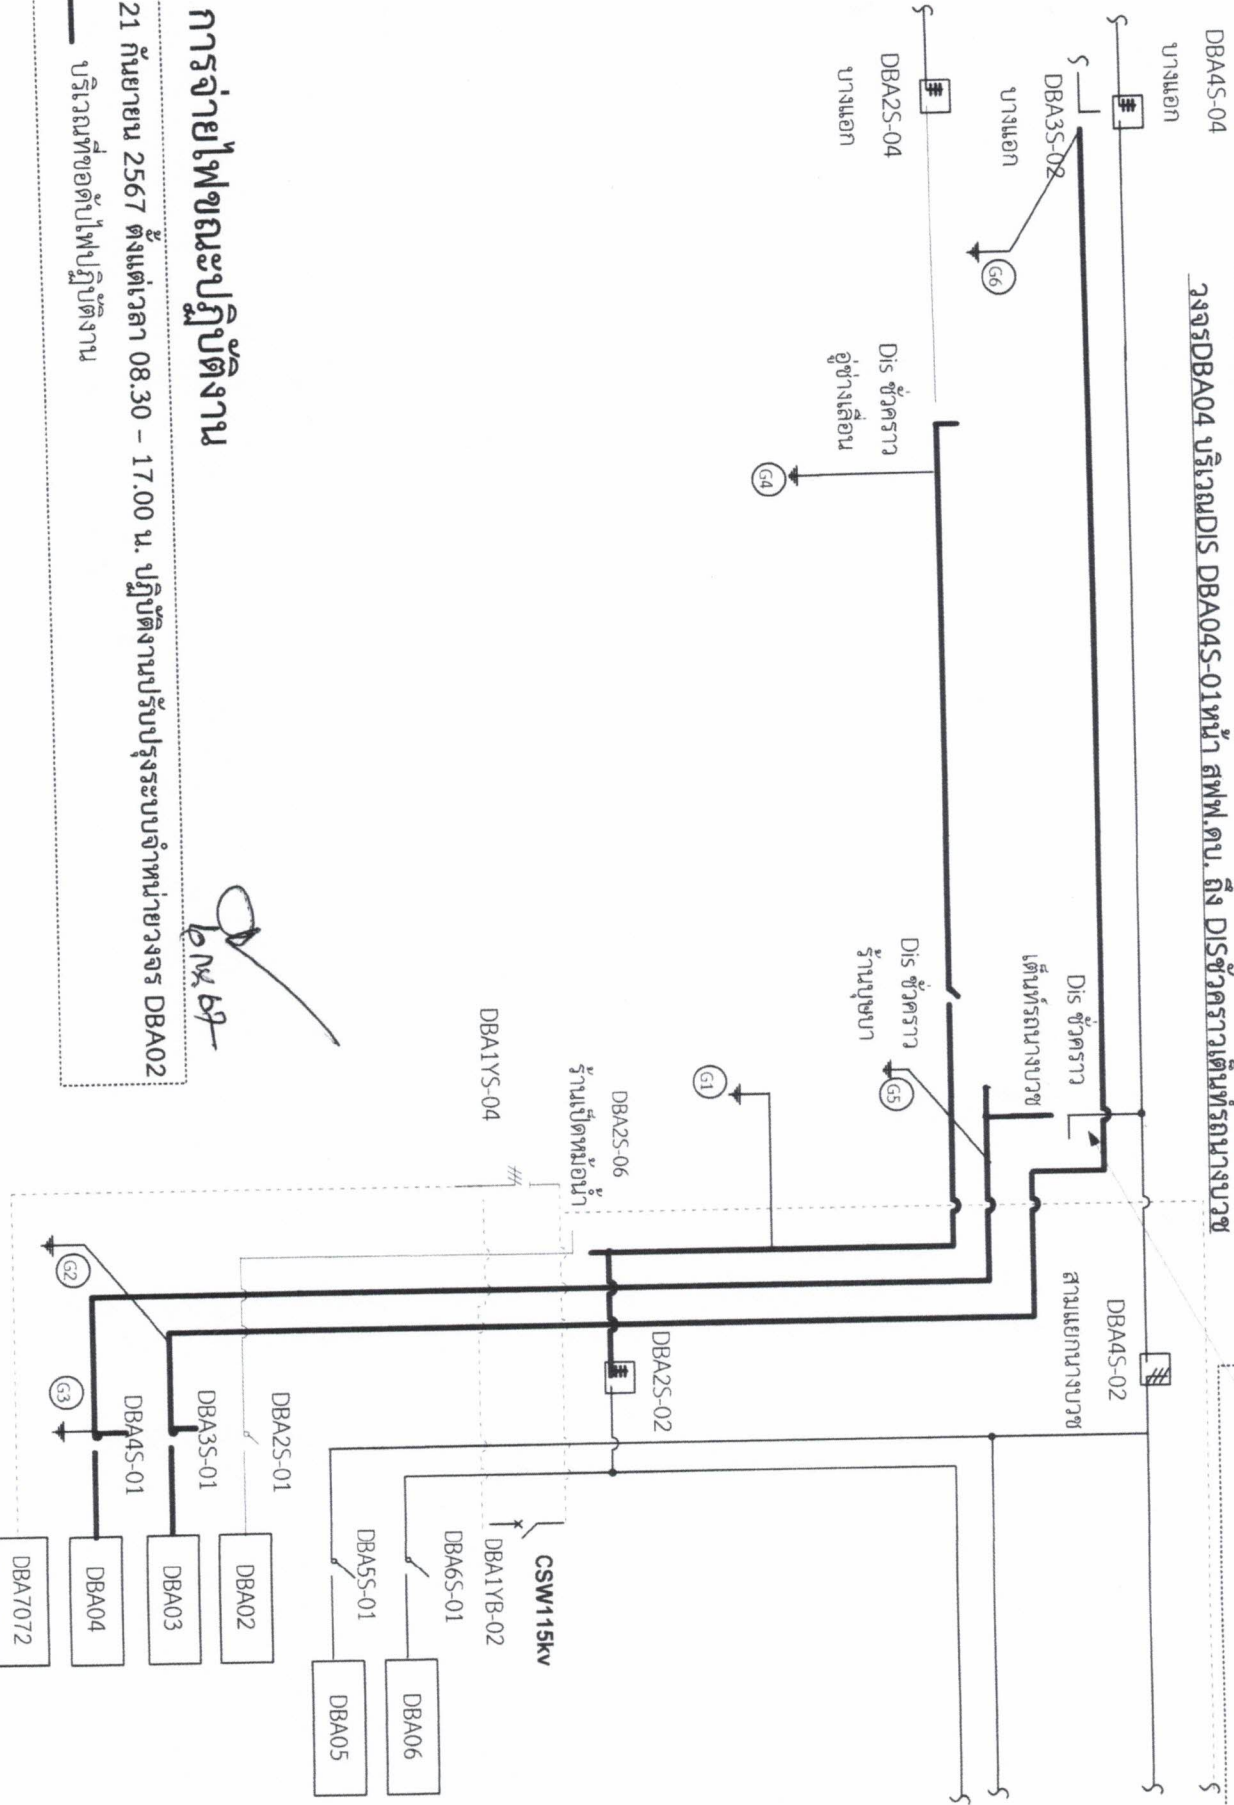

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

1. วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายวงจร DBA02

หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

BN 69



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟอ.เดิมบางนางบวช
เลขที่

ถึง ผกส.กฟอ.เดิมบางนางบวช
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน

เรียน ผกส.กฟอ.เดิมบางนางบวช

ด้วย ผกส.กฟอ.เดิมบางนางบวช มีแผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. (ได้แนวสายส่งระบบ ๑๑.๕ เควี.) บริเวณ ริมคลองตลาดนางบวช ถึง บ้านวังสำเภาลุ่ม ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ (ฝั่งเข้าสู่สุพรรณบุรี) ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ตามอนุมัติที่ ก.๓ กวว.(วร.) - ๑๖๔๕/๒๕๖๖ ลว. ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ WBS: P-TDD๐๒.๓+DBGIA๐๐๑๔ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวและมีปริมาณงานที่จะดำเนินการดังนี้.

๑. ปักเสาขนาด ๑๒.๒๐ ม.	จำนวน ๒ ต้น
๒. รื้อถอน/ติดตั้งหัวเสา(คอนกรีตเหล็กข้ามคลอง(จ่ายไฟ ๓ วงจร)	จำนวน ๒ ชุด
๓. ประกอบหัวเสา (CCB)	จำนวน ๓๘ ชุด
๔. รื้อถอน/ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส	จำนวน ๒ เครื่อง
๕. รื้อถอน/ติดตั้งสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๑๘๕ ต.มม.	ระยะทาง ๑.๕ วงจร.กม.
๖. รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา	จำนวน ๕๙ ต้น
๗. รื้อถอนเสา ขนาด ๑๔ ม.	จำนวน ๖ ต้น
๘. ตัดหัวเสา ขนาด ๑๔ ม.	จำนวน ๙ ต้น

ในวันเสาร์ที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ทั้งนี้หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลากำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(นายวุฒิชัย โพธิ์พันธ์)

ผ.ก.ส.กฟอ.เดิมบางนางบวช

๖ กันยายน ๒๕๖๗

- ผ.ปบ.

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้
ผู้ใช้ไฟทราบต่อไป

ร.ก.ก.(ท)ปฏิบัติงานแทน

ผกส.กฟอ.เดิมบางนางบวช

๖ กันยายน ๒๕๖๗
