



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

6 ก.ย. 66

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายทัศนีย์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟภ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอน ปักเสาและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี๑ แยกหมอบแพทย์-ก่อนศูนย์เยาวชน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑... แผ่น ดังนี้

| พิดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|----------|--------------|-------------|---------|--|-----------|--------------------|-------------------------------------|
| ๗ สพ.๑ | ๙/๐๙/๖๖ | ๐๘.๐๐ | ๑๗.๐๐ | รื้อถอนเสาและพาดสายแรงสูง SAC ๑๘๕ ต.มม. | SPA๐๗S-๑๑ | DDE ศูนย์เยาวชน | โทร.๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙ นายวรพล สุทธิไกร |
| ๒ | | | | | SPA๐๗S-๐๕ | DDE หมอบแพทย์ | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสนทกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พทง.๖ (สข) โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟภ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 พิดเดอร์

ในวันที่ 9 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1319/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย สมุทร วัฒนิกเศรษฐกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสนทกร สุวรรณประทีป
1 ก.ย. 66

สมุทร วัฒนิกเศรษฐกิจ
นายสมุทร วัฒนิกเศรษฐกิจ
วอ.๖ ทุ่งสว่างแทน น.๖.๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.สพ.

อก.บช.(ก.๓),

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | |
|------------------------|--|----------|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | แยกหมอสองแพทย - ก่อนศูนย์เยาวชน | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 9-ก.ย.-66 | ระหว่าง | 08.00 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟจ.สพ. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1319/66 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | <u>พิชชา</u> | | วันที่ 1 กันยายน 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 1 กันยายน 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | วันที่ 1 กันยายน 2566 |
| | 1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| | 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโษ | | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
| | 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีร์วัชร, นายอมร | | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|----------------------------|---|--------------------------------------|-----------|------|--------------|------------|----------|
| 1 | SPA07VB-01 | Auto | Manual | | SPA | | - |
| 2 | SPA10VB-01 | Auto | Manual | | SPA | | - |
| 3 | เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น. | | | | | | |
| 4 | ตรวจสอบ SF6 บ้านจอตรด รหัส SPA07S-11 ให้อยู่ตำแหน่ง OFF พร้อมล็อกคาน | | | | | | |
| 5 | ตรวจสอบ SF6 ลานจอตรด รหัส SPA07S-05 ให้อยู่ตำแหน่ง OFF พร้อมล็อกคาน | | | | | | |
| 6 | แจ้ง กฟจ.สุพรรณบุรี โหลด บริเวณแยกหมอสองแพทย - ก่อนศูนย์เยาวชน | | | | | | |
| 7 | เมื่อ กฟจ.สุพรรณบุรี โหลด บริเวณแยกหมอสองแพทย - ก่อนศูนย์เยาวชน แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 8 | แจ้งให้ Hotline ตัด DDE บริเวณศูนย์เยาวชน (SPA07) | | | | | | |
| 9 | เมื่อ Hotline ตัด DDE บริเวณศูนย์เยาวชน แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 10 | แจ้งให้ Hotline ปลด PG โหลดแยก บริเวณหมอสองแพทย (SPA10) | | | | | | |
| 11 | เมื่อ Hotline ปลด PG โหลดแยก บริเวณหมอสองแพทย แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 12 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 | | | | | | |
| 13 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 | | | | | | |
| 14 | เมื่อ กฟจ.สพ. แจ้ง Short ground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 15 | แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ | | | | | | |
| 16 | SPA07VB-01 | Manual | Auto | | SPA | | - |
| 17 | SPA10VB-01 | Manual | Auto | | SPA | | - |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 18 | เมื่อ กฟจ.สพ. ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 19 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1 | | | | | | |
| 20 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2 | | | | | | |
| 21 | SPA07VB-01 | Auto | Manual | | SPA | | - |
| 22 | SPA10VB-01 | Auto | Manual | | SPA | | - |
| 23 | แจ้งให้ Hotline เชื่อม DDE บริเวณศูนย์เยาวชน (SPA07) | | | | | | |
| 24 | เมื่อ Hotline เชื่อม DDE บริเวณศูนย์เยาวชน แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 25 | แจ้งให้ Hotline เชื่อม PG โหลดแยก บริเวณหมอสองแพทย (SPA10) | | | | | | |
| 26 | เมื่อ Hotline เชื่อม PG โหลดแยก บริเวณหมอสองแพทย แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 27 | ปลดล็อกคาน SF6 ลานจอตรด รหัส SPA07S-05 ให้อยู่ตำแหน่ง FREE | | | | | | |
| 28 | SPA07VB-01 | Manual | Auto | | SPA | | - |
| 29 | SPA10VB-01 | Manual | Auto | | SPA | | - |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟง.สพ.

ถึง ผจก.กฟง.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟง.สพ./รจก.กฟง.สพ.

ด้วยในวันที่...๙...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๖๖... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับ

ไฟฟ้าบริเวณ ...แยกหมอ๒แพทย์-ก่อนศูนย์เยาวชน...เพื่อ...รื้อถอน,ปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี...โดยมี


รายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีคเตอร์ ...๗. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ...แยกหมอ๒แพทย์-ก่อนศูนย์เยาวชน...

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นาย ปรีชา ทองระย้า พชง.๖ ผจก.กฟง.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ...๐๙๐-๑๔๓๕๑๑๔...

เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร ...ตำแหน่ง ผ.กส.กฟง.สพ...เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐...

เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

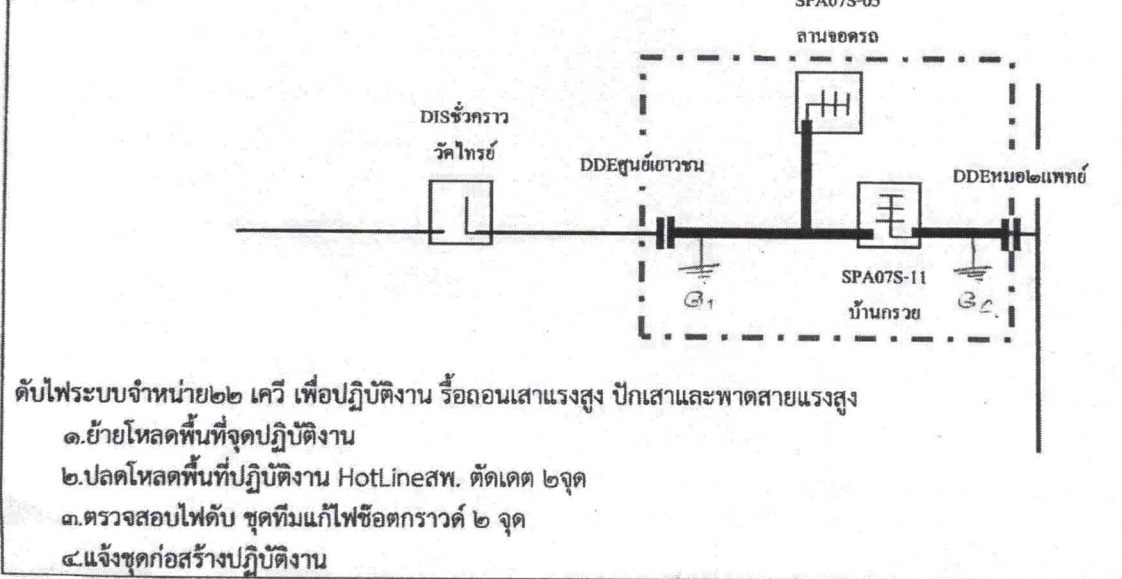

ดับไฟระบบจำหน่าย๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนเสาแรงสูง ปักเสาและพาดสายแรงสูง

๑.ย้ายโหนดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน

๒.ปลดโหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน HotLineสพ. ตัดเคด ๒จุด

๓.ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อผิดพลาด ๒ จุด

๔.แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพิพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พชง.๖(สข.) ผบ.กฟง.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐
