



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญขอดับไฟ

Switching Deadline

6 ก.ย. 66

เลขที่ ก.๓.สพท.(ปบ.) 03203
ชื่อผู้รับ นายพิชานันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์
ชื่อผู้ส่ง นายพิชชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนเสา สาย๑๘๕SAC ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑

แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAD๐๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ดับไฟเปลี่ยนเสา สาย๑๘๕SAC ช.กาเพชร	จุดปลดPGปาก ช.กา เพชร	Dis ชั ว ๓ ร าว ใ ต้ ไลน์EGAT	นายนิวัฒน์ กุลครอง ๐๘๓-๗๑๐๒๒๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ปาก.ช.กาเพชร - หน้าที่เอเรสซิเดนซ์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ นุกนิม ตำแหน่ง ช.บ.บ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายพิชชา ตันยิตเส็ง)

ร.จ.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SAD๐๖ จากจุดปลด PG ช.กาเพชร ถึง Dis on the line EGAT

ในวันที่ 10 ก.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1327/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ พิดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____

ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ พิดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____

ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ พิดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____

ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ ไชยมะณี ประสานงานการขอดับไฟกับ อ.ก.บ.บ.บ. นุกนิม

(นาย จักรพันธ์ ๒๖ จ.ล.บ.)

ว.ค. 5 ๖๓๓ ๒๕, ๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ผจก.กฟอ.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง _____ แผ่น

แผนผังแนบ _____ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผจก. _____ (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปาก ซ.กาเพชร - ทีเอเรสซิเดนซ์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ก.ย. 2566	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย SAD06 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1327/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 3 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวิริวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ							
1.สับ/เปลี่ยน OYI05F-01 (D/O ปาก ซ.กาเพชร) เป็น DIS							
2.ปรับปรุงระบบจำหน่าย SAD06 ตั้งแต่ OYI05F-01 (D/O ปาก ซ.กาเพชร) - DIS ชค.ใต้ไลน์ EGAT เป็น สาย SAC 185							
3.Check Phase ที่ต้น DIS ชค.ใต้ไลน์ EGAT							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ DIS ชค.ใต้ไลน์ EGAT วงจร SAD06 ไขมดเปิดวงจรอยู่ทั้ง 3 เฟส						
3	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		CB
4	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
5	OYI05F-01	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพร.		D/O ปาก ซ.กาเพชร
6	แจ้งกพอ.สพร. ให้ชุดซอทไลน์ 22 เควี ปลดจุดจัม PG ก่อนเข้า OYI05F-01 (D/O ปาก ซ.กาเพชร) ตามผังแนบ แบบมีไฟได้						
7	เมื่อกพอ.สพร. แจ้งชุดซอทไลน์ 22 เควี ปลดจุดจัม PG ก่อนเข้า OYI05F-01 (D/O ปาก ซ.กาเพชร) แล้วเสร็จ						
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
12	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		CB
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
18	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		TP1
19	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		CB
20	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		CB
21	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		TP1
22	OYL04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		CB
23	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
24	แจ้งกพอ.สพร. ให้ชุดซอทไลน์ 22 เควี เชื่อมจุดจัม PG ก่อนเข้า DIS ชค.ปาก ซ.กาเพชร (ตามผังแนบ) แบบมีไฟได้						
25	เมื่อกพอ.สพร. แจ้งชุดซอทไลน์ 22 เควี เชื่อมจุดจัม PG ก่อนเข้า DIS ชค.ปาก ซ.กาเพชร แล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	DIS ชค. SAD06	ปลด	สับ		สพร.		DIS ปาก ช.กาเพชร
27	แจ้งกพอ.สพร. ให้ชุดขอทไลน์ 22 เควี Check Phase ที่ต้น DIS ชค.ใต้ไลน์ EGAT ได้						
28	เมื่อกพอ.สพร. แจ้งชุดขอทไลน์ 22 เควี Check Phase ที่ต้น DIS ชค.ใต้ไลน์ EGAT เรียบเสร็จ						
29	- ย้ายโหลด SAD06 บางส่วน กลับจาก OYL04						
30	OYL04S-04	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ช.วัดคลองอ้อมใหญ่
31	DIS ชค. SAD06	ปลด	สับ		สพร.		DIS ใต้ไลน์ EGAT
32	DIS ชค. SAD06//OYL04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS กว๊วยเตี้ยบ้านสวน
33	OYL04S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ช.วัดคลองอ้อมใหญ่
34	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		TP1 -
35	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		CB -
36	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		CB -
37	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		TP1 -
38	OYL04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		CB -
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ เปลี่ยนเสา, สาย๑๕๕SAC ซ.กาเพชร(ก่อนทำ)

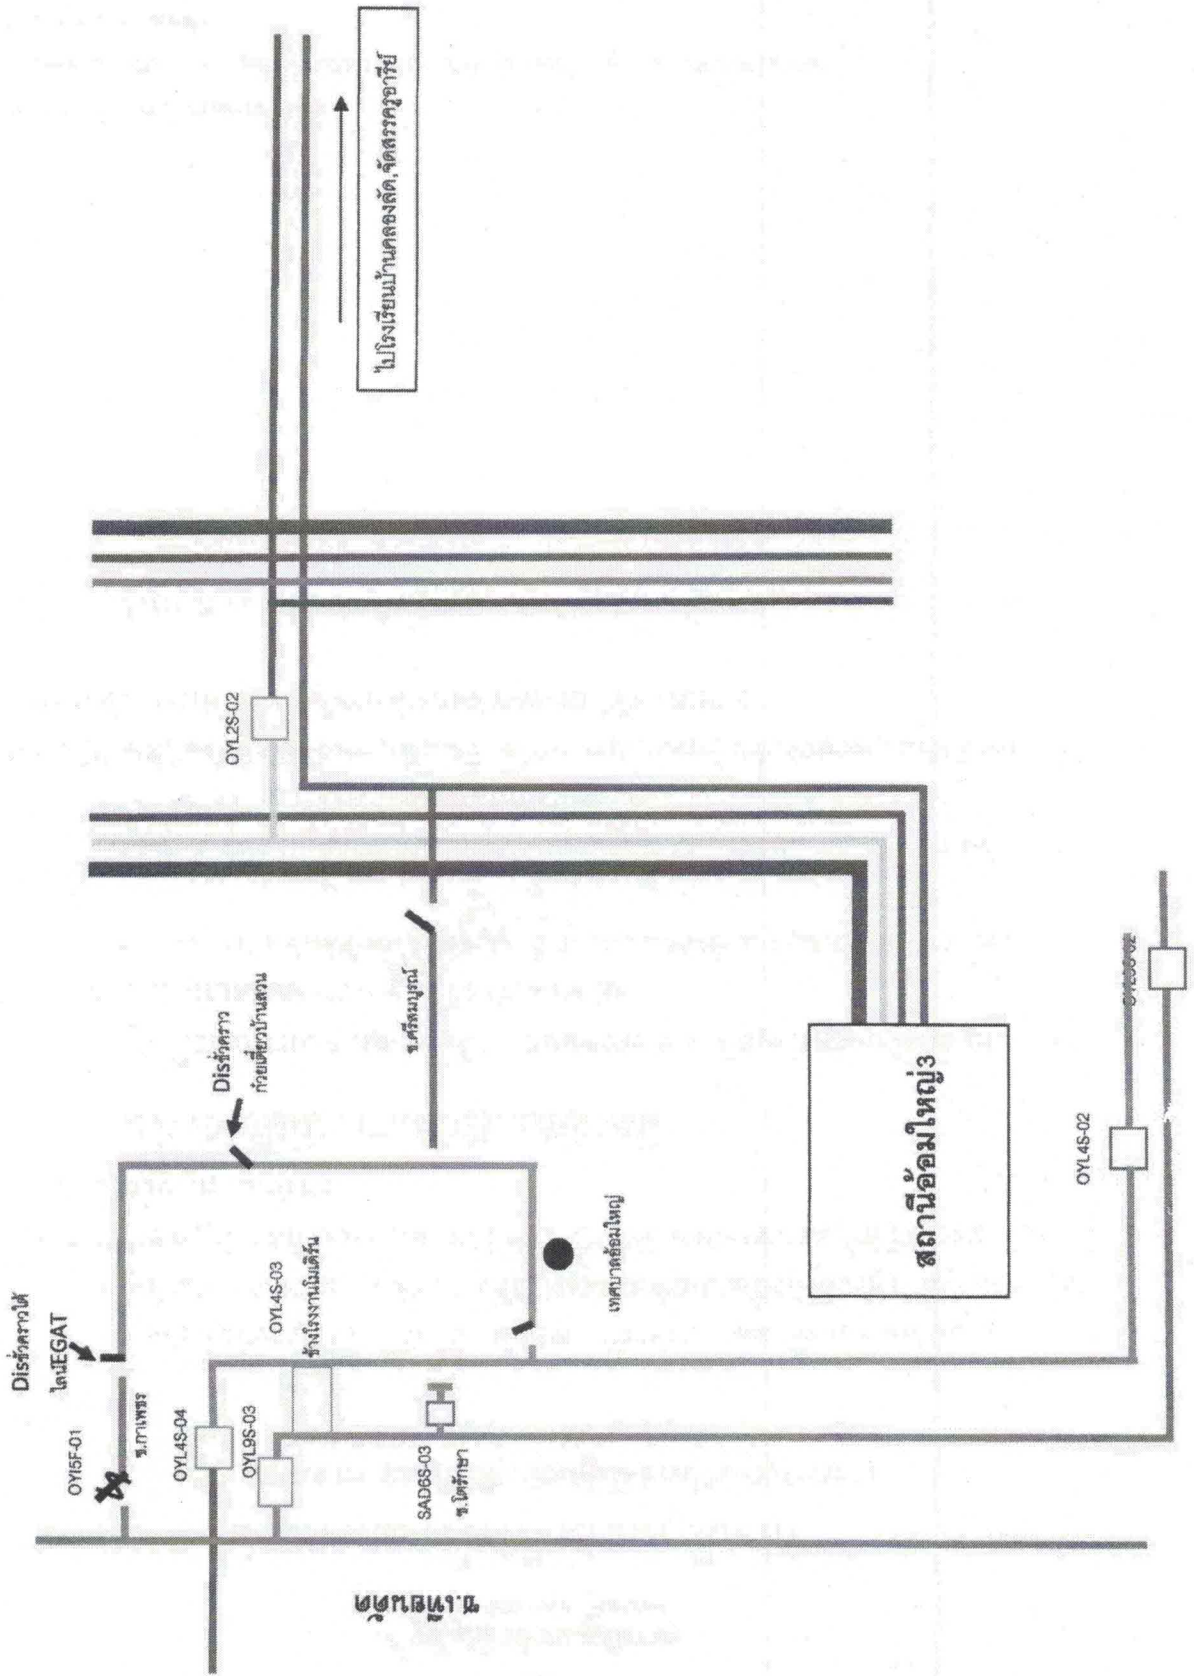

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ เปลี่ยนเสา, สาย๑๘๘SAC ซ.กาเพชร(ช่วงปฏิบัติงาน)

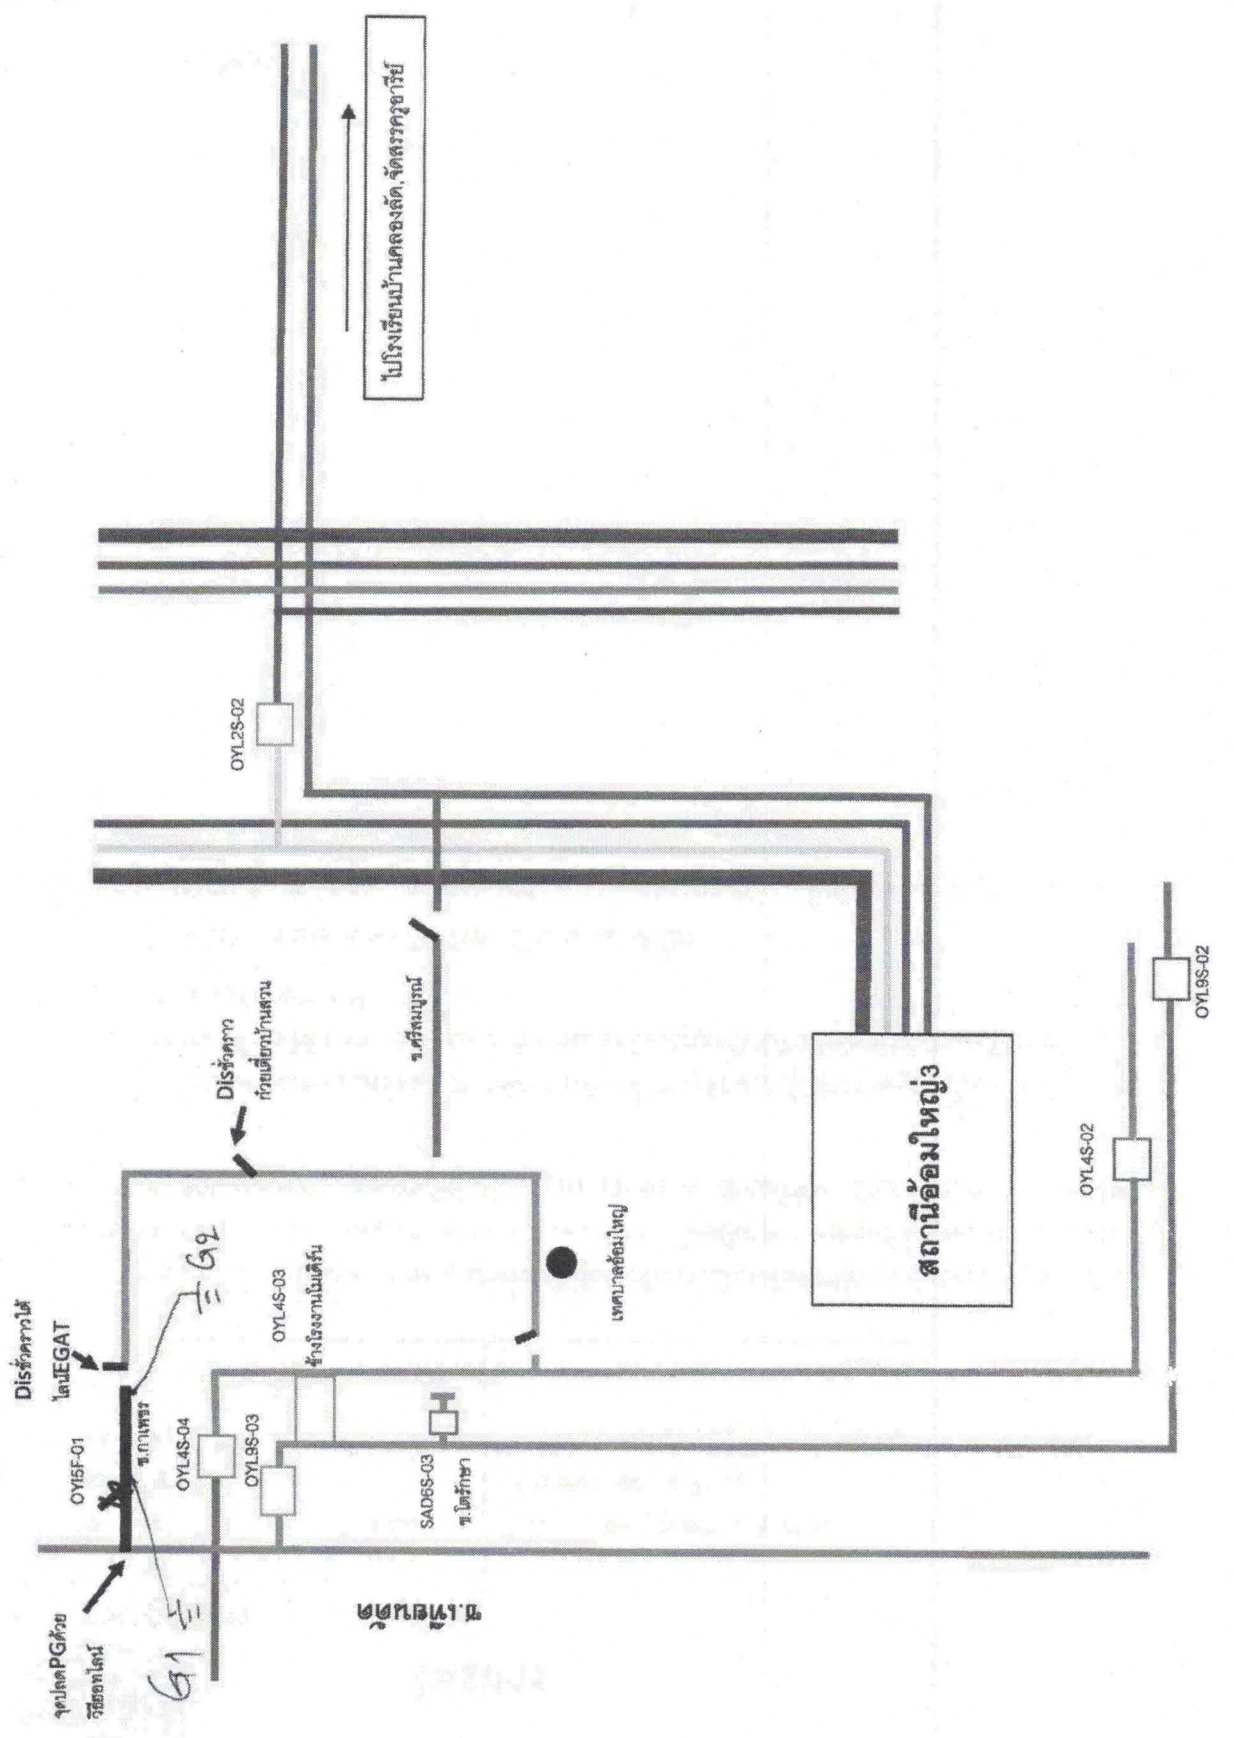

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ เปลี่ยนเสา, สาย๑๘๕SAC ช.กาเพชร(หลังปรับปรุงเสร็จ)

