

RR การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓ พทท. ๒๐๒๖ / ๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน


ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง  
 สังเขปนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๑๑-๑๒ ก.ย.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	ดิสชั่วคราว ห้องแถววัด สระลงเรือ	ดิสชั่วคราว บ้านรอกตาโพธิ์	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๒	UTG05	๑๓-๑๔ ก.ย.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	SF6 แยกไฟสี	ดิสชั่วคราว ร้านเจ๊บุ	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๓	UTG05	๑๕-๑๖ ก.ย.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	ดิสชั่วคราว บ้านรอกตา โพธิ์	ดิสชั่วคราว แยกตลงเหนือ	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ช.ผ.ก.ป. โทร. ๐๘๘-๓๑๖๒๐๑๘

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
 ๓.  พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๓๕๙๘๖, long: ๙๙.๗๕๕๒๑๙  
 ๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๔๐๘๖๖๙, long: ๙๙.๗๒๘๘๙๘

ลงชื่อ 

(นายสุรวุฒิ บุญนาค)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ UT05 จาก PIS ต. กบ.ตาโพธิ์ ถึง PIS ต. หด.ตาโพธิ์  
 ในวันที่ 15-16 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1328/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิมล รัชชตรีโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอดับไฟกับ ผอ.อ.ตาโพธิ์ ชำนาญเรือ

11 ก.ย. 67

  
 (นายวิมล รัชชตรีโพธิ์แก้ว)  
 ๖๕๖.๖ ทุ่งบัวทอง พนมทวน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล.หนน, กฟล.ลย, กฟล.อุท

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ - เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ UTG05 บ้านกรอกตาโพธิ์ - แยกตลุงเหนือ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15-16 ก.ย. 56	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ 22 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1328/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 9 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรัสวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
4	UTG05R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ทกจ.	R	สละลงเรือ
5	UTG09R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ลช.	AVR	หนองประดู่
6	UTG09R-02	Normal	Non-Reclosing		ลช.	R	AVR หนองประดู่
7	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		
8	LWA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		
9	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไปรับไฟจาก LWA05						
10	UTG0BVB-01	ปลด	สับ		UTG	CB	22 kv.ชานาเมนบัส
11	LWA04S-09	ปลด	สับ		ลช.	SF6	ตรงข้าม รพ.เลขาวิญ
12	UTG05S-07	ปลด	สับ		ลช.	SF6	บ้านตลุงเหนือ
13	DIS ชค.UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลช.	DIS	บ้านตลุงเหนือ
14	UTG0BVB-01	สับ	ปลด		UTG	CB	22 kv.ชานาเมนบัส
15	LWA04S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลช.	SF6	ตรงข้าม รพ.เลขาวิญ
16	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
17	DIS ชค.UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ.	DIS	บ้านกรอกตาโพธิ์
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.พทน. ทราบ						
19	แจ้งกฟส.พทน. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
20	แจ้งกฟส.พทน. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
21	แจ้งกฟส.พทน. ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
22	แจ้งกฟส.พทน. ปฏิบัติงานได้						
23	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
24	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
25	UTG05R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ทกจ.	R	สละลงเรือ
26	UTG09R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ลช.	AVR	หนองประดู่
27	UTG09R-02	Non-Reclosing	Normal		ลช.	R	AVR หนองประดู่
28	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		
29	LWA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	หลังจากกฟส.พท.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
31	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
32	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
33	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
34	UTG05R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ทกจ.	R	สละลงเรือ
35	UTG09R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ลข.	AVR	หนองประตู
36	UTG09R-02	Normal	Non-Reclosing		ลข.	R	AVR หนองประตู
37	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		
38	LWA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		
39	แจ้งกฟส.พท.ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
40	แจ้งกฟส.พท.ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
41	เมื่อหน้างานพร้อมจ่ายไฟ						
42	DIS ชค.UTG05	ปลด	สับ		ทกจ.	DIS	หน้าห้องแถววัดสละลงเรือ
43	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนกลับคืนจาก LWA05						
44	UTG0BVB-01	ปลด	สับ		UTG	CB	22 kV.ขนานเมนบัส
45	LWA04S-09	ปลด	สับ		ลข.	SF6	ตรงข้าม รพ.เลาขวัญ
46	DIS ชค.UTG05	ปลด	สับ		ลข.	DIS	บ้านตลุงเหนือ
47	UTG05S-07	สับ	ปลด		ลข.	SF6	บ้านตลุงเหนือ
48	LWA04S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลข.	SF6	ตรงข้าม รพ.เลาขวัญ
49	UTG0BVB-01	สับ	ปลด		UTG	CB	22 kV.ขนานเมนบัส
50	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
51	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
52	UTG05R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ทกจ.	R	สละลงเรือ
53	UTG09R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ลข.	AVR	หนองประตู
54	UTG09R-02	Non-Reclosing	Normal		ลข.	R	AVR หนองประตู
55	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		
56	LWA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

16/11/2023

08/11/2023-16.01.2024

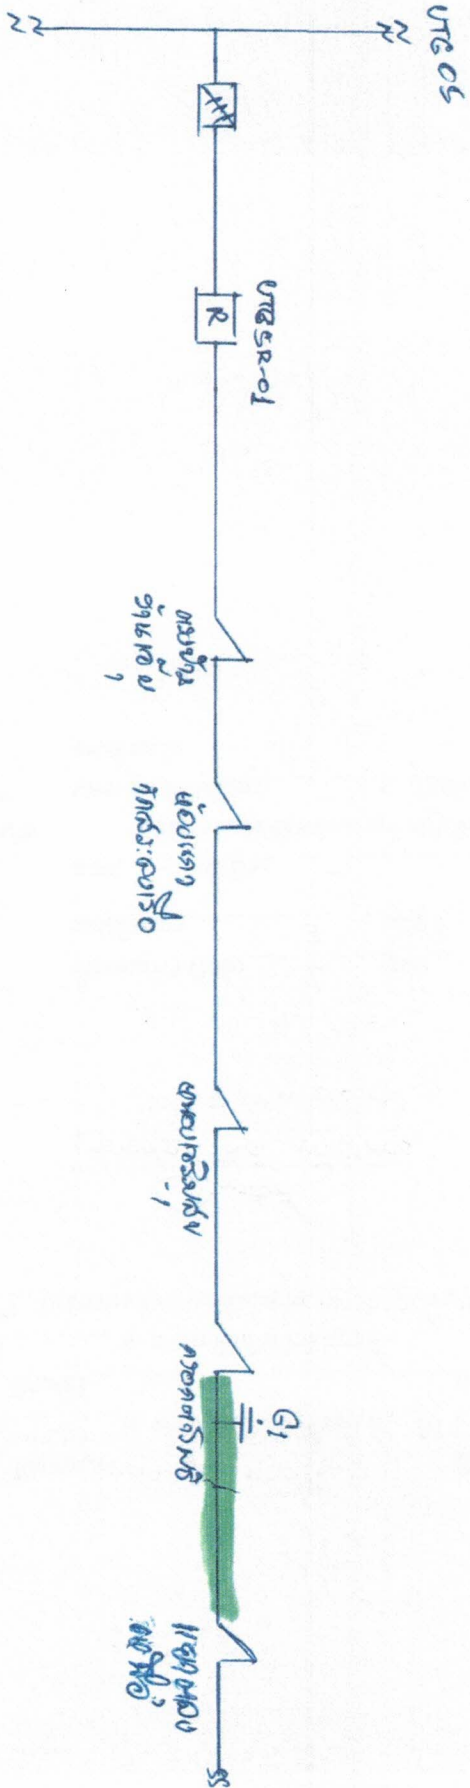

16/11/2023
