



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.ต.สทท. (กป.) ๕๓๗ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิทอนันท์ พริธาสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.ต)

ชื่อผู้ส่ง นายประเสริฐ ฝัดศิริ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สทท.

ด้วยการไฟฟ้า ส่องพี่น้อง จะขอย้ายโหลดและดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยน CT,VT ชำรุด ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F10(สทท.1) (ย้ายโหลด)	12 ก.ย. 67	09:00	13.00	สับเปลี่ยน CT , VT ชำรุด บริเวณบ้านใหม่	ลีน SPN๑๐s-05	ปลด Dis มิเตอร์ แบ่งแทน สทท - บลง.	นายทินภัทร รมดี โทร.๐๘๘-๖๖๒๒๒๖๘
๒.	F10(สทท.1) (ดับไฟ)	12 ก.ย. 67	12:00	13.00		SPN10S-06	DIS มิเตอร์แบ่งแทน สทท. - บลง.	
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บ้านใหม่ ถึง แยก บางสามสายใน.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ส่องพี่น้อง โทร ๐๘๑-๙๕๒-๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสดำรง ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๑๘๑๑๗ Long ๑๐๐.๐๙๓๓๒

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๑๘๑๑๗ Long ๑๐๐.๐๙๓๓๒

(นายประเสริฐ ฝัดศิริ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สทท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิดเตอร์ SPN10 จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ 12 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 13:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1336/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟิดเตอร์ SPN10 จาก SPN10S-06 ถึง Dis มิเตอร์แบ่งแทน สทท. - บลง.  
ในวันที่ 12 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. ถึง 13:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1336/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัตรา วงศ์บุญภักดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต

สุภัตรา

(นางสาวสุภัตรา วงศ์บุญภักดิ์)

อสก.5 แทน ผจก.กฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. .... (สถานี) .....

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. .... กฟส. สทท., กฟส. บลง

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis มิเตอร์แบ่งแดน สพน. - บลง.				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ก.ย. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน CT,VT ชำรุด		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1336/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุกัญชา วงศ์บุญมาก			วันที่	11 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีร์วัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ 1.ย้ายโหลดเพื่อ OPEN Dis มิเตอร์แบ่งแดน สพน. - บลง.						
2	2.ชุด HL ปลด PG ทั้ง 2 ด้าน						
3	3.เมื่อสับเปลี่ยน VT แล้วเสร็จ ขอดับไฟตั้งแต่ SPN10S-06 ถึง Dis มิเตอร์แบ่งแดน สพน. - บลง. เพื่อเชื่อม VT						
4	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
5	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		
6	SPN10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		
7	ย้ายโหลด SPN10 บางส่วนไปรับไปจาก SPN01						
8	SPN01S-05	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 ทองประดิษฐ์
9	Dis แบ่งแดนในไลน์ SPN10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.		DIS มิเตอร์แบ่งแดน สพน.-บลง.
10	แจ้งสถานะการจ่ายไฟ ให้ กฟส.สพน. รับทราบ						
11	แจ้งชุด HL ทำการลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
12	เมื่อชุด HL ทำการปลด PG แล้วเสร็จ						
13	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		
14	SPN10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</u>							
15	เมื่อปฏิบัติงานสับเปลี่ยน VT แล้วเสร็จ พร้อมดับไฟ						
16	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
17	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		
18	SPN10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		
19	เมื่อพร้อมดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน						
20	SPN10S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.		DIS แยกบางสามสายใน
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กฟส.สพน. รับทราบ						
22	แจ้งชุด HL ปฏิบัติงานได้						
23	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		
24	SPN10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง</u>							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จพร้อมรับไฟ						
26	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง						
27	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		
28	SPN10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		
29	ย้ายโหลด SPN10 บางส่วนกลับจาก SPN01						
30	SPN10S-06	ปลด	สับ		สพน.		DIS แยกบางสามสายใน
31	Dis แบ่งแดนในไลน์ SPN10	ปลด	สับ		สพน.		มิเตอร์แบ่งแดน สพน.-บลง.
32	SPN01S-05	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 ทองประดิษฐ์
33	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		
34	SPN10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง</u>							

# แผนผังการย้ายโหลดและดับไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง

วันที่ 12 ก.ย. 67 เวลา 09.00-13.00 น.

บริเวณ บ้านใหม่

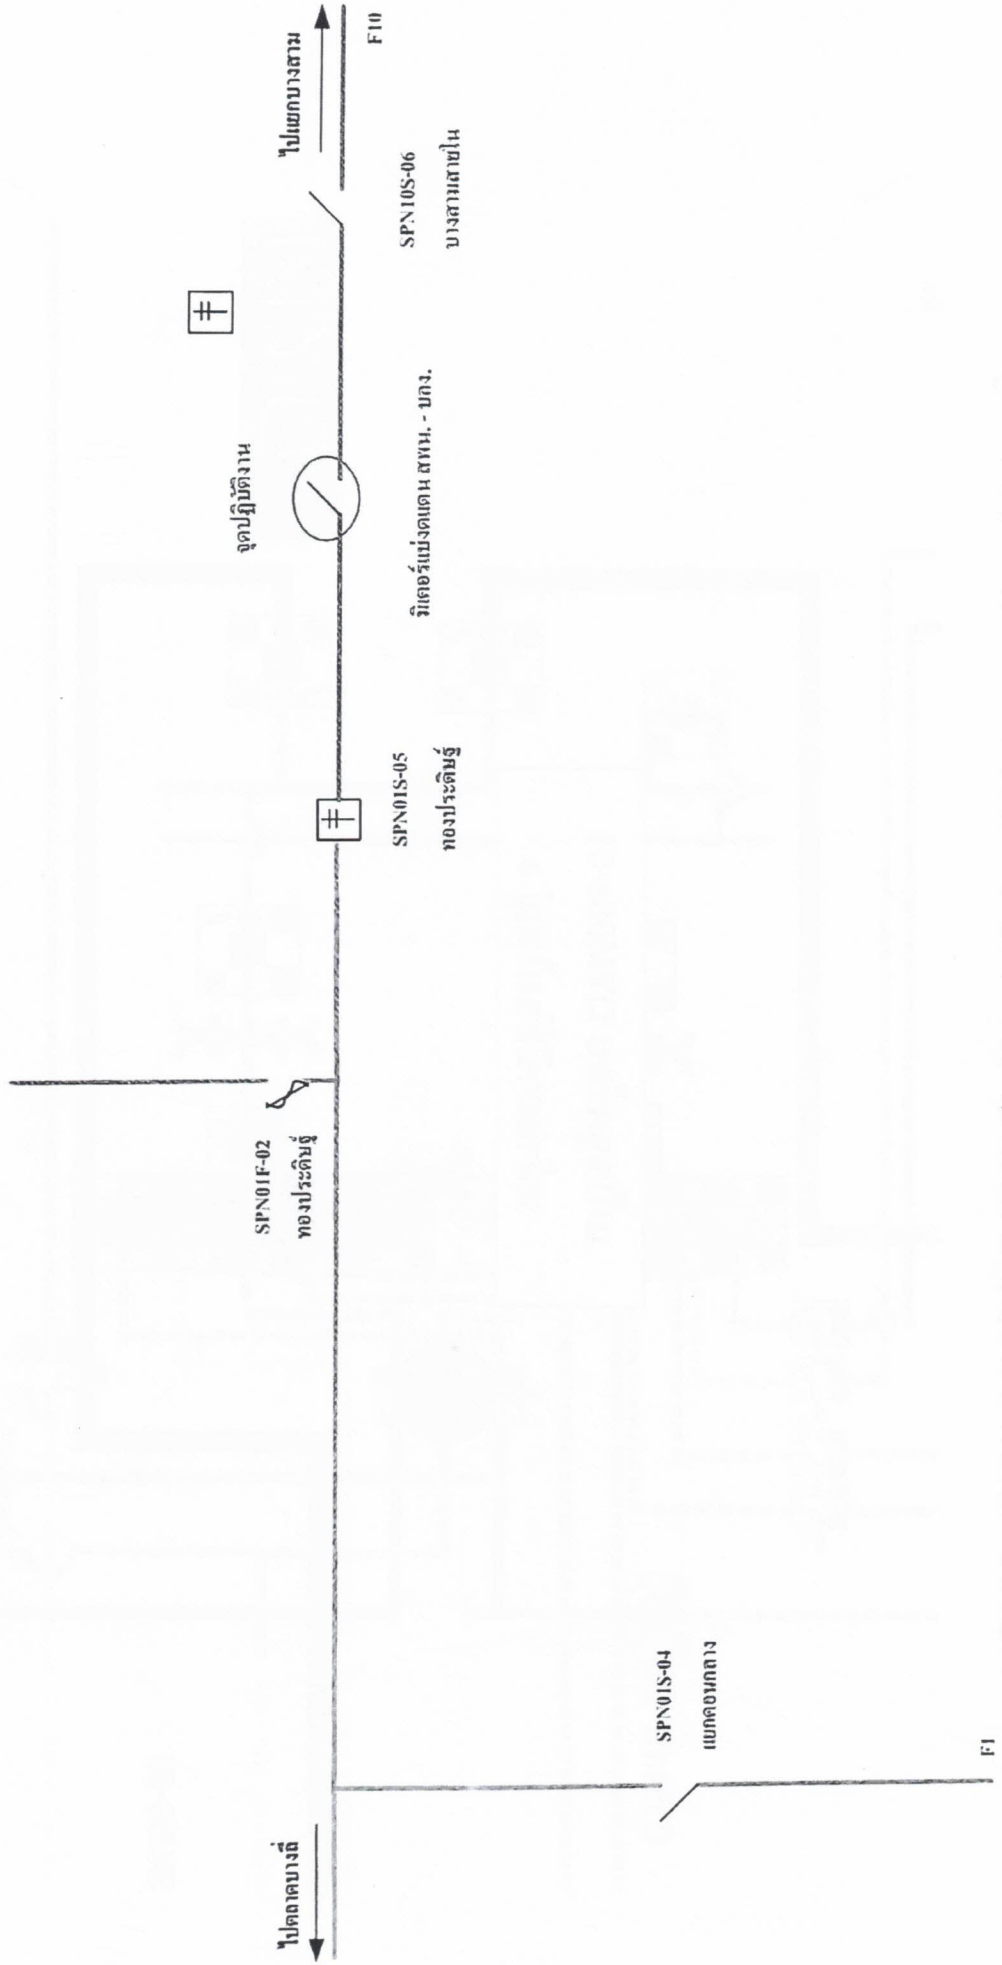

หมายเหตุ ปฏิบัติงานโดยชุด ออกได้กระแส
