



วิทยุขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปป) ๕๗/๒๕๖๘
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยัคเส็ง
 จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘
 ตำแหน่ง อก.ปป.(ก๓)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า สาขาบ่อพลอย ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายเสาแรงสูง ในไลน์ หลัง R บ้านหนองขอน รหัส BOU๐๑S-๑๐ บ้านหนองขอน ม.๔ ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี สถานีไฟฟ้าบ่อพลอย ๒ สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ๒ ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑ สถานีฯ บ่อพลอย ๒	๒๔ ม.ค. ๖๘	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ย้ายเสาแรงสูง ในไลน์ หลัง Recloser หนองขอน รหัส BOU๐๑R-๐๒	DIS ชด. ก่อนถึง บ้านม่วงเฒ่า หลังRecloser หนองขอน รหัส BOU๐๑R-๐๒	DIS ตัดไลน์ บิมน้ำมัน PT บ้านม่วงเฒ่า BOU๐๑S-๑๐	นายวิชณุ มีผล พงง.๖(ปป.) โทร.๐๘๒- ๒๔๒๔๖๘๘

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนเรศ พูลพจน์ ตำแหน่ง พงง.๖ (สข) โทร.๐๘๔-๒๔๖๘๔๖๔
 ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายวิชณุ มีผล ตำแหน่ง พงง.๖(ปป.) โทร.๐๘๒-๒๔๒๔๖๘๘

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด (๑.๒)ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
 (นายพิชา ตันยัคเส็ง)
 ผจก.กฟส บ่อพลอย

ตำแหน่ง.....

ลงทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เลขทะเบียน.....

วันที่.....

ผู้ส่ง.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / ฟีดเดอร์ BOU จาก DIS ด่านขมิ้นม่วง ถึง BO01S-10
ในวันที่ 24 ธ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 133/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชชา กลิ่นประสู ประสานงานขอดับไฟกับ นายชวต นพวงแก้ว
17 ธ.ค. 68

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. น.ส. นพ.ร.

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนทำสวิตชิ่ง 2 แผ่น

แผ่นผังแนบ 2 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย.

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไปจนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านหนองขอน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ม.ค. 68	เวลา	09.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บพล.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 133/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	18 มกราคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 มกราคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 มกราคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต 3. นางสาวพิชชา, นางสาวสุกษา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU		-
3	BOU01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		หปร.		R บ้านหนองขอน
4	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		AVR ทุ่งแสม
5	DAA09R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	SCADA	R ปลักประดู่
6	ย้ายโหลด BOU 1 บางส่วนไปจ่ายจาก DAA 9						
7	BOU01S-09	ปลด	ล๊ับ		หปร.	SCADA	SF6 สี่แยกหนองผักแว่น
8	DAA09S-28	ปลด	ล๊ับ		หปร.		SF6 ตรงข้ามปากทางเข้าห้วยองค์ต
9	BOU01S-10	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หปร.		DIS บัมน้ำมัน PT ตลาดม่วงเฒ่า
10	BOU01S-09	ล๊ับ	ปลด		หปร.	SCADA	SF6 สี่แยกหนองผักแว่น
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
12	DIS ชค.ไลน์ BOU01	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หปร.		DIS ชั่วคราวก่อนบ้านม่วงเฒ่า
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
14	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อกกราวด์ จุด G1						
15	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อกกราวด์ จุด G2						
16	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และซ็อกกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
17	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
18	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU		-
19	BOU01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		หปร.		R บ้านหนองขอน
20	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR ทุ่งแสม
21	DAA09R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	SCADA	R ปลักประดู่

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

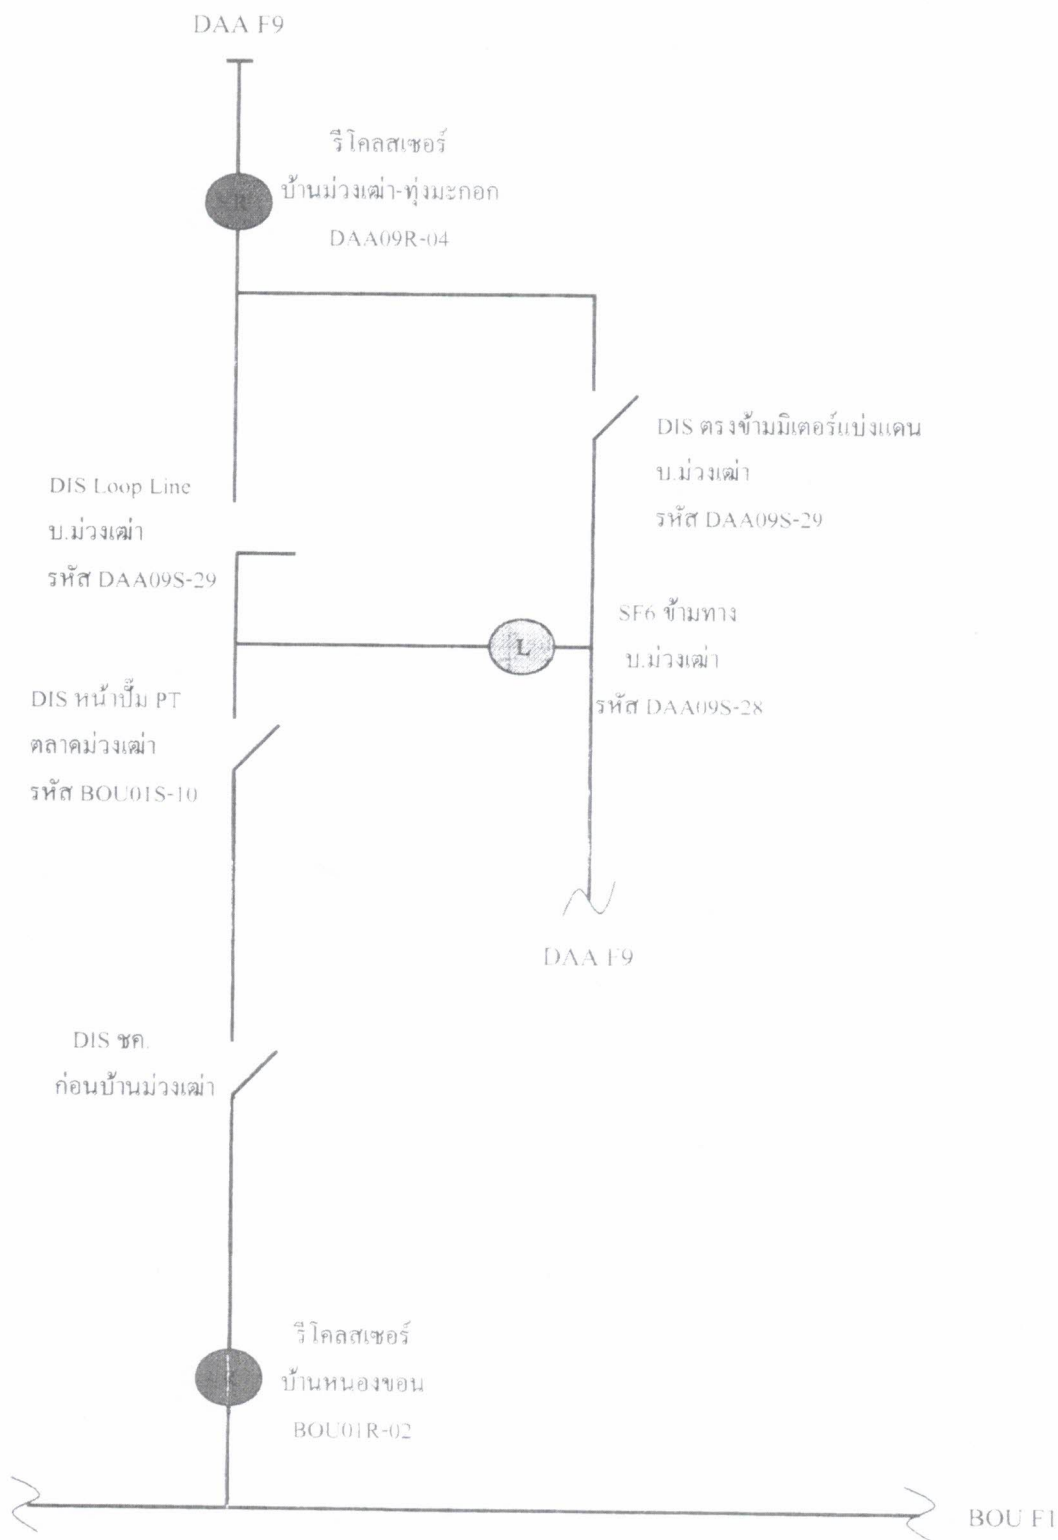

14 ม.ค. 67

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

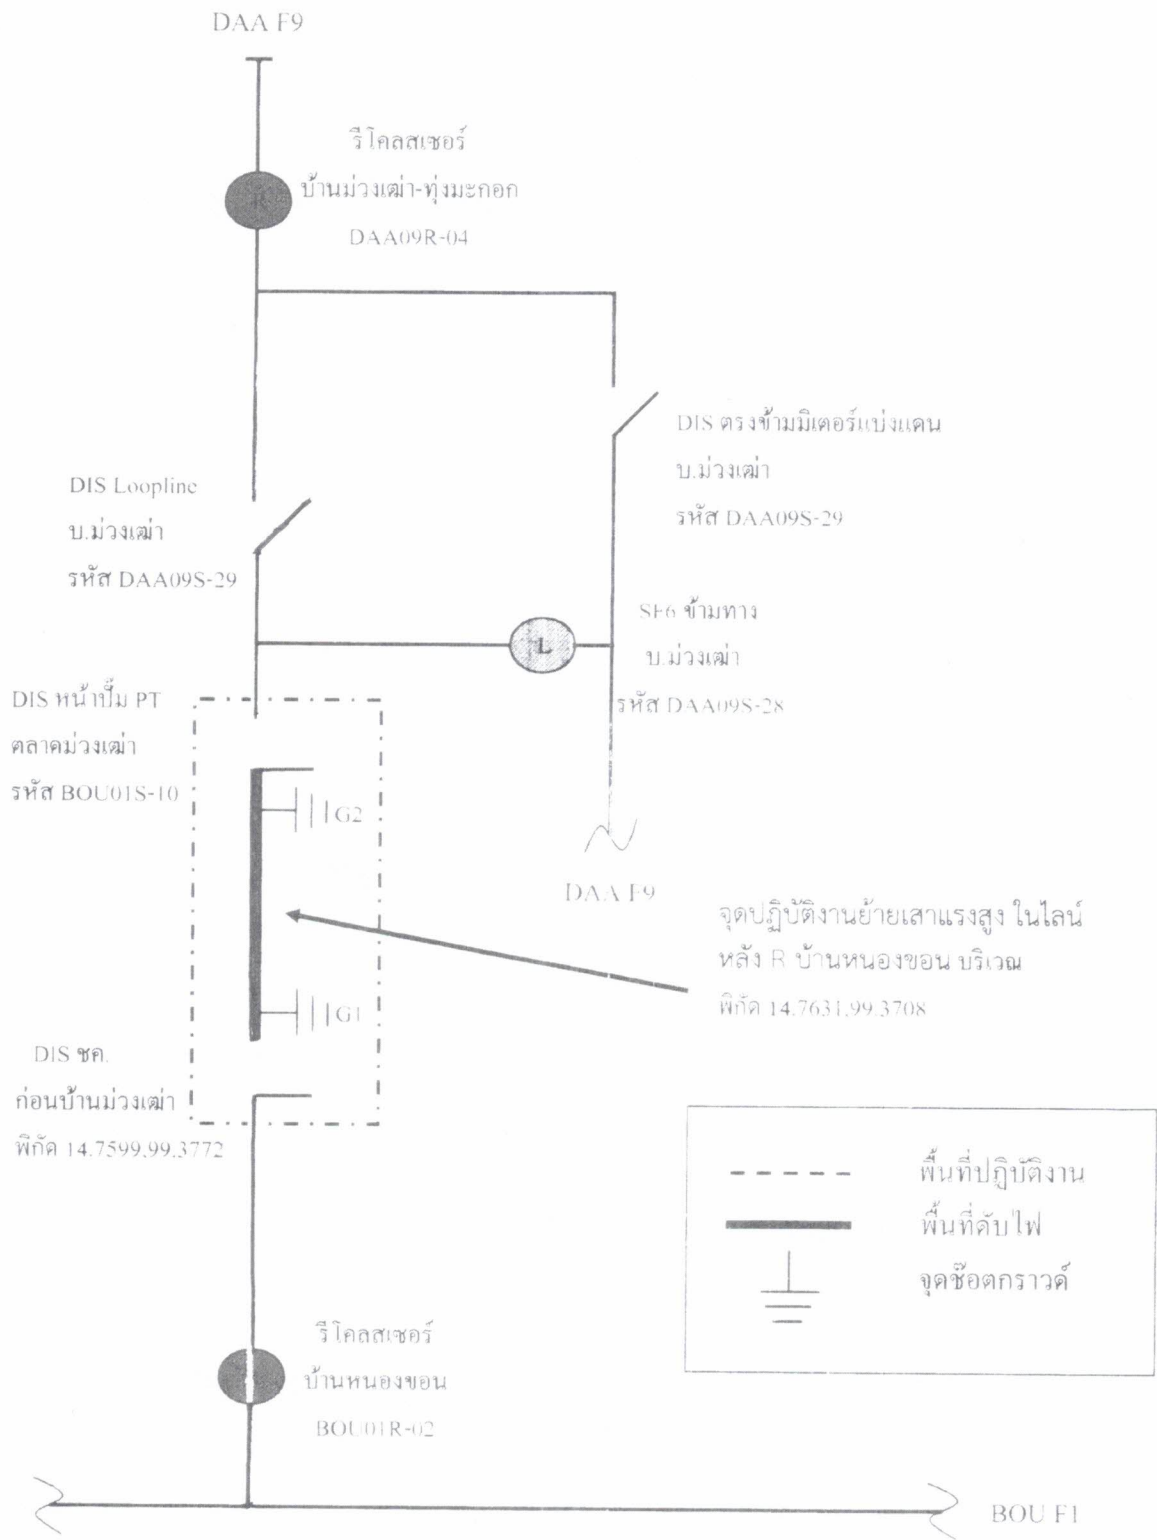

	พื้นที่ปฏิบัติงาน
	พื้นที่ดับไฟ
	จุดช็อตกราวด์

14.20.03
