



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ) 905 /2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พุทธิราศุวรรณพิล
ชื่อผู้ส่ง นายสมนัติ ยศศักดิ์ศรี

Switching Deadline

13/09/67

วันที่ 12 ก.ย. 2567
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟวงจร DAA ๐๕ เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กฟอ.ดบ.ปฏิบัติงานเชื่อมสายนำรีโคสเซอร์ DAA๕R-๐๑ หนองหิน เข้าระบบ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
1.	DAA 05	14 ก.ย.67	09.00 น.	12.00 น.	เชื่อมสายนำรีโคสเซอร์ DAA๕R-๐๑ หนองหิน เข้าระบบ	จุดปลดสายแยกริม คลองเข้า DAA๕R-๐๑ หนองหิน	ดิสชั่วคราวต้นโพธิ์ ใหญ่	นายศกนรินทร์ แก้วปานกัน โทร.080- 9634693

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ ๓ ต.หนองกระทุ่ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ขผ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.869737... Long: ...99.844308.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ...14.89096... Long: ...99.840535.....

ลงชื่อ.....

(นายสมนัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

ในวันที่ 14 ก.ย. 67 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ DAA5 จาก หนองกระทุ่ม ถึง 1341/67
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

ในวันที่ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ตั้งเวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ กตม๑ ประสานงานการขอตัดไฟกับ วรรณวิทย์ ศรีศักดิ์

(นายสมนัติ ยศศักดิ์ศรี)
๑๓.๙ ๓๓๖ ๓๖๑๓

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ.ดบ.
อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๕ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลขพงษ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหนองหิน						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.ย. 67	ระหว่าง	09.00	น.	ถึง	12.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	เชื่อมสายรีโคลสเซอร์ DAA05R-0 เข้าระบบ			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1341/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ				วันที่	13 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	13 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	13 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีร์วัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

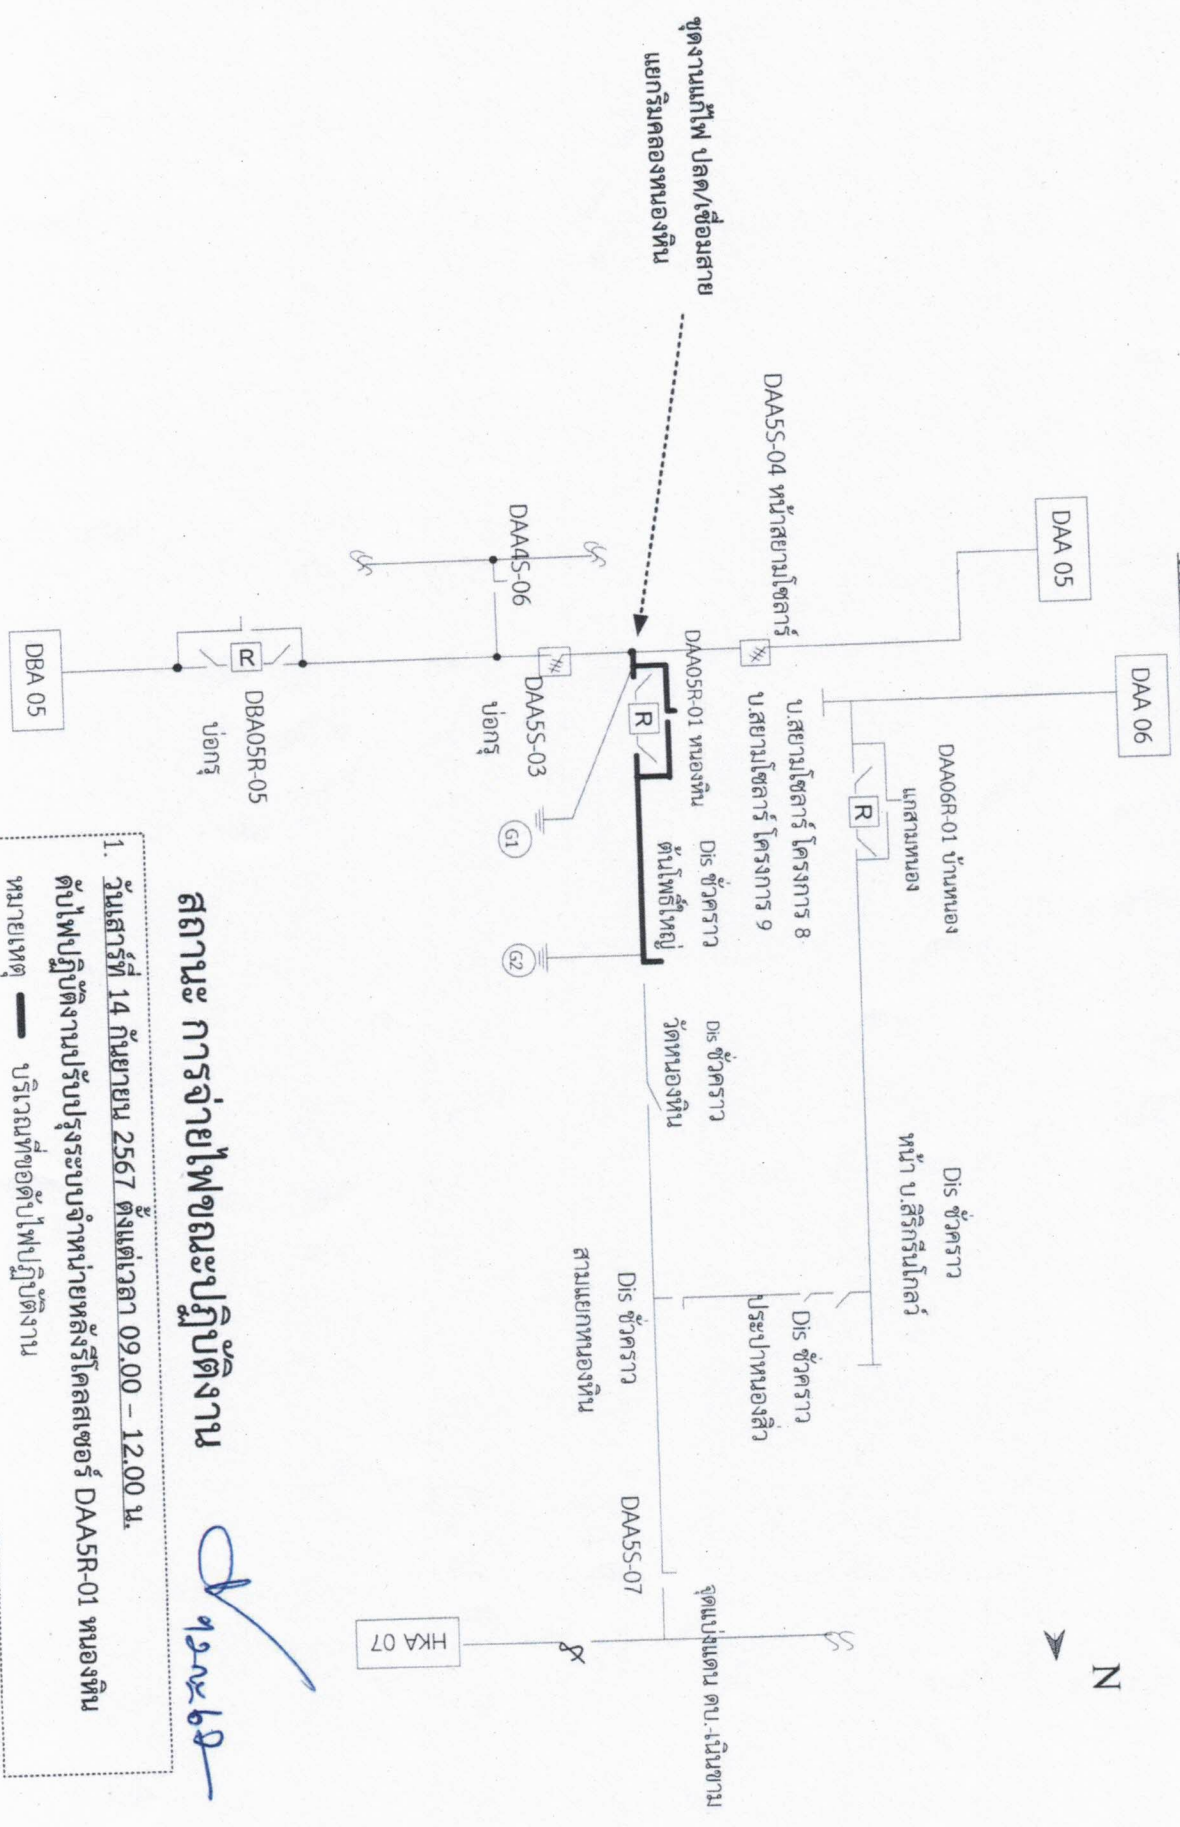
ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
3	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
4	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
5	DAA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		ดบ.		R หนองหิน
6	DAA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		ดช.		R บ้านหนองแกสามหนอง
7	ย้ายโหลด DAA05 บางส่วน ฝาก DAA06						
8	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA		- ขนานบัส
9	DIS ชค. DAA06	ปลด	สับ		ดบ.		DIS สามแยกหนองหิน
10	DIS ชค. DAA05	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ต้นโพธิ์ใหญ่
11	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		- ขนานบัส
12	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
13	ตรวจสอบโหม่งด้าน Source และโหม่ง Load ของ DAA05R-01 (R.วัดหนองหิน) ปลดออกทั้ง 3 เฟส						
14	SW.BYPASS	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		R DAA05R-01 หนองหิน
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลด Hotline Clamp แยกเข้า DAA05R-01 (R.วัดหนองหิน) ออกทั้ง 3 เฟส						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ซ็อกกราวด์จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ซ็อกกราวด์จุด G2						
18	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย						
19	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
20	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
21	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
22	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
23	DAA06R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		ดช.		R บ้านหนองแกสามหนอง
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
24	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดซ็อกกราวด์จุด G1						
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดซ็อกกราวด์จุด G2						
27	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย						
28	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
29	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-	-
31	DAA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		ดช.		R	บ้านหนองแกสามหนอง
32	จ่ายไฟ							
33	ตรวจสอบ DAA05R-01 R.หนองหิน อยู่สถานะ "OPEN"							
34	ตรวจสอบใบมีดด้าน Source,Load และ Sw.Bypassของ DAA05R-01 (R.วัดหนองหิน) ปลดออกทั้ง 3 เฟส							
35	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเชื่อม Hotline Clamp แยกเข้า DAA05R-01 (R.วัดหนองหิน) เข้าทั้ง 3 เฟส							
36	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการสับใบมีดด้าน Source และใบมีดด้าน Load ของ DAA05R-01 (R.วัดหนองหิน) เข้าทั้ง 3 เฟส							
37	DAA05R-01	ปลด	สับ คง Non-Reclosing <u>ALT, GND</u>		ดบ.		R	หนองหิน
38	ย้ายโหลด DAA05 บางส่วน กลับจาก DAA06							
39	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA		-	ขนานบัส
40	DIS ชค. DAA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	ตันโพธิ์ใหญ่
41	DIS ชค. DAA06	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS	สามแยกหนองหิน
42	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		-	ขนานบัส
43	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
44	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
45	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
46	DAA05R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		ดบ.		R	หนองหิน
47	DAA06R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		ดช.		R	บ้านหนองแกสามหนอง
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่อเชื่อมสายนำรีดลเซอร์ DAA5R-01 เข้าระบบ
 วงจร DAA 05 แยกเข้า DAA5R-01 หนองหิน ถึง ดิสชั่วคราว ต้นโพธิ์ใหญ่

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.



สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

(Handwritten signature)

1. วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
 ตัดไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายหลังรีดลเซอร์ DAA5R-01 หนองหิน
 หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน
