

เลขที่ ก.๓.อท.(ปบ) ๓๔๖/๒๕๖๗  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
 ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๗  
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
 ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุททอง

ด้วยการไฟฟ้า อุททอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแก้ไขเสาเอนเอียงใกล้ลัม (แรงด่วน) บริเวณ ปีม ป.เทียนชัย  
 ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.6 (UTG), F.2 (UTG)	26 ม.ค.2567	08.30	16.30	แก้ไขเสาเอนเอียงใกล้ ลัม บริเวณ ปีม ป.เทียนชัย (แรงด่วน)	จุดที่ 1.บริเวณ SF6.ตึก อำนาจ UTG02S-02 จุดที่ 2.เบรคเกอร์ UTG06	จุดที่ 1.บริเวณ DIS บ้านโง่ UTG06S-11 จุดที่ 2.บริเวณ SF6. โรง บ้านโง่ UTG06S-04	นายจกกล โพธิกุล ชม.ปบ.กฟอ.อุททอง โทร.๐๘๕-๒๖๖๘๘๙๑๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจกกล โพธิกุล ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร๐๘๕-๒๖๖๘๘๙๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.อุททอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

UTG06S-04

UTG06VB-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG06 จาก UTG06S-11 ถึง UTG02S-02

ในวันที่ 26 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 134/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริวัฒน์ แก้วจันทิโก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจกกล โพธิกุล

23 ม.ค. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. (ฟอ.อทอ, กฟอ.ทก.)

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย ศิริวัฒน์ แก้วจันทิโก)

วคก.5 แทน นน.คพ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)


## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	ป้อม ป.เทียนชัย					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ม.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.อทง.	งานที่ทำ	แก้ไขเสาเอียง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 134/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิริวัฒน์ แก้วสมนึก			วันที่	23 มกราคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 มกราคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 มกราคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆ, นายวรรณพงษ์ 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายจิริวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
3	UTG06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
4	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
5	SPO05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
6	SPO10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
7	ย้ายโหลด UTG 6 บางส่วนไปจ่ายจาก SPO 5 และ SPO 10						
8	SPO05S-02	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 บ้านดอนพรหม
9	UTG06VB-01	สับ	ปลด		UTG		-
10	UTG06S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.6
11	SPO10S-02	ปลด	สับ		ทคก.	SCADA	SF6 บ้านดอนพรหม
12	ตรวจสอบ SF6 UTG02S-02 ตีกอำนาจ สถานะ Open+lock คาน						
13	เมื่อพร้อมดับไฟ						
14	UTG06S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS บันไอง
15	UTG06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.	SCADA	SF6 โรงบันไอง
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
21	เมื่อแจ้ง Shortground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
22	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
23	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
24	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
25	SPO05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
26	SPO10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
27	ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
28	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
29	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
30	SPO05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
31	SPO10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
32	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
34	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
35	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4						
36	ย้ายโหลด UTG 6 บางส่วนกลับจาก SPO 5 และ SPO 10						
37	UTG06S-04	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 โรงปั่นไอน้ำ
38	UTG06S-11	ปลด	สับ		อทง.		DIS ปั่นไอน้ำ
39	SPO10S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทคก.	SCADA	SF6 บ้านดอนพรหม
40	UTG06S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS POT HEAD F.6
41	UTG06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTG		-
42	SPO05S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.	SCADA	SF6 บ้านดอนพรหม
43	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
44	UTG06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
45	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
46	SPO05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
47	SPO10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

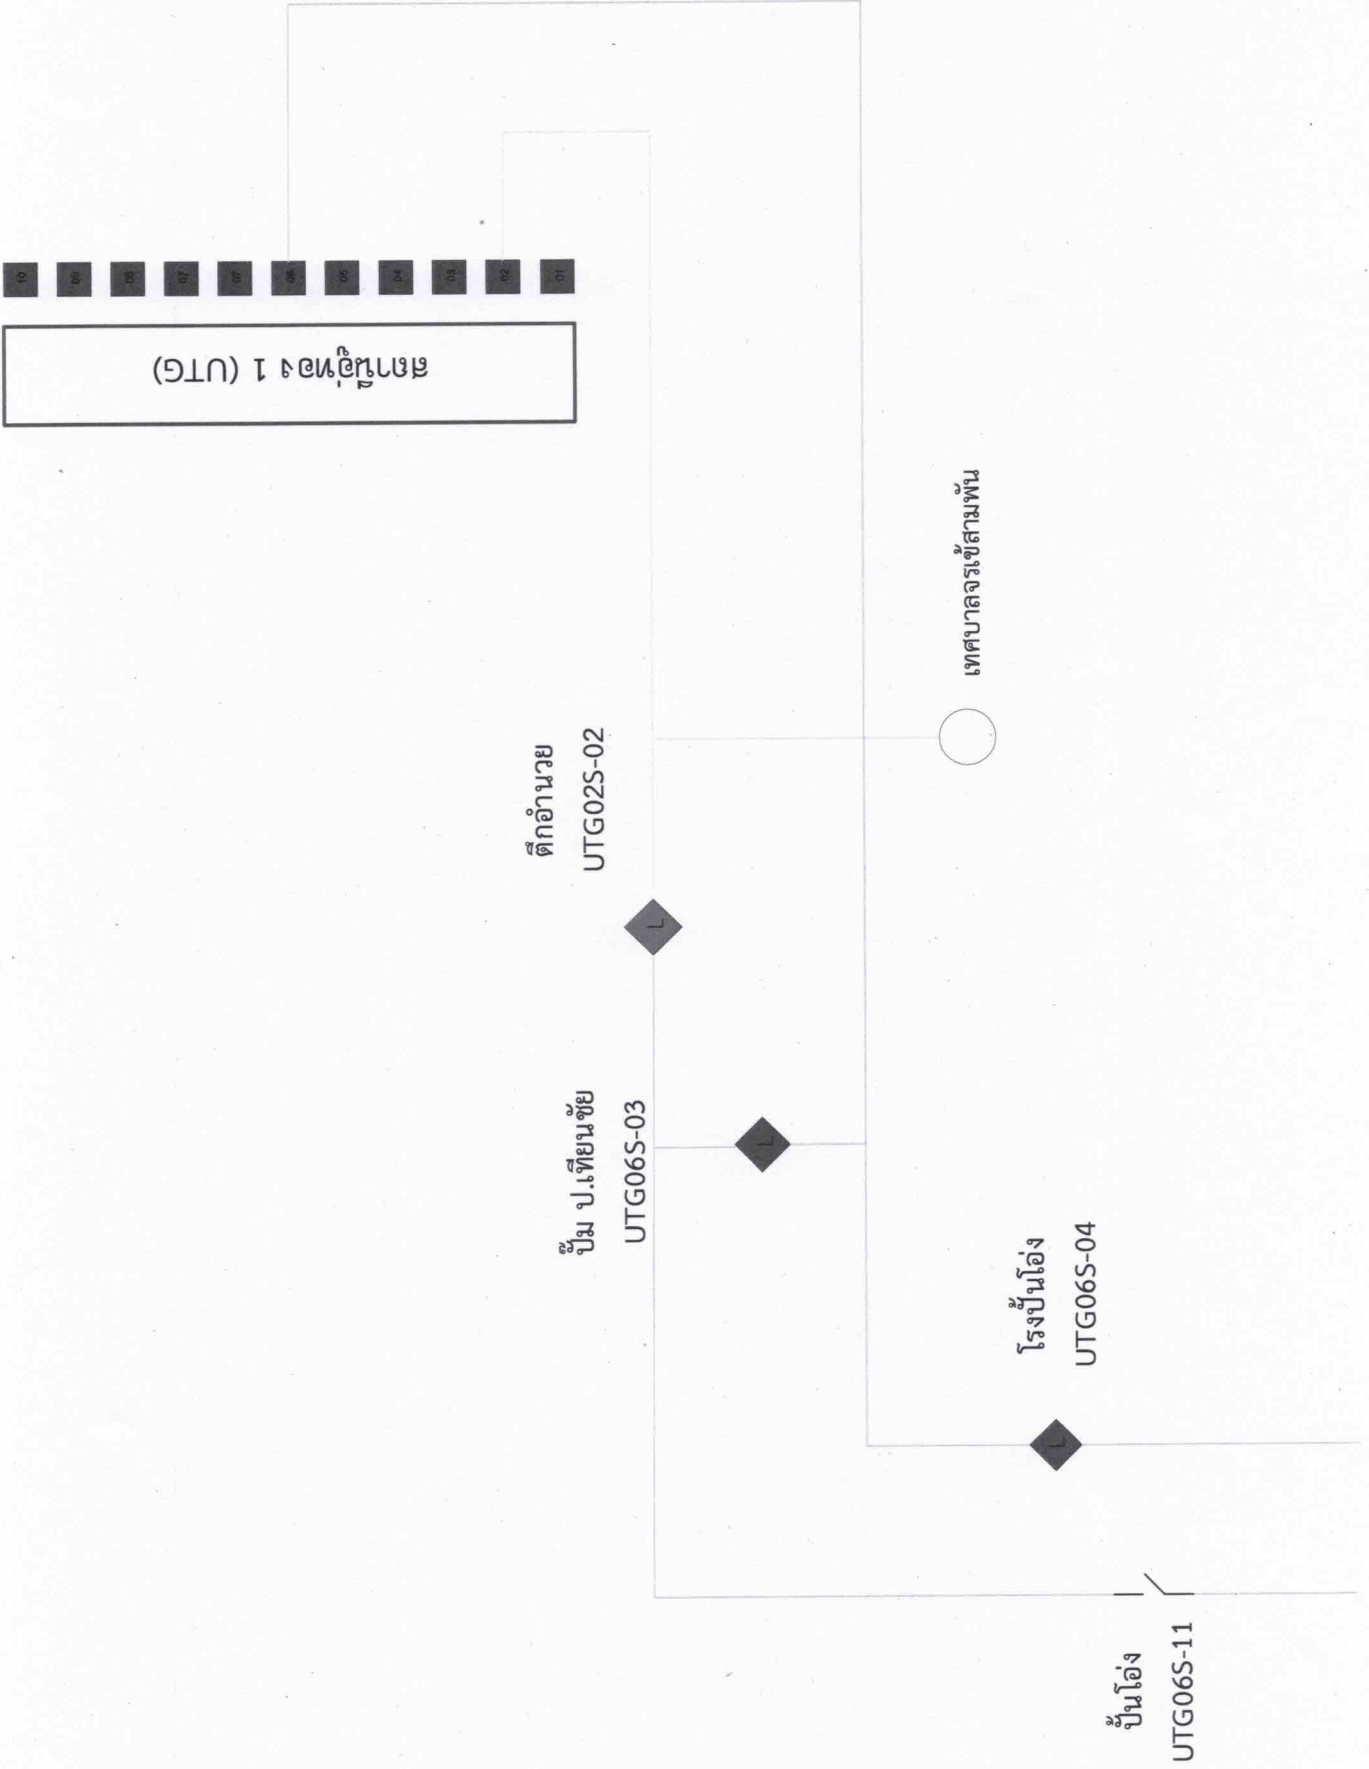

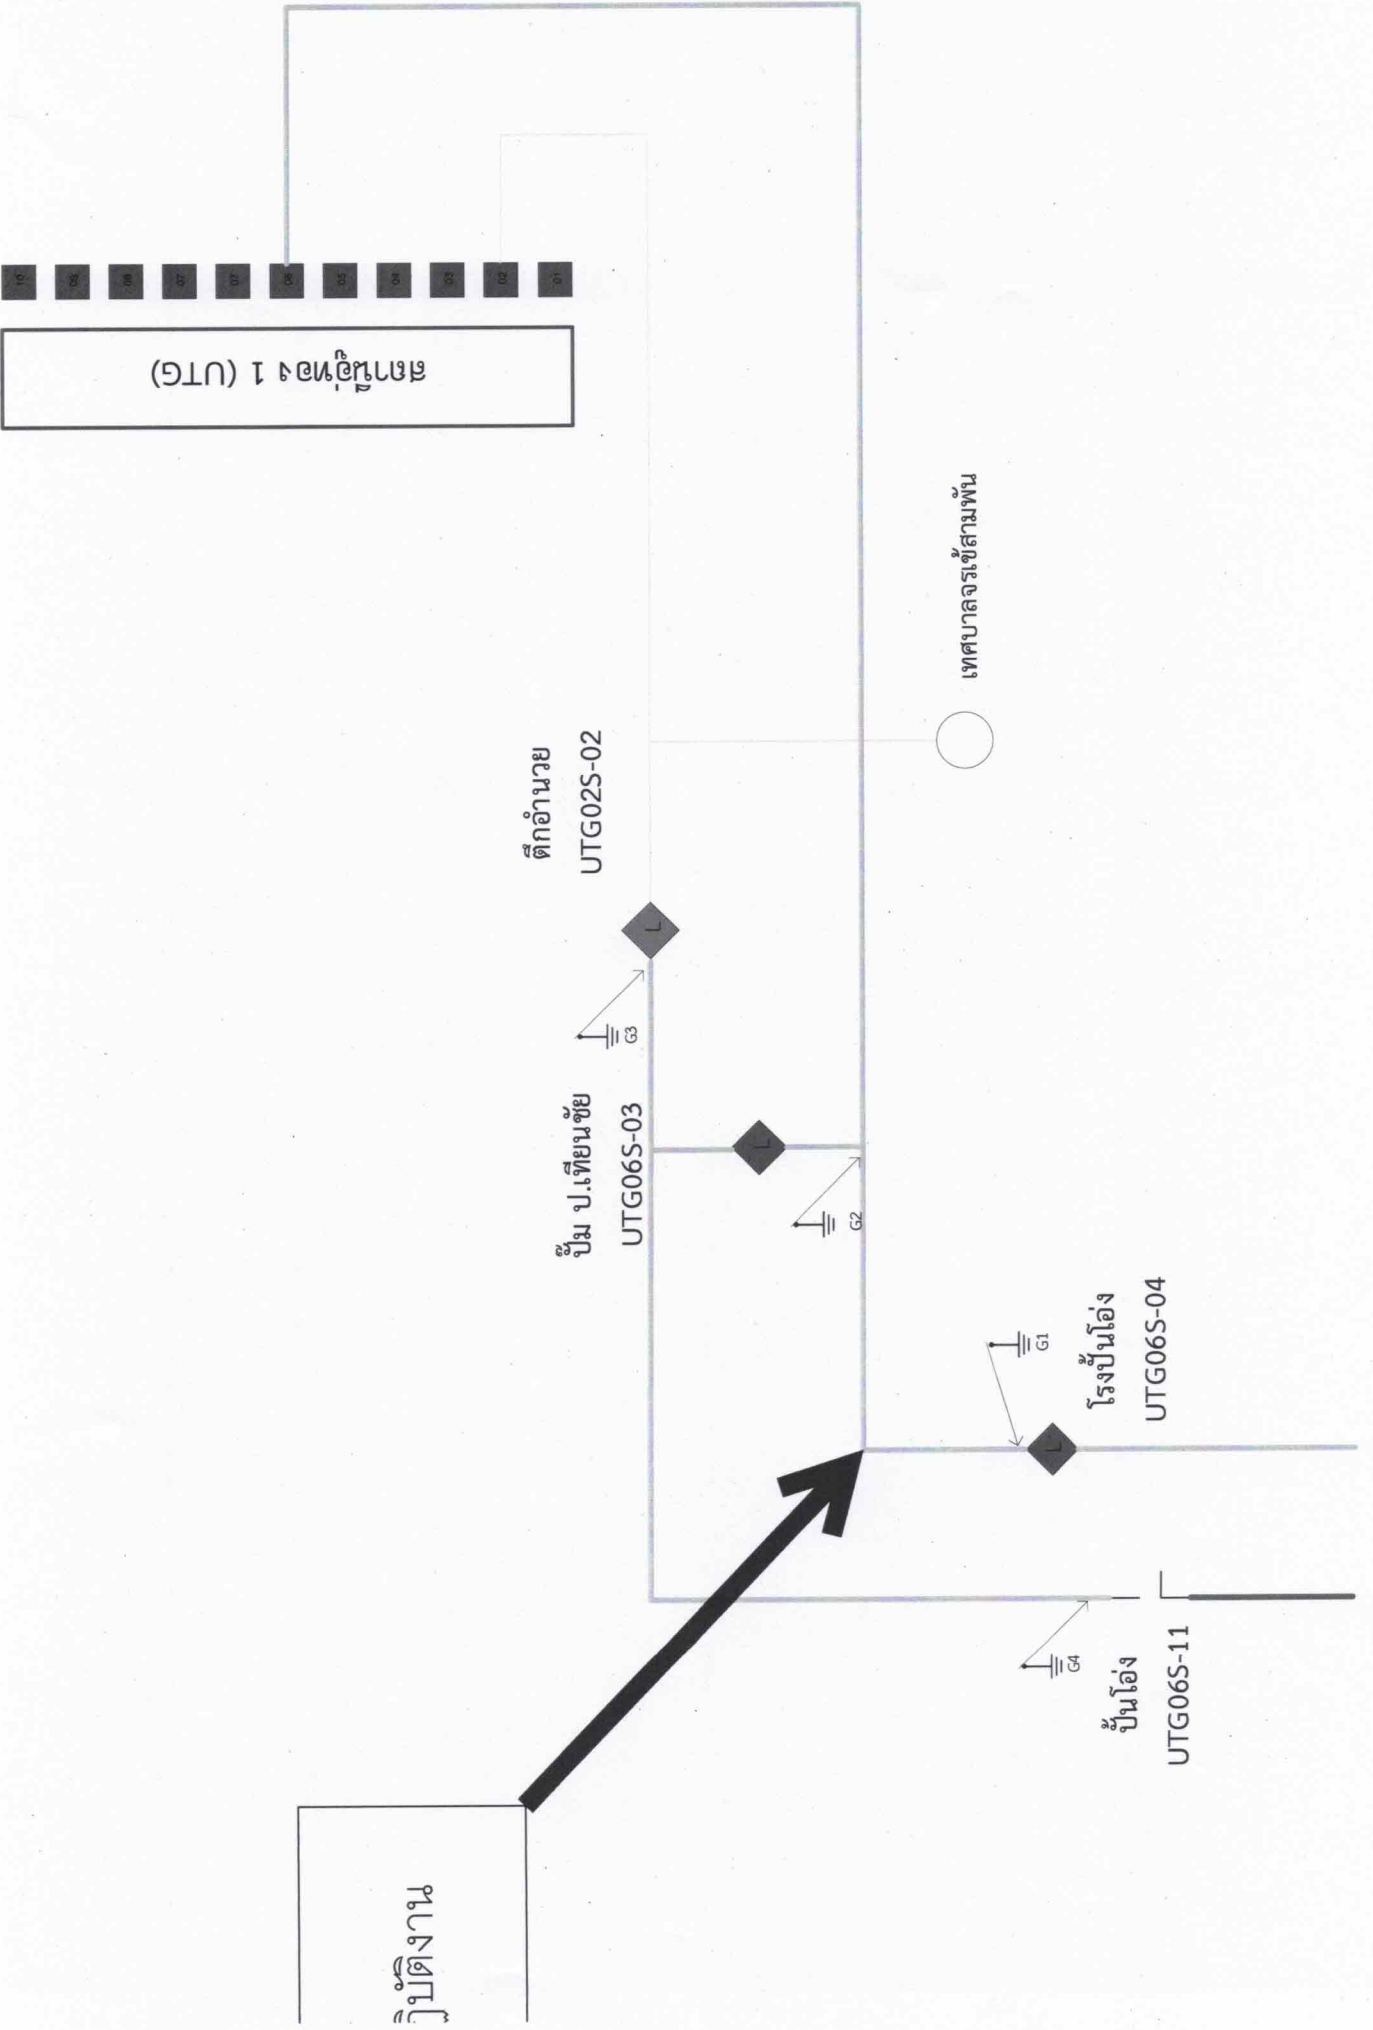

สถานีวิทยุ 1 (UTG)

ตึกอำนวยการ  
UTG02S-02

ป้อม ป.เทียนชัย  
UTG06S-03

โรงปั่นโอง  
UTG06S-04

บ้านโอง  
UTG06S-11

เทศบาลฯ

บ้านดิงงาน
