



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

22 ต.ค. 64

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๒๕๒๖ /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรตล

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปักเสาเข็มใต้ไลน์แรงสูงรองรับวงจรใหม่และเชื่อมโยงตามแผนผังสังเขป  
แบบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๓ KTU	๒๔ ต.ค. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ผกส. และ ผปบ.กทบ.ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ปักเสาพาดสายเคเบิล ๑๘๕ ต.มม.เพิ่มเติม ๑ วงจร และติดตั้งโวลต์โลนวงจร ๐๓ KTU กับ วงจร ๐๓ SMI บริเวณสามแยกบ้านป่าเมียด	จุดตัด DDE ๐๐.๘	DIS ชั่วคราว หน้าโรงน้ำแข็ง	นายปรีชา แก้วสีม่วง ท.กส.กทบ. โทร.๐๘๑-๒๕๑๕๒๘๑
๒	๐๓ SMI	๒๔ ต.ค. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SF๖ SMI ๐๓S-๐๓ หัวมุมเขว่น	SF๖ KTU ๐๘S-๐๓ ถึงสุดไลน์แรงสูง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการตัดไฟปฏิบัติงานจำนวน ๙๐ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร ๐๘๒-๐๐๕๔๕๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยกแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลโยกแก้วนำแสง  ๑.๑  มีโอกาสชำรุด  ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลโยกแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรตล)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ KTU03 จาก DDG ๑๐A ถึง DIS อีกทง ๓๒๒ ก.ท.ท.  
ในวันที่ ๒4-10-๖4 ตั้งแต่เวลา ๐83๐ น. ถึง 17๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1354/64  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SMI503 จาก SMI 3S-03 ถึง KTU 5S-03, มดงพวงหิน  
ในวันที่ ๒4-10-๖4 ตั้งแต่เวลา ๐83๐ น. ถึง 17๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมยศ ทรัพย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ท.ผ.ปบ.กทบ.  
15 ต.ค. 64

(รศ.พร อำนวยกิจ)  
๐๘๓.๗ โทร นพ.ดพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๒ แผ่น  
แผนผังแนบ ๓ แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ.กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจก. (สถานี)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


1. สถานที่ทำงาน	สามแยกบ้านยายเมียด					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ต.ค. 64	เวลา	08.30 น.	ถึง	24 ต.ค. 64	เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กทป.เขตบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย KTU03, SMI03		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1354/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	16 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	16 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	16 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนภายในสถานีฯ SMI,KTA,KTU,ONB							
1	ย้ายโหลด KTU03 บางส่วน ไปรับไฟจาก ONB09						
2	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		-
3	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		-
4	ONB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
5	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
6	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		-
7	KTA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
8	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		-
9	KTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
10	KTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
11	KTA05S-06	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 ส่วนอาหารเจ้าจันทร์
12	KTA05VB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
13	KTA05S-12	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 ตรงข้ามโรงเรียนบ้านแคราย
14	KTU03S-08	ปลด, ล็อกคาน	สับ		กทบ.		SF6 โรงงานอิฐบล็อด
15	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		- ขนานบัส
16	DIS.ชั่วคราว KTU03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS หน้าโรงน้ำแข็ง
17	ONBBVB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		- ขนานบัส
18	KTA05S-12	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 ตรงข้ามโรงเรียนบ้านแคราย
19	KTA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
20	KTA05S-06	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 ส่วนอาหารเจ้าจันทร์
21	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		-
22	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		-
23	ONB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
24	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
25	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		-
26	KTA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
27	KTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		-
28	KTU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
29	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
30	SMI03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
31	KTU03S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS บ้านยายเมียด
32	KTU03S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS เขิงสะพานวัดศรีนวล
33	KTU05S-07	สับ	ปลด, ล็อกคาน		กทบ.		SF6 หัวมุมเขเวน หน้ารอยัลคิงส์
34	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลดโหลดไลน์ KTU03 ตั้งแต่จุด A ถึง KTU03S-06, KTU03S-09 ออก และตัด DDE จุด A ได้ (สอทไลน์ตัด)						
35	ตรวจสอบ KTU05S-03 (SF6.เยื้องโรงงานไปเท็ด) อยู่ตำแหน่ง "ปลด" พร้อมล็อกคาน						
36	ตรวจสอบ KTU03S-05 (SF6.คลองสีวา-ตากล่อม) อยู่ตำแหน่ง "ปลด" พร้อมล็อกคาน						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
37					กทบ.		
38					กทบ.		
39					กทบ.		
40	SMI03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
41	KTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
42							
43							
44	SMI03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
45	KTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
46					กทบ.		
47					กทบ.		
48					กทบ.		
49							
50	KTU03S-06	ปลด	สับ		กทบ.		DIS บ้านยายเมียด
51	KTU03S-09	ปลด	สับ		กทบ.		DIS เขิงสะพานวัดศรีนวล
52	KTU05S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 หัวมุมเขเวน หน้ำรอยัลคิงส์
53	SMI03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
54	ย้ายโหลด KTU03 บางส่วน คีนจาก ONB09						
55	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		-
56	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		-
57	ONB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
58	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
59	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		-
60	KTA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
61	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		-
62	KTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
63	KTA05S-06	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 สวนอาหารเจ้าจันทร์
64	KTA05VB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
65	KTA05S-12	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 ตรงข้ามโรงเรียนบ้านแคราย
66	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		- ขนานบัส
67	DIS.ชั่วคราว KTU03	ปลด	สับ		กทบ.		DIS หน้าโรงน้ำแข็ง
68	KTU03S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 โรงงานอิฐบล็อค
69	ONBBVB-01	สับ	ปลด		ONB		- ขนานบัส
70	KTA05S-12	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 ตรงข้ามโรงเรียนบ้านแคราย
71	KTA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
72	KTA05S-06	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 สวนอาหารเจ้าจันทร์
73	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		-
74	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		-
75	ONB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
76	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
77	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		-
78	KTA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
79	KTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		-
80	KTU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
สิ้นสุด Switching							

แผนผังสถานะตู้จูน บอร์ดตู้ไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 1 ต.เตาขาว ( ตามแยกบ้านบ้านมีเขต )  
 เพื่อให้ ศสส.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี บัดเตาแดงสูง แจนไดร์รองรับวงจรมใหม่  
 ( ตามอนุมัติ อ.3 กวว.(วร).- 1314 ลว. 7 ก.ล. 2564 ) WBS: P-TDD02.3-I-KTNN.A.0006  
 ในวันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น.


หมายเหตุ มีผู้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบจำนวน 90 ราย

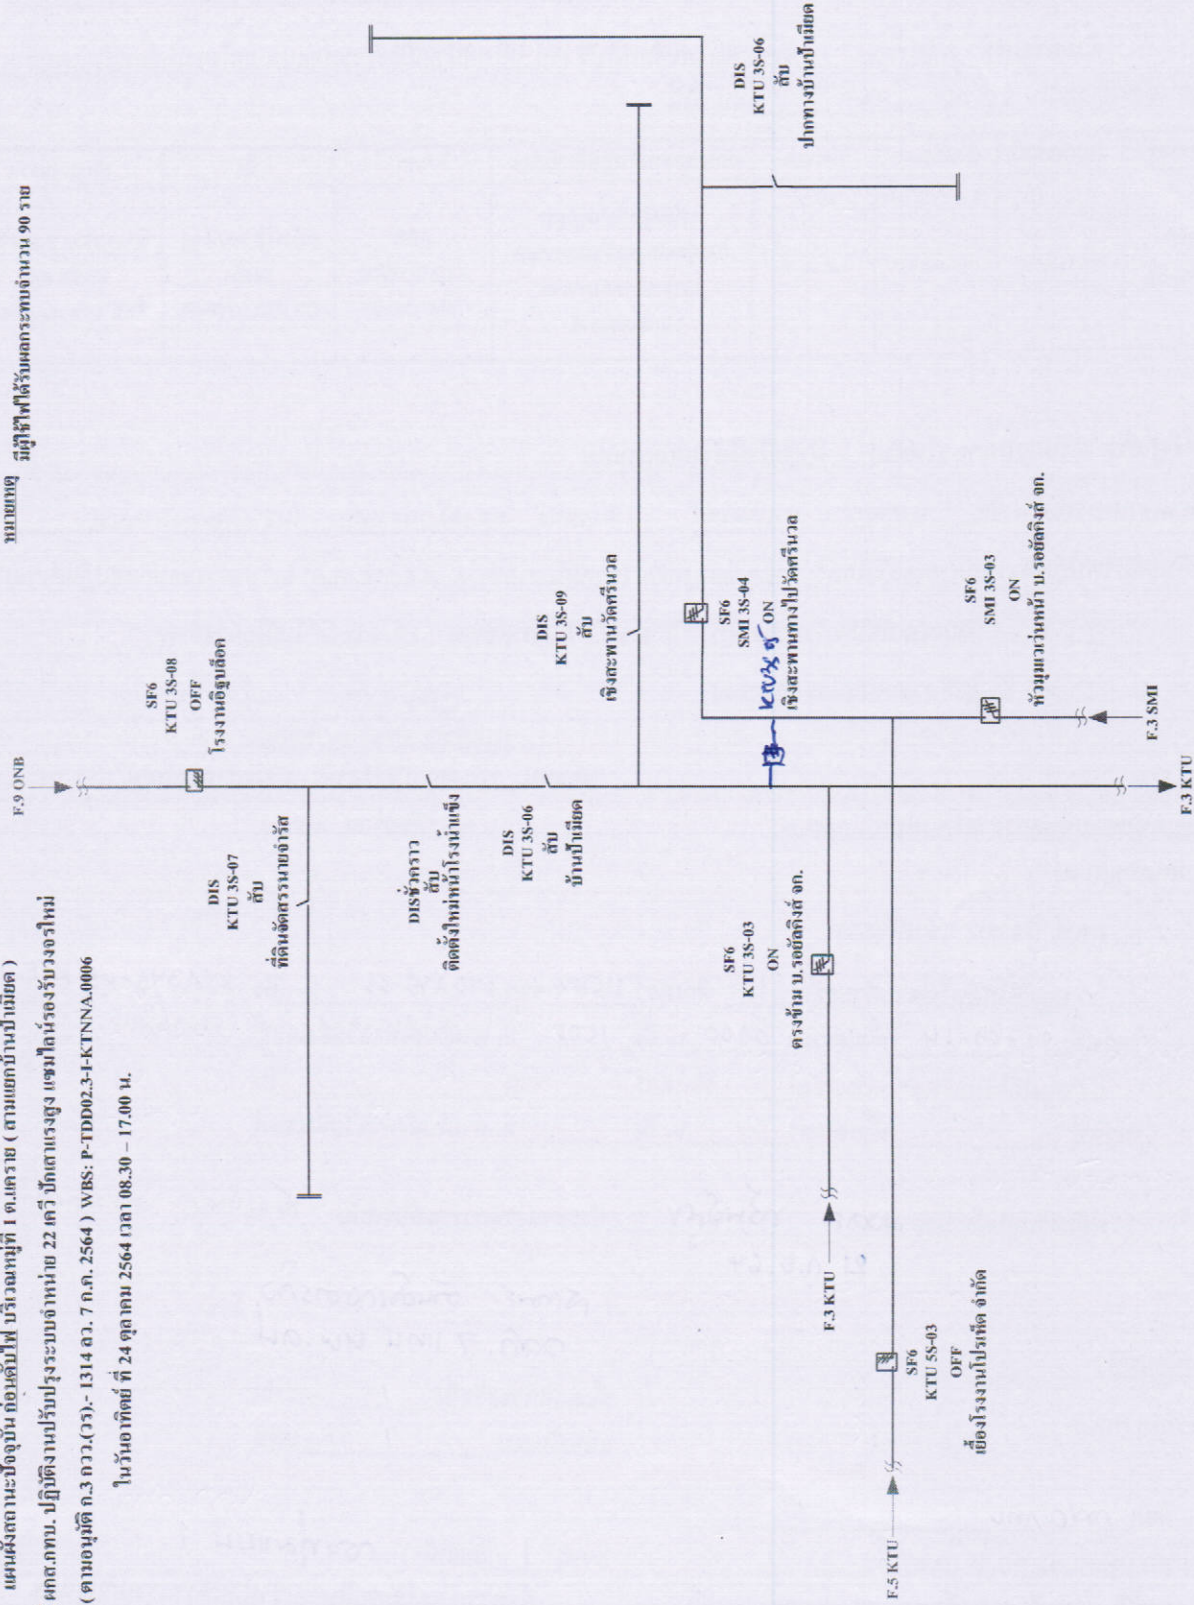

แผนผังสถานะปัจจุบัน ทั้งฉบับไฟ บริเวณพื้นที่ 1 ต.เศวต (ตามแยกบ้านเป็นเขต)  
 เพื่อให้ ผศ.ภ.ท. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี บิดเตาแรงสูง เซมโวลต์แรงสูงใหม่  
 (ตามอนุมัติ ก.3 กว.(ว)- 1314 ตว. 7 ก.ภ. 2564) WBS: P-TDD02.3-I-KTNN.A.0006  
 ในวันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น.

หมายเหตุ  
 มีผู้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบจำนวน 90 ราย

เส้นทึบสีน้ำเงิน ไลน์แรงฟีดเดอร์ 3 กทบ.6 ดับไฟปฏิบัติงาน  
 เส้นทึบสีฟ้า ไลน์แรงฟีดเดอร์ 3 ตค.9 ดับไฟปฏิบัติงาน  
 จุด Short Ground (D.1-D.3)

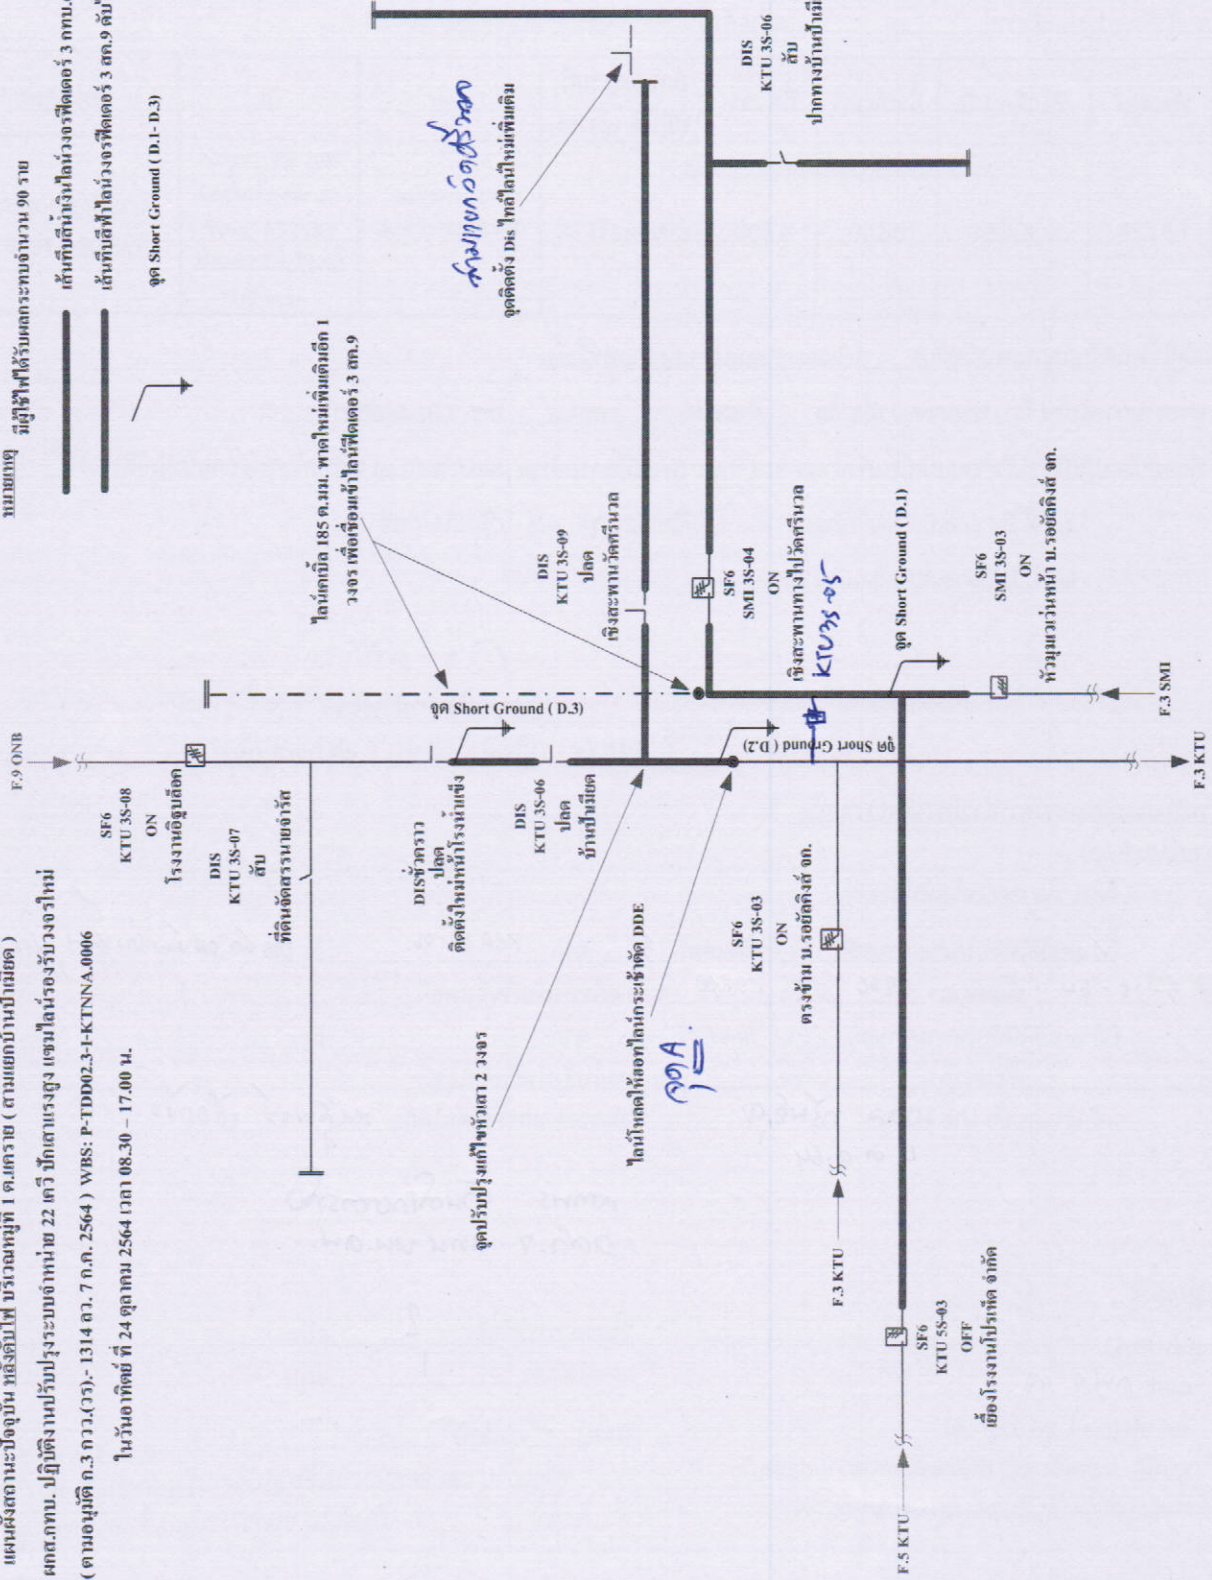

โวลต์บัส 185 ต.มม. พาดใหม่เพิ่มเติมที่ 1  
 330V เพื่อเชื่อมเข้าไลน์ฟีดเดอร์ 3 ตค.9

สายทึงค์ 3 ตค.9  
 จุดตัด DIS โทลด์ใหม่เพิ่มเติม

จุด Short Ground (D.3)  
 DIS KTU 3S-09  
 ปลด  
 เชื่อมสายตัดรีโมท

โวลต์บัสให้สอยโวลต์กระชากตัด DDE  
 จุด A.  
 จุด Short Ground (D.2)

จุด Short Ground (D.1)  
 SF6 SMI 3S-04  
 ON  
 เชื่อมสายทางไปวัดรีโมท  
 KTU 3S-05

จุด Short Ground (D.2)  
 SF6 KTU 3S-03  
 ON  
 ตรงข้าม ม.รอยัดถึง 3 ต.

จุด Short Ground (D.1)  
 SF6 SMI 3S-03  
 ON  
 หัวมุมเขื่อนหน้า ม.รอยัดถึง 3 ต.

จุด Short Ground (D.1)  
 SF6 SMI 3S-03  
 ON  
 หัวมุมเขื่อนหน้า ม.รอยัดถึง 3 ต.

จุด Short Ground (D.1)  
 SF6 SMI 3S-03  
 ON  
 หัวมุมเขื่อนหน้า ม.รอยัดถึง 3 ต.

จุด Short Ground (D.1)  
 SF6 SMI 3S-03  
 ON  
 หัวมุมเขื่อนหน้า ม.รอยัดถึง 3 ต.

จุด Short Ground (D.1)  
 SF6 SMI 3S-03  
 ON  
 หัวมุมเขื่อนหน้า ม.รอยัดถึง 3 ต.

แผนผังสถานะปัจจุบัน ของจ่ายไฟฟ้าในระบบปกติ บริเวณหมู่ที่ 1 ต.นคราย ( ตามแยกบ้านบ้านมีเขต )  
 เพื่อให้ ผศ.ศ.ภท. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 คิว บีทีเอสแรงสูง แกรมไลน์รองรับวงจใหม่  
 ( ตามอนุมัติ ก.3 กว. (ว.) - 1314 ค.ว. 7 ก.ค. 2564 ) WBS: P-TDD02.3-I-KTNNA.0006  
 ในวาระที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น.

