



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

22 ม.ค. 68

เลขที่ ป.๓ /๒๕๖๘

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพิชญ์นันท์ พิชิตสุวรรณมงคล

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทวีทรัพย์

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.สท.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอนและทาดสายแรงสูง หน้าสถานีสพ.๑-สี่แยกแขวงการทาง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๕ สท.๑	๒๕/๐๑/๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	รื้อถอนและทาดสายแรงสูง SAC๑๘๕ ค.ม.ม. ๒วงจร	SPA๐๕VB-๐๑,	Disชั่วคราวหน้าอนุบาลสุพรรณ	นายชนกฤต พวงดอกไม้ โทร.๐๘๑๘๘๐๕๕๙๑๓
๒.	๙ สท.๑	๒๕/๐๑/๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ระยะทางประมาณ ๑.๔ กม.	SPA๐๔VB-๐๑,	Disชั่วคราวข้างแขวงการทาง	
๓.	๔ สท.๑	๒๕/๐๑/๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		SPA๐๔S-๐๑	DDEจุดA	
๔.	๑๐ สท.๑	๒๕/๐๑/๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		SPA๑๐S-๐๑	SPA๑๐S-๐๒	

พื้นที่ที่มีผู้เข้าได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๖ (สท.) โทร. ๐๘๑-๘๗๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Signature*

( นายพิชิต อุดมรักษาทวีทรัพย์ )

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.สท.

*Handwritten notes:*  
SPA10S-02  
POE ยท A.  
ป.๓ - แขวงการทาง  
ป.๓ - ผอ.ยท

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร  อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ  อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ  
ในวันที่ 26/1/68 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 135/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ  อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ นกพ. ประสานงานการขอตัดไฟกับ *Handwritten signature*

*Signature*

( นายจิรวัฒน์ ๒๖ กิ่งลมไม้ )

จุดก.5 โทงน จ.ม.ค.พ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี .....) )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.พ.)

เรียน ผ.จก.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

หน้าที่ 1 จาก 4  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯสุพรรณบุรี 1						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ม.ค. 68	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กฟช.สพ.	งานที่ทำ	รื้อถอนและพาดสายแรงสูง			ตามใบขอปฏิบัติงาน 135/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ					วันที่	19 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	19 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	19 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนิช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวสุกัชชา,นางสาวพิชยา,นายณัฐภาณุจัน,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดต่อนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
4	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
5	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
6	SPA-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
7	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
8	SPB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		
9	SPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		
10	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
11	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
12	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
13	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		
14	SPA05R-01	Normal	Nonreclosing		สพ.	R	วัดพระธาตุ
15	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing		สพ.	R	โรงแรมกีฬา
16	- ลดโหลด SPA05 บางส่วนไปรับไฟจาก SPC03 หลังRecloser โรงแรมกีฬา						
17	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พญา
18	SPA05R-02	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R โรงแรมกีฬา
19	- ลดโหลด SPA05 บางส่วนไปรับไฟจาก SPC03 หลังRecloser วัดพระธาตุ						
20	SPA05S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ชลประทานโพธิ์พญา
21	SPA05R-01	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
22	- ย้ายโหลด SPA04 ไปรับไฟจาก SPA02						
23	SPA02S-17	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พญา
24	SPA04VB-01	สับ	ปลด		SPA	CB	SPA04
25	- ย้ายโหลด SPA10 ไปรับไฟจาก SPB07						



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	SPA09S-04	ปลด	ล๊اب		สพ.	SCADA	SF6	เชิงสะพานทาจัน
27	SPA10VB-01	ล๊اب	ปลด		SPA		CB	SPA10
28	- ย้ายโหลด SPA05 ไปรับไฟจาก DOA05							
29	DOA05S-08	ปลด	ล๊اب		สพ.	SCADA	SF6	โรงสีอุยยา
30	SPA05VB-01	ล๊اب	ปลด		SPA		CB	SPA05
31	- ดับไฟ เวลา 08.00 น.							
32	SPA04S-01	ล๊اب	ปลด		สพ.		DIS	POTHEAD F.4
33	SPA05S-01	ล๊اب	ปลด		สพ.		DIS	POTHEAD F.5
34	SPA09S-01	ล๊اب	ปลด		สพ.		DIS	POTHEAD F.9
35	SPA010S-01	ล๊اب	ปลด		สพ.		DIS	POTHEAD F.10
36	SPA010S-02	ล๊اب	ปลด		สพ.		DIS	แยกสถานีฯ
37	DISชค.SP07	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	ข้างแขวงฯ
38	DISชค.SPA05	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	หน้าอนุบาล
39	SPA04S-02	ล๊اب	ปลด		สพ.		DIS	หน้าสถานีฯ
40	แจ้งกฟส.สพ.ไลน์โหลดก่อนทำการปลด DDE							
41	แจ้งกฟส.สพ.ให้ HOTLINE ดำเนินการปลด DDE จุด A (SPA04) ออกทั้งสามเฟส							
42	หลังจากกฟส.สพ.ให้ HOTLINE ดำเนินการปลด DDE จุด A (SPA04) ออกทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ							
43	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ							
44	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1							
45	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2							
46	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
47	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้							
48	SPA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
49	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA			
50	SPA-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
51	SPB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB			
52	SPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB			
53	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
54	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			
55	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC			
56	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC			
***** สิ้นสุด Switching เช้า *****								
57	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด							
58	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G1							
59	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G2							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
60	หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
61	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
62	SPA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
63	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
64	SPA-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
65	SPB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		
66	SPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		
67	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
68	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
69	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
70	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		
71	- จ่ายไฟ						
72	แจ้งกฟส.สพ.ให้ HOTLINE ดำเนินการเชื่อม DDE จุด A (SPA04) เข้าทั้งสามเฟส						
73	หลังจากกฟส.สพ.ให้ HOTLINE ดำเนินการเชื่อม DDE จุด A (SPA04) เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
74	แจ้งกฟส.สพ.จ่ายโหลดเข้าทั้งหมด						
75	SPA04S-01	ปลด	ล๊ับ		สพ.		DIS POTHEAD F.4
76	SPA05S-01	ปลด	ล๊ับ		สพ.		DIS POTHEAD F.5
77	SPA09S-01	ปลด	ล๊ับ		สพ.		DIS POTHEAD F.9
78	SPA010S-01	ปลด	ล๊ับ		สพ.		DIS POTHEAD F.10
79	SPA010S-02	ปลด	ล๊ับ		สพ.		DIS แยกสถานีฯ
80	DISชค.SPB07	ปลด	ล๊ับ		สพ.		DIS ข้างแขวงฯ
81	DISชค.SPA05	ปลด	ล๊ับ		สพ.		DIS หน้าอนุบาล
82	SPA04S-02	ปลด	ล๊ับ		สพ.		DIS หน้าสถานีฯ
83	- ย้ายโหลด SPA04 กลับจาก SPA02						
84	SPA04VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB SPA04
85	SPA02S-17	ล๊ับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
86	- ย้ายโหลด SPA10 กลับจาก SPB07						
87	SPA10VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB SPA10
88	SPA09S-04	ล๊ับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 เชิงสะพานท่าจีน
89	- ย้ายโหลด SPA05 กลับจาก DOA05						
90	SPA05VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB SPA05
91	DOA05S-08	ล๊ับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอู๋ยา
92	- ลดโหลด SPA05 บางส่วนกลับจาก SPC03 หลังRecloser โรงแรมกัฬา						
93	SPA05R-02	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing		สพ.	SCADA	R โรงแรมกัฬา
94	SPA05S-06	ล๊ับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พญา



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
95	- ลอดโหลด SPA05 บางส่วนกลับจาก SPC03 หลัง Recloser วัดพระธาตุ						
96	SPA05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
97	SPA05S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ซลประทานโพธิ์พญา
98	SPA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
99	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
100	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
101	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
102	SPA-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
103	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
104	SPB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		
105	SPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		
106	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
107	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
108	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		
109	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		
110	SPA05R-01	Nonreclosing	Normal		สพ.		R วัดพระธาตุ
111	SPA05R-02	Nonreclosing	Normal		สพ.		R โรงแรมกีฬา
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟส.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.สพ./รจก.กฟส.สพ.

ถึง ผจก.กฟส.สพ.

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘

ด้วยในวันที่...๒๕...เดือน...มกราคม...พ.ศ. ...๒๕๖๘... ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...หน้าสถานีสุพรรณบุรี-แยกแขวงการทาง...เพื่อ...รื้อถอนและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี...โดยมีรายละเอียดปิดเคอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้


ปิดเคอร์ ..๕,๙,.. สถานีฯ .. สุพรรณบุรี,๒ ตั้งแต่บริเวณ ..หน้าสถานีสุพรรณบุรี๑-สี่แยกแขวงการทาง

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายธนภฤต พวงตอกไม้ ข.ผ.กส.กฟส.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ..๐๘๑-๙๘๑๕๙๑๓.

เป็นผู้ควบคุมงานและให้ นายพงษ์พัฒน์ ใจตรง ตำแหน่ง พชง.๓ ผจก.กฟส.สพ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๙๕-๗๑๘๐๗๕๒.

เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงกลไก

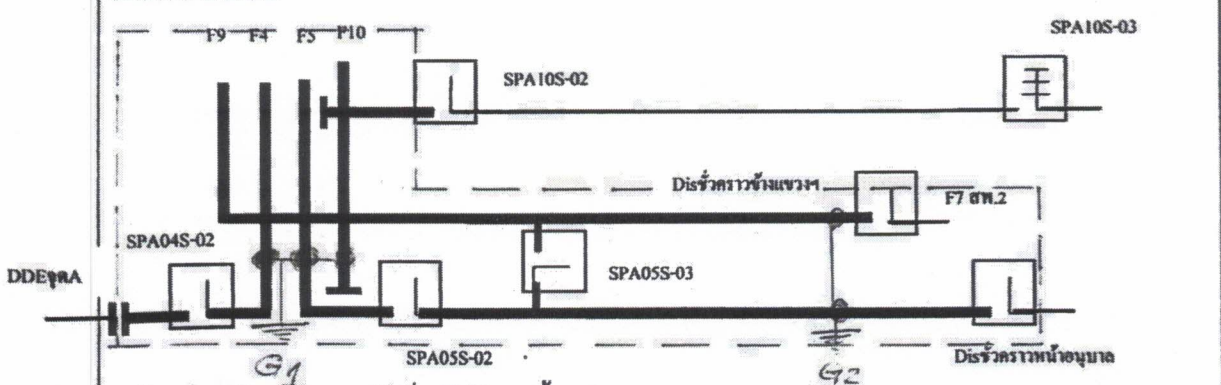

ดับไฟระบบจำหน่าย๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนและพาดสายแรงสูงระยะทาง ๑.๔กม.

๑. ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
๒. HotLineตัดเตตจุด A ๑จุด
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไฟช็อตกราวด์ ๒จุด
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

*(Signature)*  
(นายธนากร สุวรรณประทีป)  
พชง.๖(สข.) ผ.บ.กฟส.สพ.

*(Signature)*  
(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)  
ผจก.กฟส.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐
