



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟจ.สค.๒(บพ) 1329/๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

Switching Deadline

13 ก.ย. 2566

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.สค.๒(บพว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สค.๒(บพว) จะขอตัดไฟระบบจำหน่าย ๒๒ kV วงจรที่ ๐๔ และ ๐๙ สถานีบ้านแพ้ว เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณหน้าสถานีสามพราน ๕ (ชั่วคราว) ตามแผนผังส่งเขตนับ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BNP ๐๔	วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ ก.ย. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ kV บริเวณหน้า สฟพ.สามพราน ๕ (ชั่วคราว)	Dis ร้านศรีเรือน BNP๔S-๑๖	SF๖ ตรงข้ามฟุตส์สตาร์ BNP๔S-๑๗	นายภัทรวิทย์ ศิริฐานันท์ พง.๗ ผจก.กคค.(ก๓) โทร ๐๘๑-๑๔๘๑๕๖๐๑
๒.	BNP ๐๔					Dis ชั่วคราวตรงข้าม Toyota จินดา	SF๖ ตรงข้ามฟุตส์สตาร์ BNP๔S-๐๘	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ริมถนนบ้านแพ้ว - พระประโทน ต.ตลาดจินดา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรณุนันท์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ช.ผ.บ.บ. โทร ๐๘๖ - ๓๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.สค.๒(บพว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BNP4 จาก BNP4S-16 ถึง BNP4S-17

ในวันที่ 17 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1360/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BNP9 จาก Dis ต. Toyota จินดา ถึง BNP S-08

ในวันที่ 17 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกข์พันธ์  
9 ก.ย. 66

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรรณุนันท์ บัวสงค์

นายพร อนันต์กษัตริย์  
(นายพร อนันต์กษัตริย์)  
ร.จก.๗ ปฏิบัติงานแทน ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. สค.๒ (บพว)

อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี - )



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้า สฟพ.สามพราน 5 ชั้นคราว					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค2.(บพว.) งานที่ทำ		ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1360/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	12 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายสถาพร,นายจิรวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
4	DIS ชค. BNP09	สับ	ปลด (ใช้ไหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ตรงข้าม Toyota จินดา
5	ตรวจสอบสถานะสวิตซ์ใบมีด รหัส BNP04S-16 (ร้านศรีเรือน) อยู่ตำแหน่ง "ปลด"						
6	ตรวจสอบสถานะ SF6 รหัส BNP04S-17 และ BNP09S-08 บริเวณตรงข้ามฟุตสตาร์ อยู่ตำแหน่ง "ปลด" พร้อมถือคาน						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตกลงจุด G1						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตกลงจุด G2						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตกลงจุด G3						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตกลงจุด G4						
11	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
12	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
13	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
14	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
15	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงจุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงจุด G2						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงจุด G3						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงจุด G4						
20	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
21	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
22	DIS ชค. BNP09	ปลด	สับ		บพว.		DIS ตรงข้าม Toyota จินดา
23	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
	สิ้นสุด Switching						

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ไฟฟ้าดับ พร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

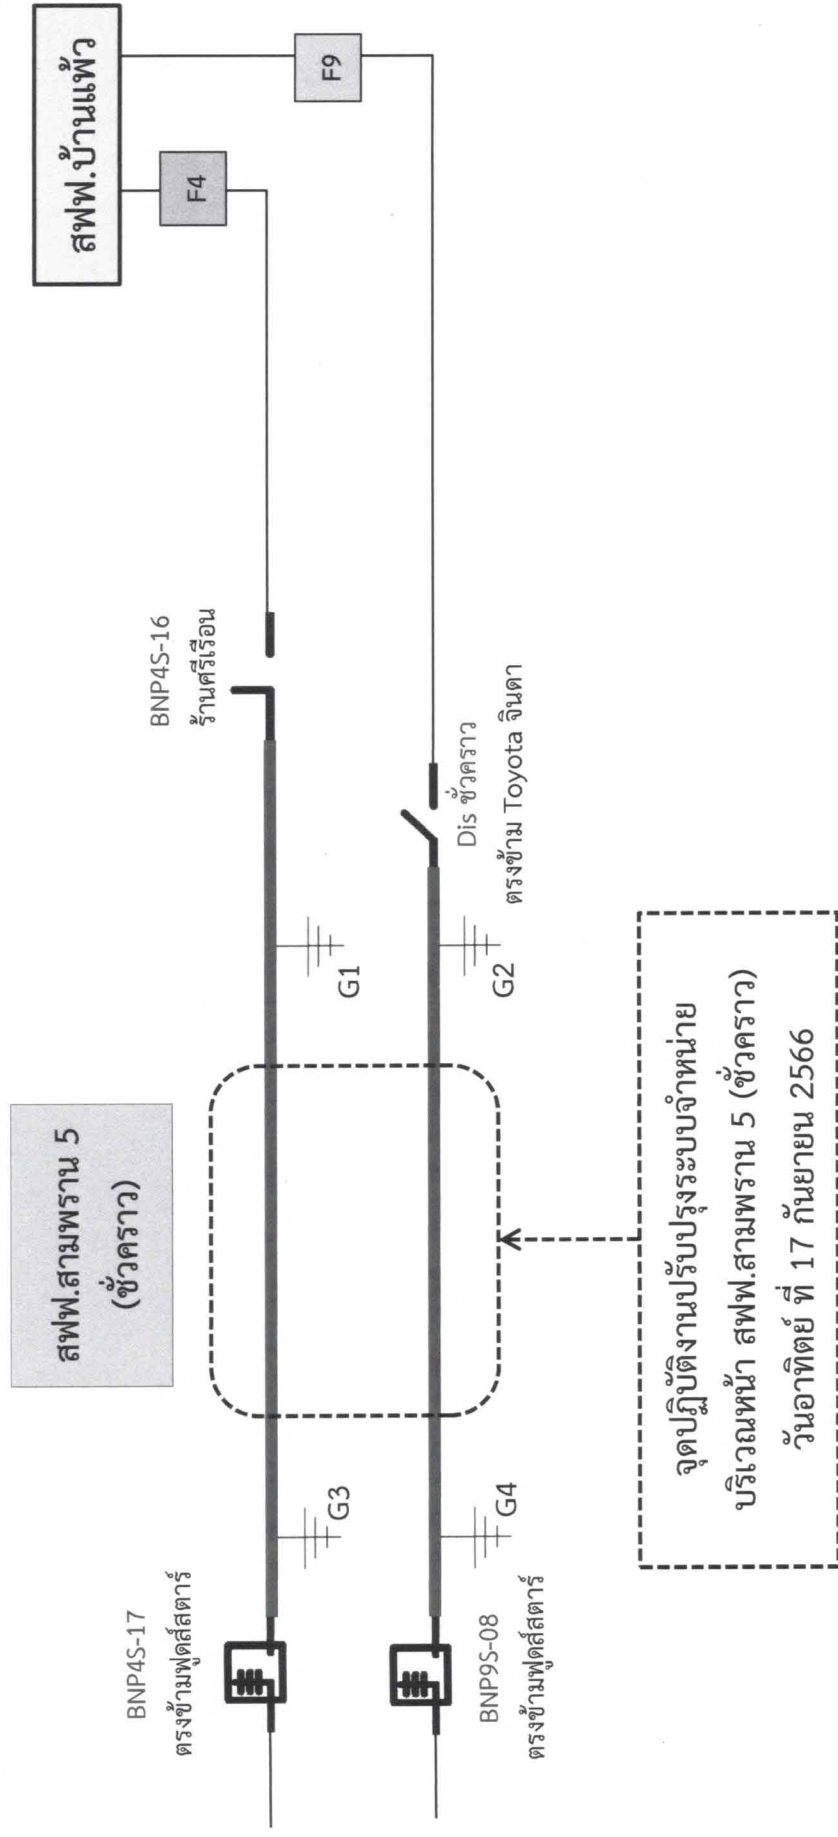

จุดปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย  
บริเวณหน้า สพพ.สามพราน 5 (ชั่วคราว)  
วันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2566

 เส้นทึบแสดงพื้นที่ดับไฟ  
 ตำแหน่งจุด Short Ground
