

Switching Deadline

13 ก.ย. 66



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 สพน.(กป.) 164/2566

วันที่ 7 ก.ย. 2566

ชื่อผู้รับ นานพัทธนันท์ พิชราสุวรรณพิชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง นายจรเดช นิยมศิริ

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพน.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขจุดร้อนบริเวณ SF6 บ้านกลางทุ่ง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F3 SPO	14 ก.ย 66	09.00	12.00	แก้ไขจุดร้อน SF6 บริเวณ บ้านกลางทุ่ง	SPO35-03		นายพนันต์ พรหมศรี โทร.085-2159454
2.								
3.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง.....หมกป.....โทร.....081-9420817

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

จรเดช นิยมศิริ

(นายจรเดช นิยมศิริ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.อ.สองพี่น้อง.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... | ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่ 14.9.66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1363/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

จรเดช นิยมศิริ

(นายจรเดช นิยมศิริ)
ว.ก.๕ กทท.น.อ.น.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิง | แผ่น
แผนผังแนบ | แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SPO03S-03(บ้านกลางทุ่ง)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.ย. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1363/2566		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย			วันที่	12 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมน โทงย้อย (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แก้ไขจุดร้อนที่ SPO03S-03 บริเวณบ้านกลางทุ่งศรีสำราญ						
3	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO	-	
4	SPO03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	
5	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN	-	
6	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	
7	*ย้ายโหลด SPO03 บางส่วนไปรับไฟจาก SPN01*						
8	SPN01S-08	ปลด	ล๊ับ		สพน.	SF6	ธ.กรุงศรี
9	SPO03S-03	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สพน.	SF6	กลางทุ่งศรีสำราญ
10	แจ้ง Hotline ดำเนินการแก้ไขจุดร้อนที่ SPO03S-03(บ้านกลางทุ่งศรีสำราญ) ได้						
11	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO	-	
12	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN	-	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	หลังจากแก้ไขจุดร้อนที่ SPO03S-03(บ้านกลางทุ่งศรีสำราญ) แล้วเสร็จ						
14	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO	-	-
15	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN	-	-
16	*ย้ายโหลด SPO03 บางส่วนกลับคืนจาก SPN01*						
17	SPO03S-03	ปลด	ล๊ับ		สพน.	SF6	กลางทุ่งศรีสำราญ
18	SPN01S-08	ล๊ับ	ปลด		สพน.	SF6	ธ.กรุงศรี
19	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO	-	-
20	SPO03VB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO	-	-
21	SPN-TP1	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN	-	-
22	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN	-	-
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							

แผนผังย้ายโหลด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง
 วันที่ 14 กันยายน เวลา 9.00 -12.00 น.
 บริเวณ SF6 กลางทุ่ง SPO3S-03

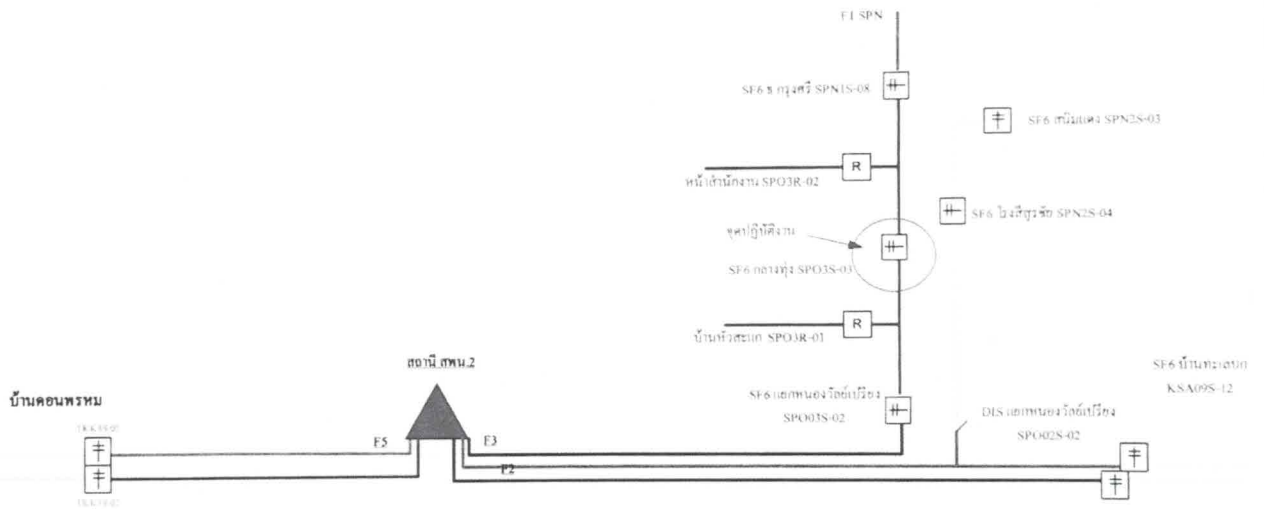

หมายเหตุ ปฏิบัติงานแก้ไขจุดหรือบนโดยชุดสายดินประจำ
